

Картотека выполненных объектов



СКЛАД ХРАНЕНИЯ СЫРЬЯ ЗАВОДА ПО  
ПРОИЗВОДСТВУ ТКАНЕЙ

Устройство наливного напольного покрытия



16529

## Склад хранения сырья завода по производству тканей



Объект до монтажа полимерного покрытия

## Склад хранения сырья завода по производству тканей




Материалы Гидрозо на объекте

## Склад хранения сырья завода по производству тканей



Прогрев материала тепловой пушкой

## Склад хранения сырья завода по производству тканей

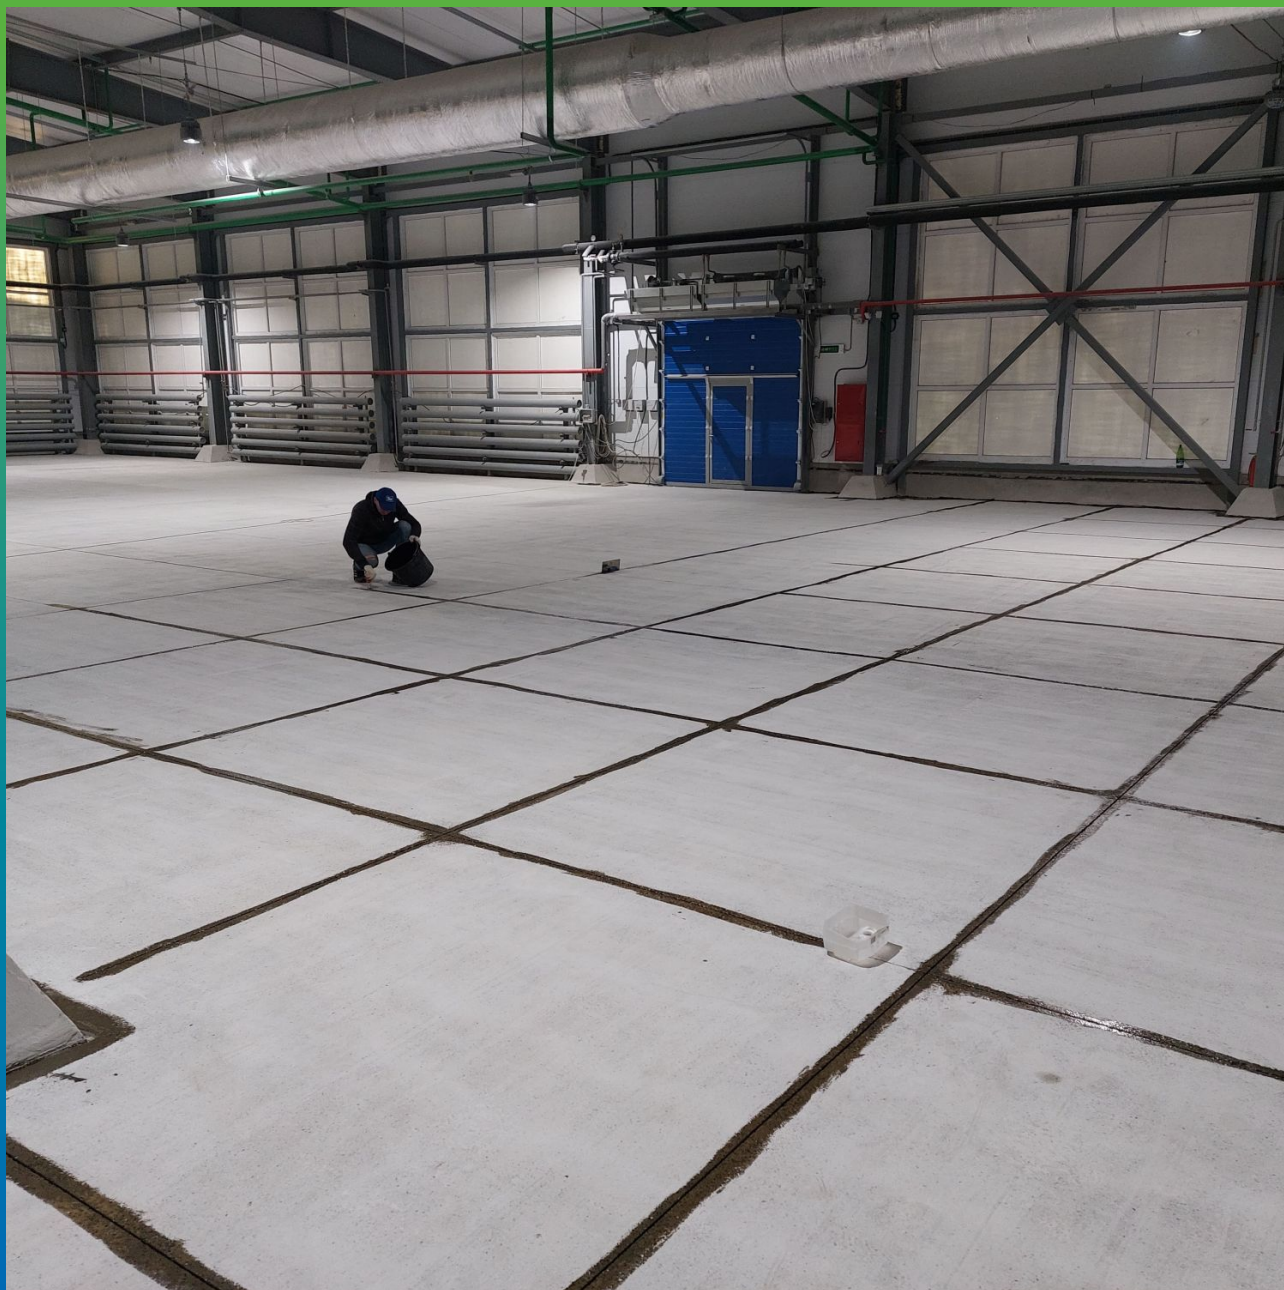

Грунтование составом ДенсТоп ЭП 106 усадочных швов перед заполнением

Склад хранения сырья завода по производству тканей



Приготовление шпаклевочной массы для заполнения швов

## Склад хранения сырья завода по производству тканей



Заполнение швов смесью грунта ДенсТоп ЭП 106 и песка ДенсТоп Филлер 004

Склад хранения сырья завода по производству тканей



Загрунтованная ДенсТоп ЭП 106 поверхность

Склад хранения сырья завода по производству тканей




Загрунтованная ДенсТоп ЭП 106 поверхность

Склад хранения сырья завода по производству тканей




Замешивание эпоксидного финишного материала ДенСтон ЭП 501

## Склад хранения сырья завода по производству тканей

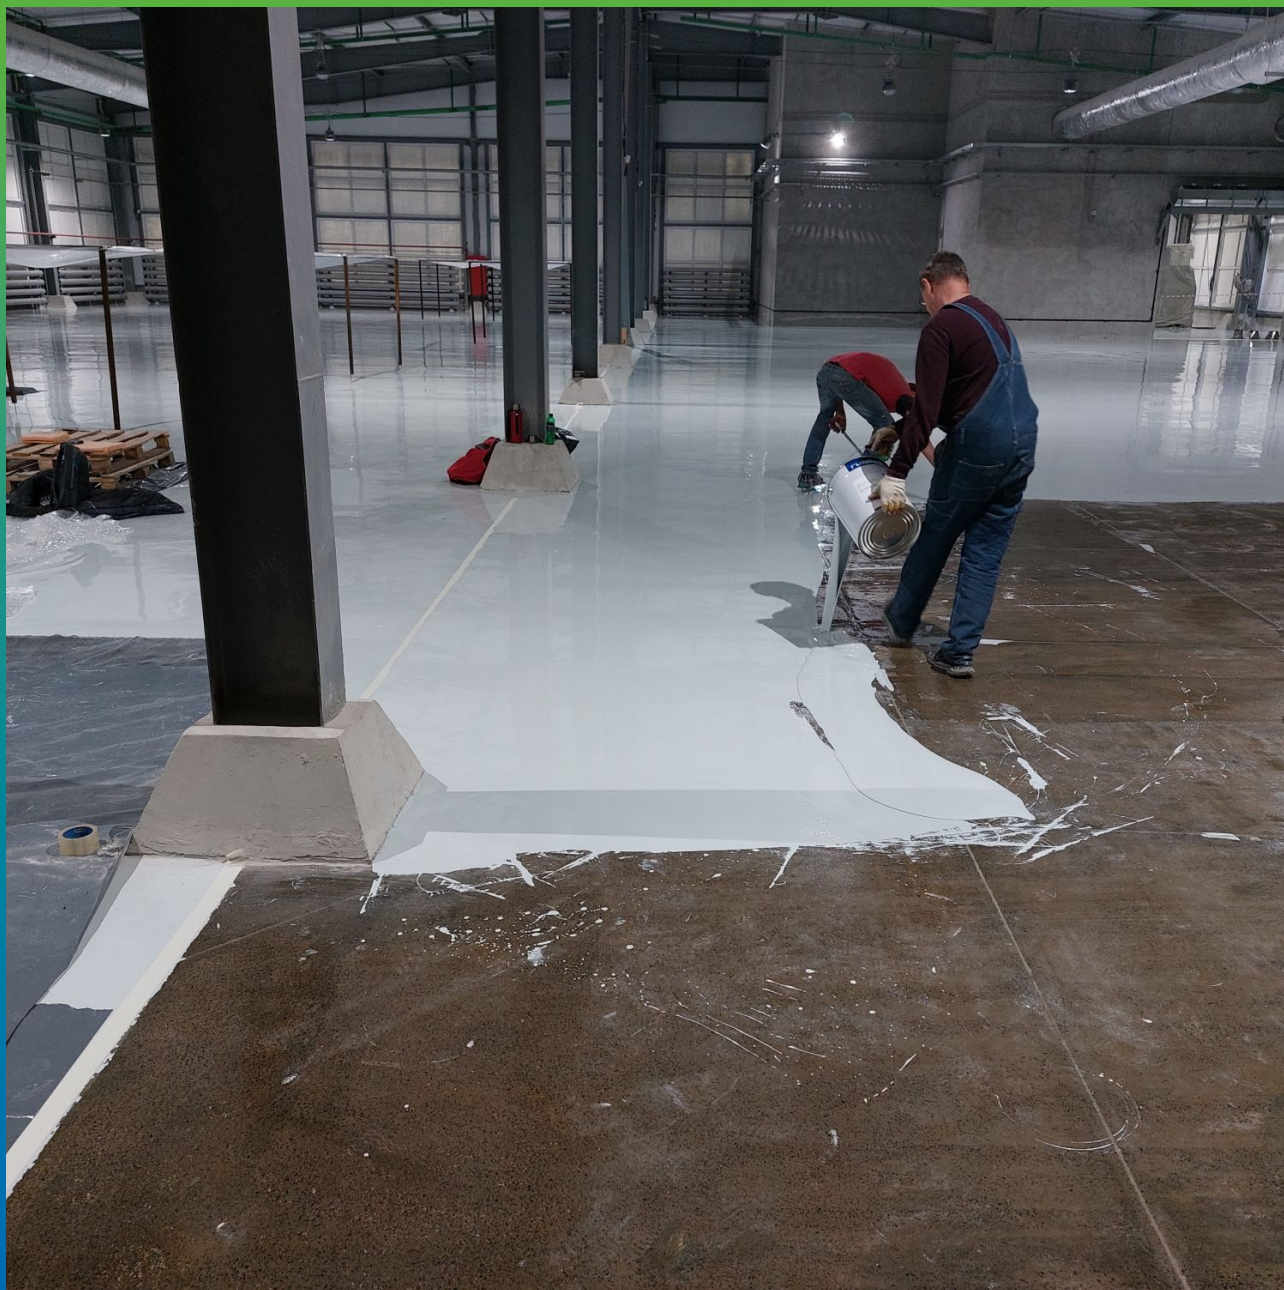

Распределение материала по поверхности

Склад хранения сырья завода по производству тканей

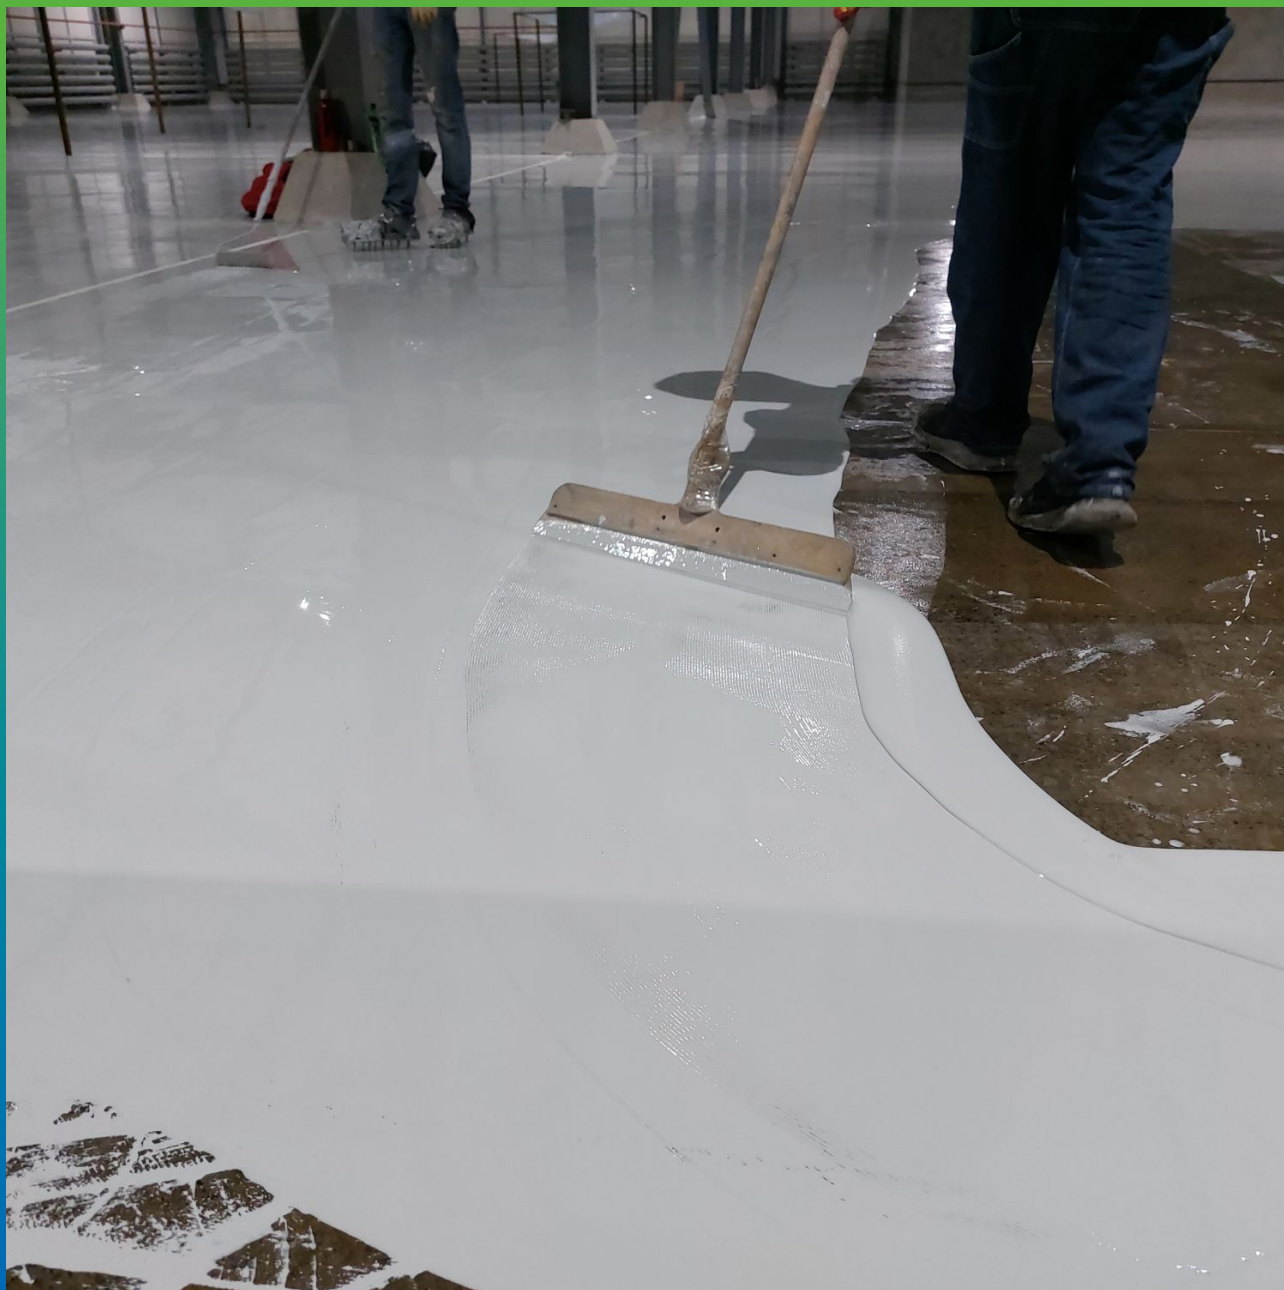

Распределение зубчатым шпателем материала с расходом 1 кг на м<sup>2</sup>

## Склад хранения сырья завода по производству тканей



Прокатка игольчатыми валиками состава с целью исключить пузырьки воздуха

Склад хранения сырья завода по производству тканей



Безыскровый полимерный эпоксидный пол

## Склад хранения сырья завода по производству тканей



Финишный вид безыскрового эпоксидного пола

## Сводная информация об объекте



### Вид работ

Устройство полов

### Вид объекта

Промышленное строительство

### Площадь, кв.м.

2100

### Местоположение

г. Шахты

### Дата проведения работ

Декабрь 2022

### Материалы и оборудование

ДенсТоп ЭП 500  
ДенсТоп ЭП 106  
ДенсТоп Филлер
