

Картотека выполненных объектов



ЧЕСНОКОВО МИЛЕНИУМ ПАРК УЧАСТОК 5-059

Гидроизоляции кровли



18209

Чесноково Милениум парк участок 5-059



Для данного объекта было произведено 22 кровельных ковра по заранее согласованным размерам Материал толщиной 1,2 мм

Чесноково Милениум парк участок 5-059



Для начала раскатываем материал на всех участках

Чесноково Милениум парк участок 5-059



Раскатка мембраны ЭПДМ Пеласты СТ

Чесноково Милениум парк участок 5-059



Раскатка кровельного ковра по плоскости

Чесноково Милениум парк участок 5-059



Укладка ЭПДМ мембраны Прелести СТ 1.2

Чесноково Милениум парк участок 5-059



Устройство парапетов и примыканий клеевым методом, клей-адгезив Преласты П400

Чесноково Милениум парк участок 5-059



Устройство парапетов и примыканий клеевым методом, клей-адгезив Преласты П400

Чесноково Милениум парк участок 5-059



Устройство парапетов и примыканий клеевым методом, клей-адгезив Преласты П400

Чесноково Милениум парк участок 5-059



Устройство парапетов и примыканий с помощью клей-адгезив Преласты П400

Чесноково Милениум парк участок 5-059



Устройство парапетов и примыканий с помощью клей-адгезив Преласт П400

Чесноково Милениум парк участок 5-059



Обварка примыканий и парапетных зон с помощью материала Термобон 150/20, 300/10

Чесноково Милениум парк участок 5-059



Обварка примыканий и парапетных зон с помощью материала Термобон 150/20, 300/10

Чесноково Милениум парк участок 5-059



Обварка примыканий и парапетных зон с помощью материала Термобон 150/20, 300/10. Герметизация воронок

Чесноково Милениум парк участок 5-059



Обварка сложных геометрических форм с помощью материала Термобон 150/20, 300/10

Чесноково Милениум парк участок 5-059



Предфинишный этап, оконтуривание верхних кромок и кромок сопряжения тумб, зон примыкания, наружных сторон парапетов

Чесноково Милениум парк участок 5-059



Оконтуривание верхних кромок и кромок сопряжения тумб, зон примыкания, наружных сторон парапетов используем материал Манодил Бонд Ф

Чесноково Милениум парк участок 5-059



Оконтуривание верхних кромок и кромок сопряжения тумб, зон примыкания, наружных сторон парапетов используем материал Манодил Бонд Ф

Чесноково Милениум парк участок 5-059




Финишный вид законченного монтажа Кровельных ковров ЭПДМ Прелести СТ 1,2

Чесноково Милениум парк участок 5-059



Финишный вид законченного монтажа Кровельных ковров ЭПДМ Прелести СТ 1,2

Сводная информация об объекте

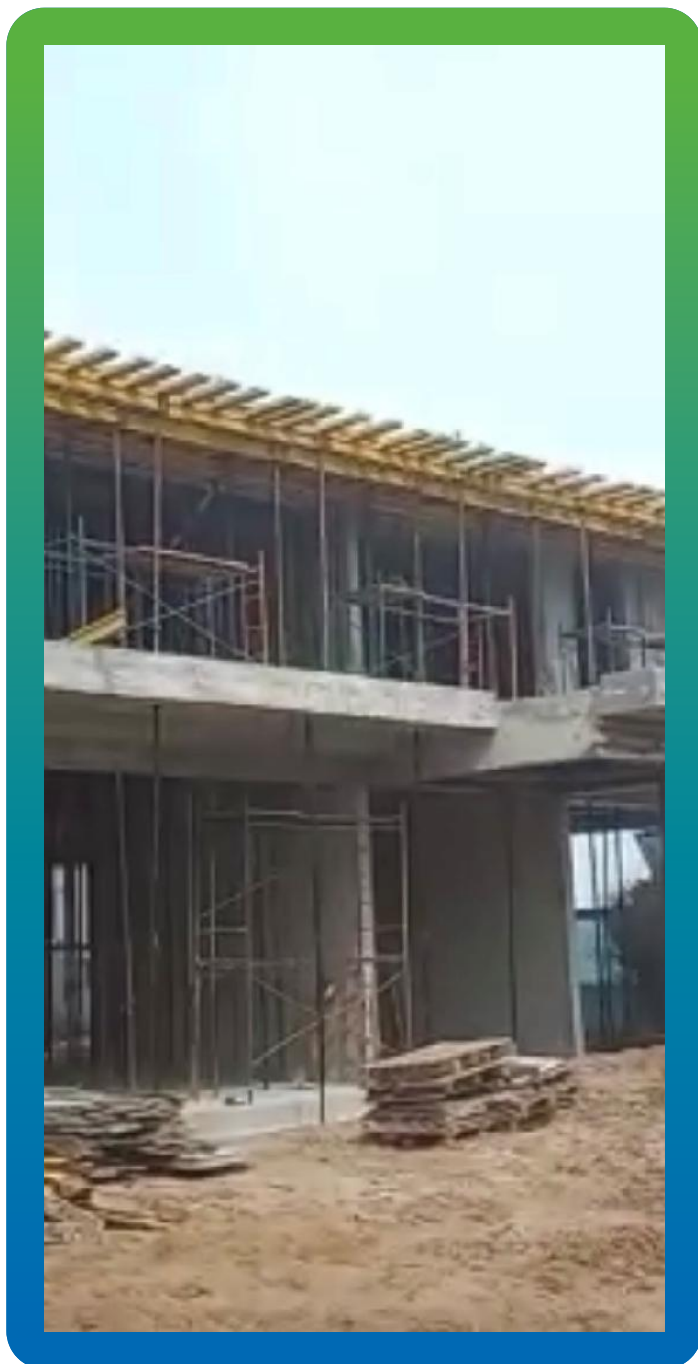

Вид работ

Гидроизоляция

Вид объекта

Жилые здания

Площадь, кв.м.

2250

Местоположение

г. Истра

Дата проведения работ

Июнь 2023

Материалы и оборудование

Прелести СТ
Контактный клей П400 на
каучуковой основе
Лента Термобонд
Угловой элемент Термобонд
