

Картотека выполненных объектов



СКЛАДЫ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Устройство напольного покрытия



18834

Склады промышленного назначения




Материалы Гидрозо на объекте

Склады промышленного назначения



Нанесение грунтовки на тестовом участке с целью определения расхода

Склады промышленного назначения

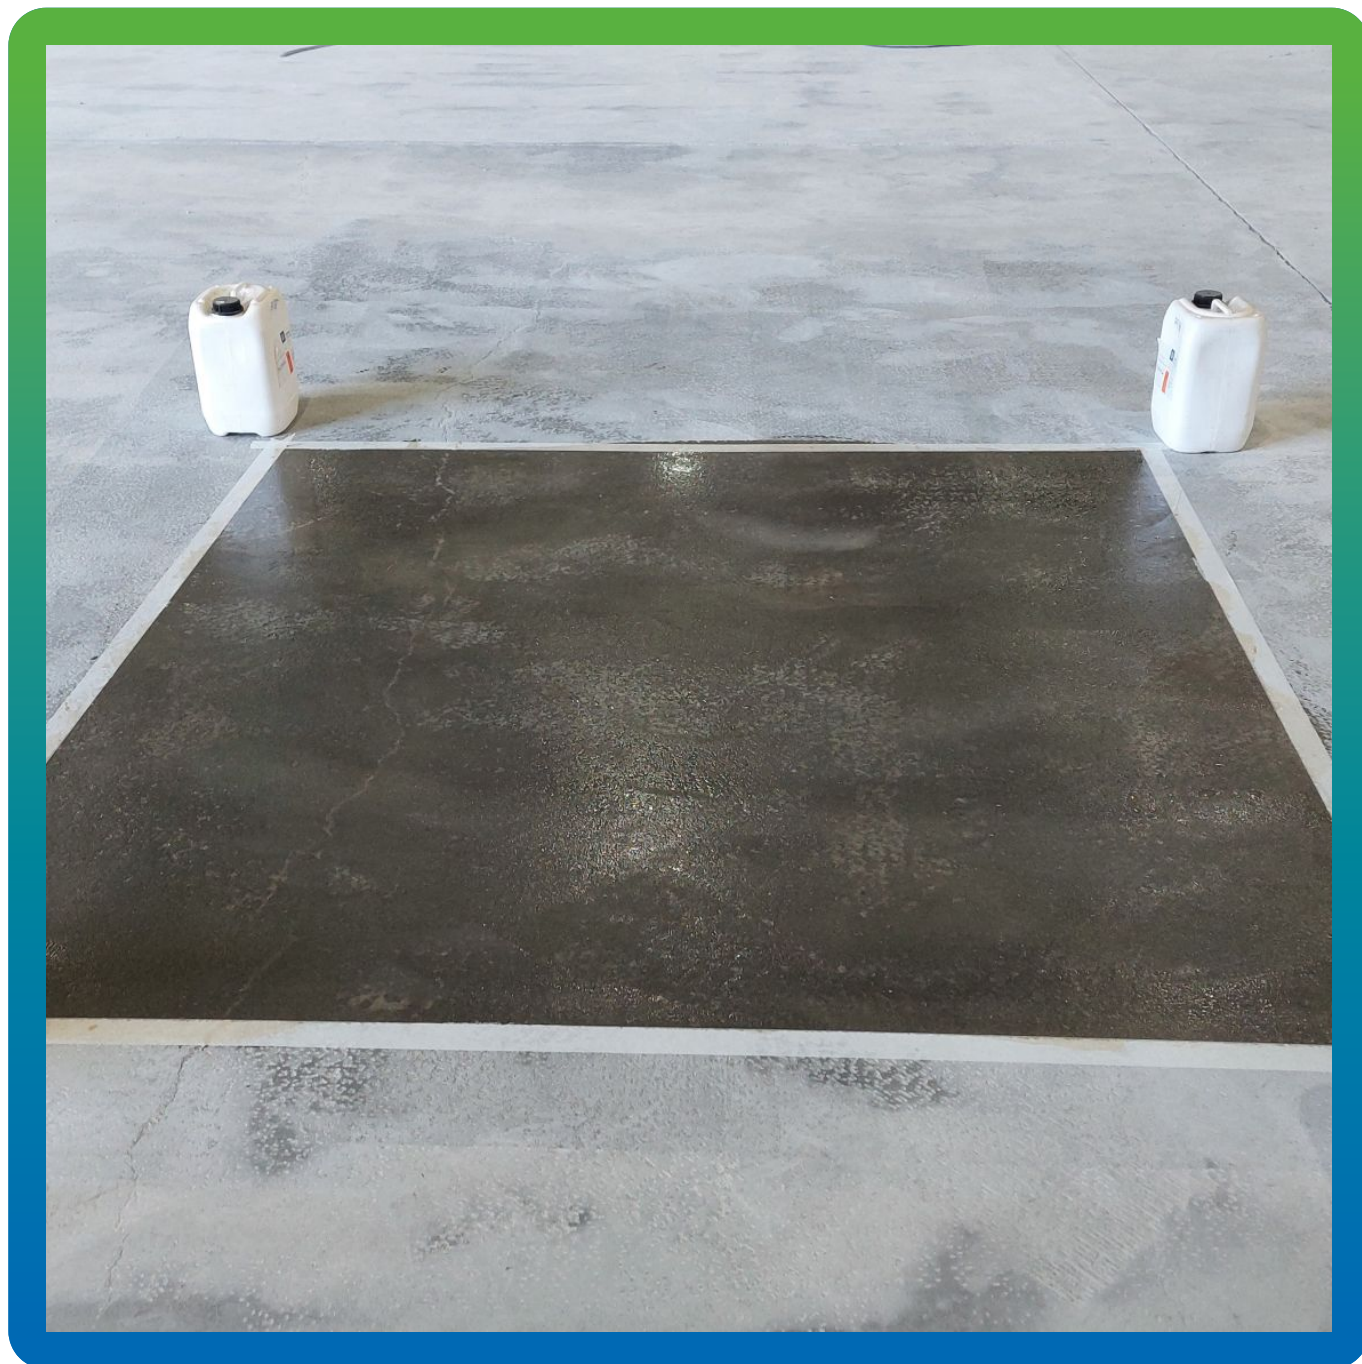

Тестовый участок с грунтовкой ДенсТоп ЭП 100

Склады промышленного назначения



Бучардирование бетонного основания

Склады промышленного назначения



Структура поверхности после бучардирования

Склады промышленного назначения



Фрезерование бетонного основания

Склады промышленного назначения



Обеспыливание промышленным пылесосом

Склады промышленного назначения



Обеспыливание после обработки бетона

Склады промышленного назначения



Укладка вилатерма в усадочные швы

Склады промышленного назначения



Приготовление шпаклевочной эпоксидно-песчаной массы

Склады промышленного назначения



Загрунтованные усадочные швы

Склады промышленного назначения



Шпаклевание швов эпоксидно-песчаной смесью

Склады промышленного назначения




Шпаклевание швов

Склады промышленного назначения




Подготовка эпоксидного грунта ДенСтол ЭП 100 с песком кварцевым

Склады промышленного назначения

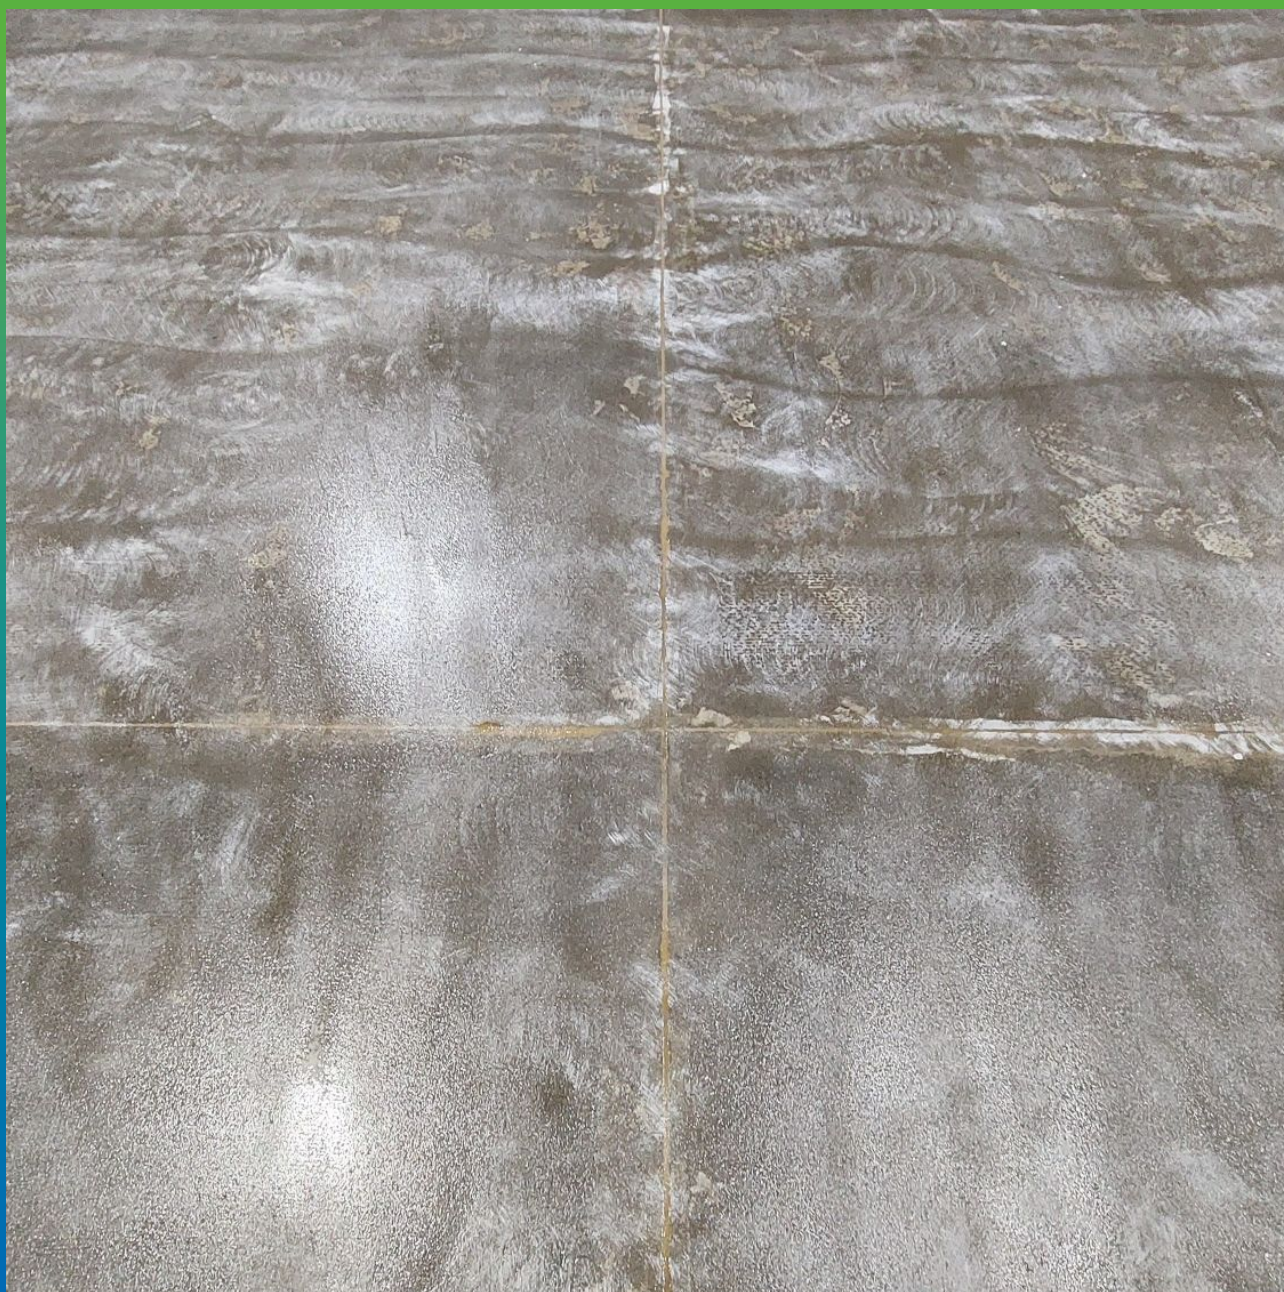

Вид загрунтованной поверхности с последующей подшлифовкой

Склады промышленного назначения

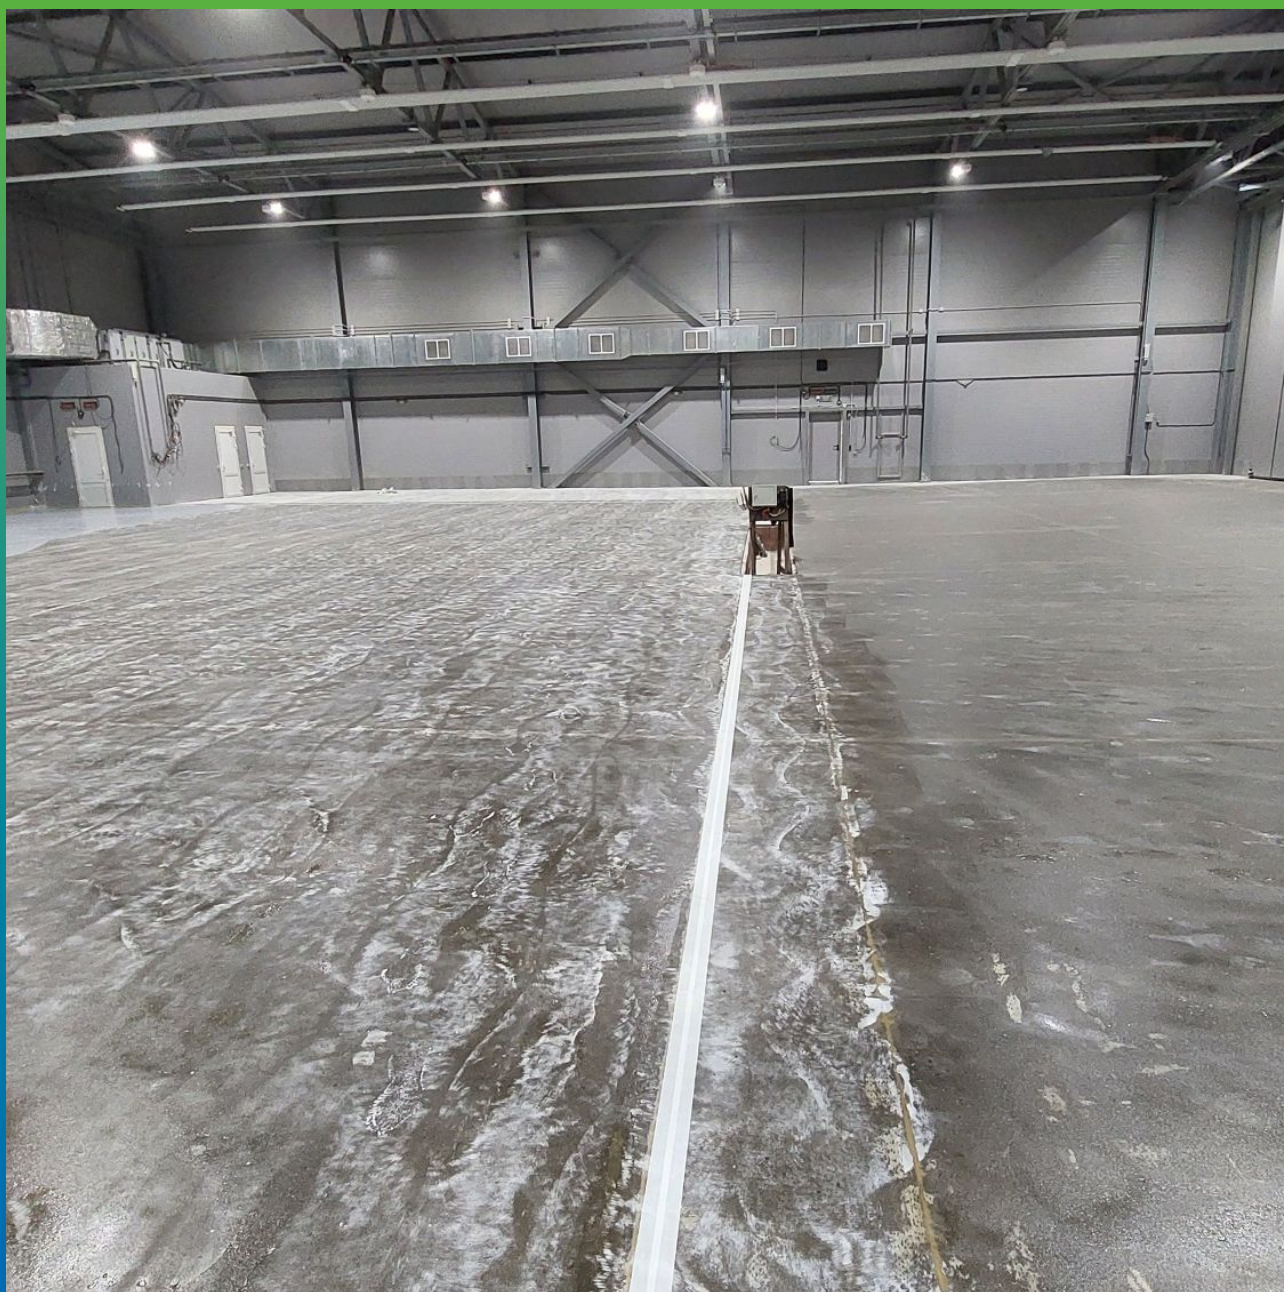

Подготовленная загрунтованная ДенсТоп ЭП 100 поверхность перед нанесением базового слоя

Склады промышленного назначения



Приготовление базового цветного эпоксидного состава ДенСтон ЭП 501

Склады промышленного назначения



Смешивание компонентов ДенсТоп ЭП 501

Склады промышленного назначения




Подготовка наливного эпоксида ДенТоп ЭП 501

Склады промышленного назначения



Кварцевый наполнитель ДенСтон Филлер 004 на объекте

Склады промышленного назначения

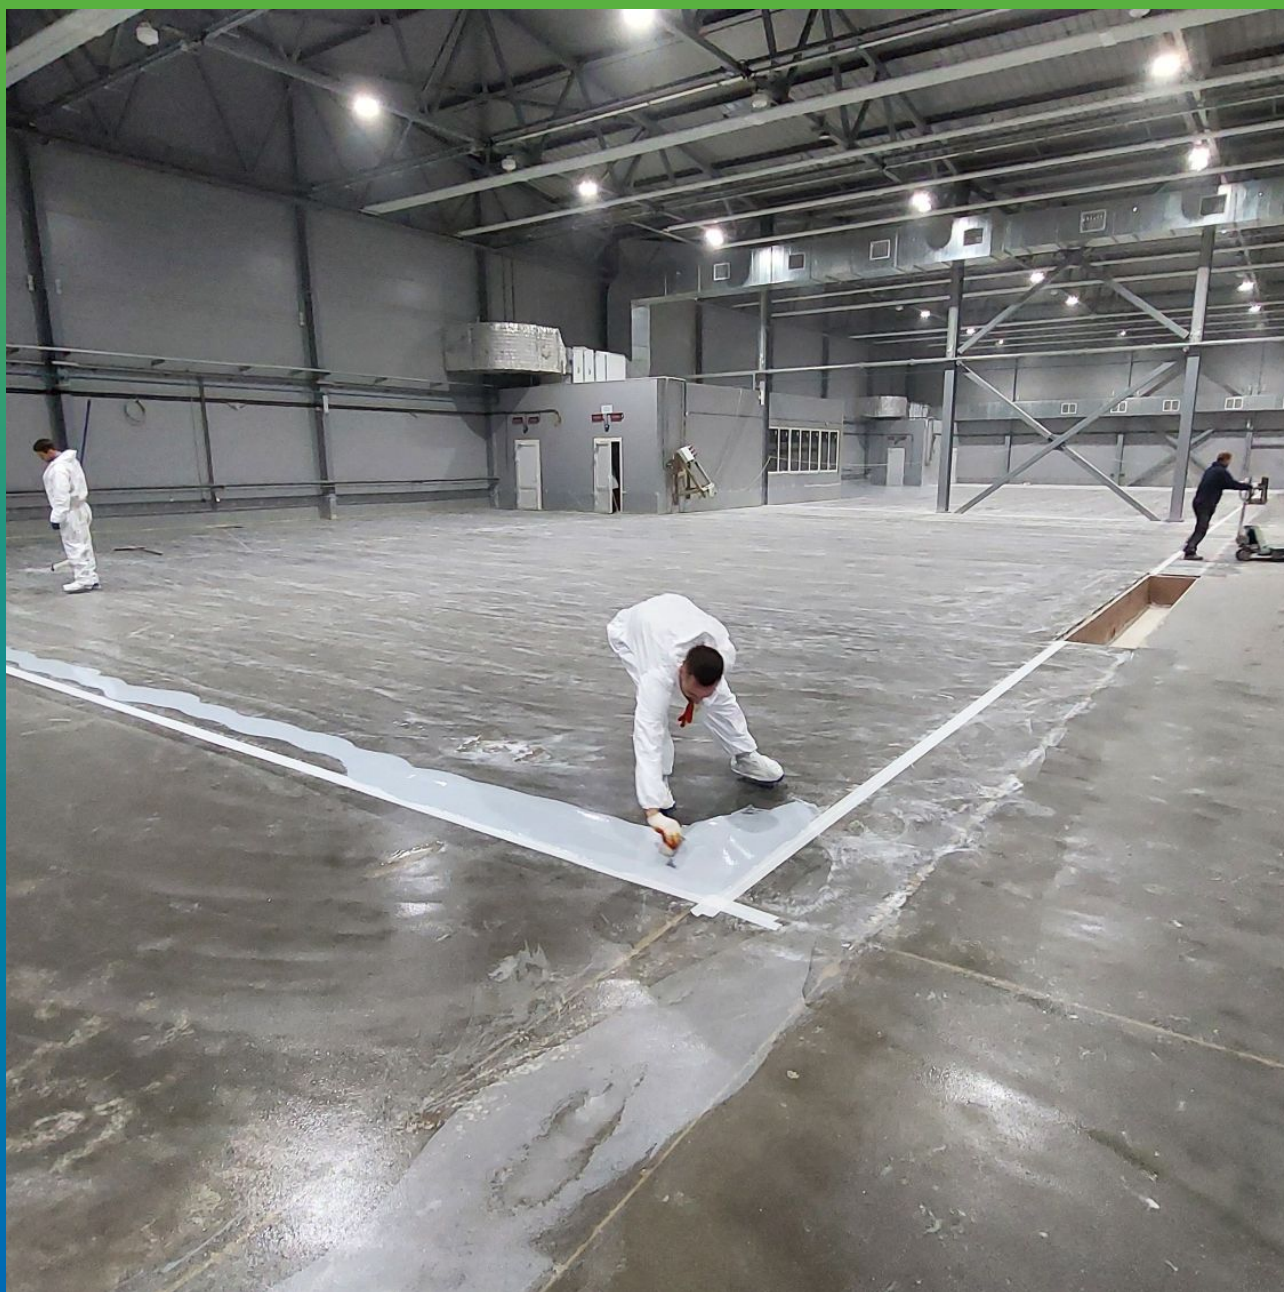

Начало укладки ДенсТоп ЭП 501 на первой захватке

Склады промышленного назначения



Распределение состава ДенТоп ЭП 501 по площади

Склады промышленного назначения



Задаем толщину 2 мм с помощью ракли

Склады промышленного назначения



Прокатка эпоксида игольчатым валиком для исключения пузырения

Склады промышленного назначения



Экипировка полимерщиков - защитный костюм Каспер, перчатки, обувь мокроступы

Склады промышленного назначения




В процессе укладки наливного эпоксида ДенТоп ЭП 501

Склады промышленного назначения



Одна захватка готова, вторая - подготовлена под нанесение

Склады промышленного назначения

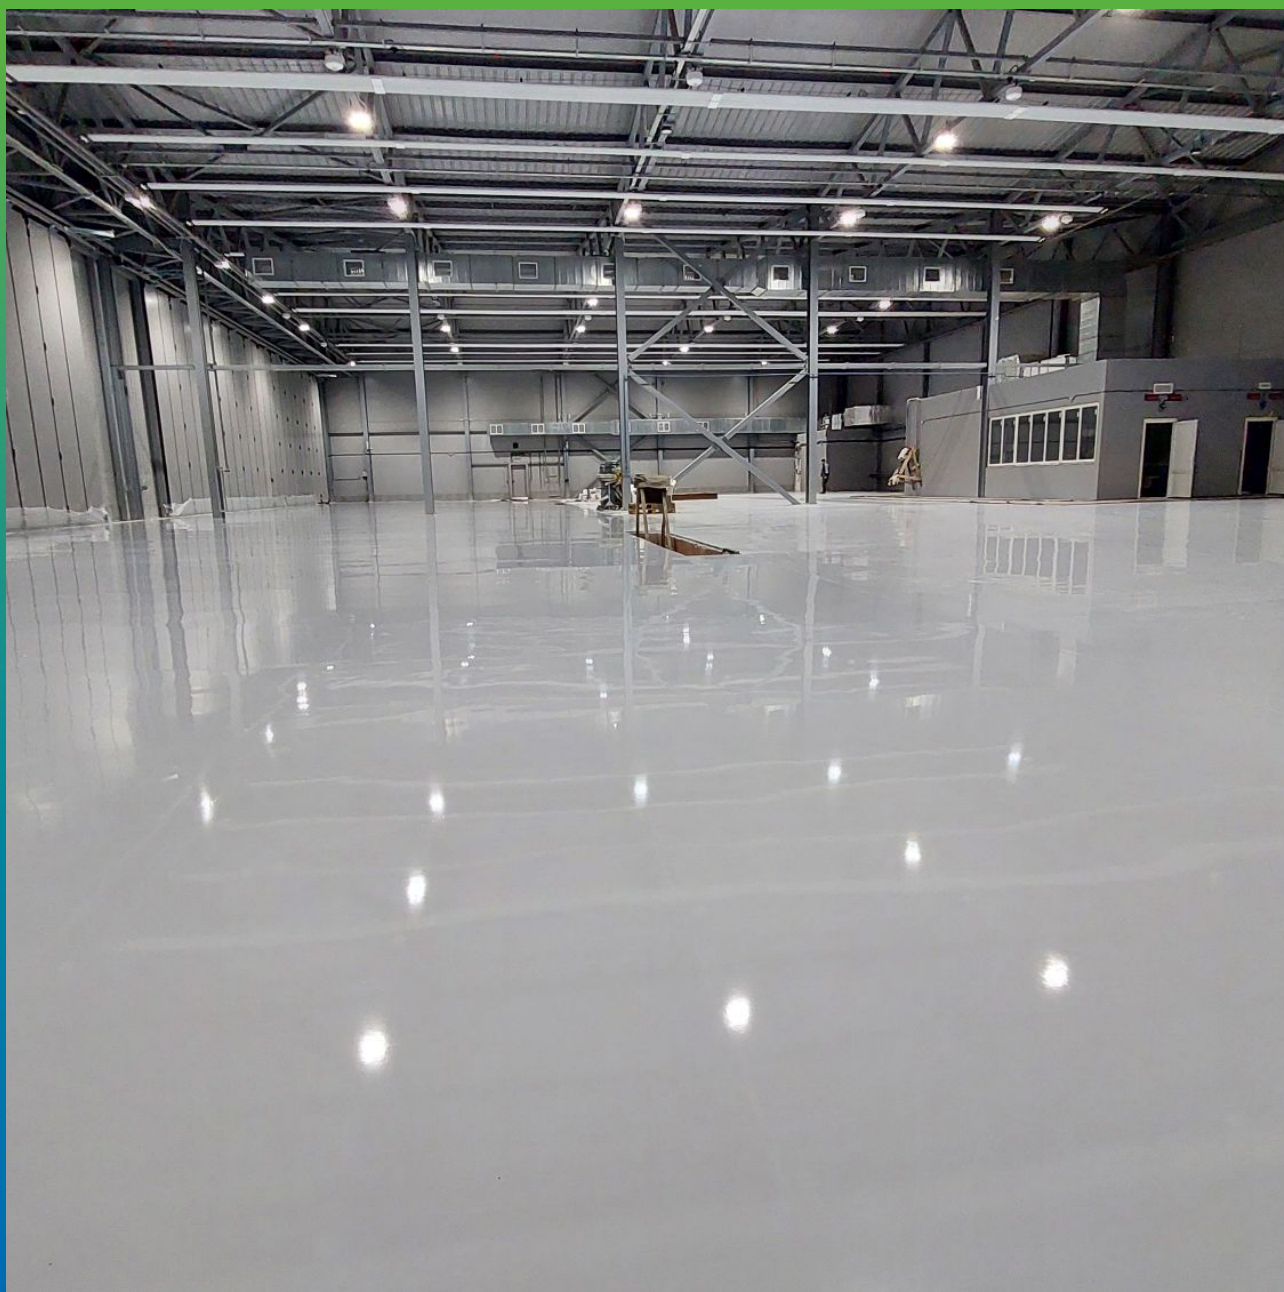

Выполненное финишное наливное покрытие ДенТоп ЭП 501

Склады промышленного назначения



Готовый пол системы в 2 мм

Склады промышленного назначения



Нанесенная разметка

Сводная информация об объекте



Вид работ

Устройство полов

Вид объекта

Промышленное строительство

Площадь, кв.м.

3800

Местоположение

г. Ростов-на-Дону

Дата проведения работ

Декабрь 2024

Материалы и оборудование

ДенсТоп ЭП 100
ДенсТоп ЭП 500
ДенсТоп Филлер
