

Картотека выполненных объектов



КРОВЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

Гидроизоляция кровли ЭПДМ



19230

Кровля производственного здания



Подготовка основания под укладку мембраны Преласты СТ 1.2 мм.

Кровля производственного здания



Крепления шайб Центрикс к основанию

Кровля производственного здания



Подъем на кровлю сваренной в карту ЭПДМ-Мембраны Прелести СТ 1,2 мм.

Кровля производственного здания



Стыковка карт между собой горячим воздухом с помощью Термобонд

Кровля производственного здания



Крепление мембраны к основанию методом индукции, без прокола мембраны

Кровля производственного здания




Вид кровли после проведения работ

Кровля производственного здания



Кровля после проведения работ второй ярус

Сводная информация об объекте

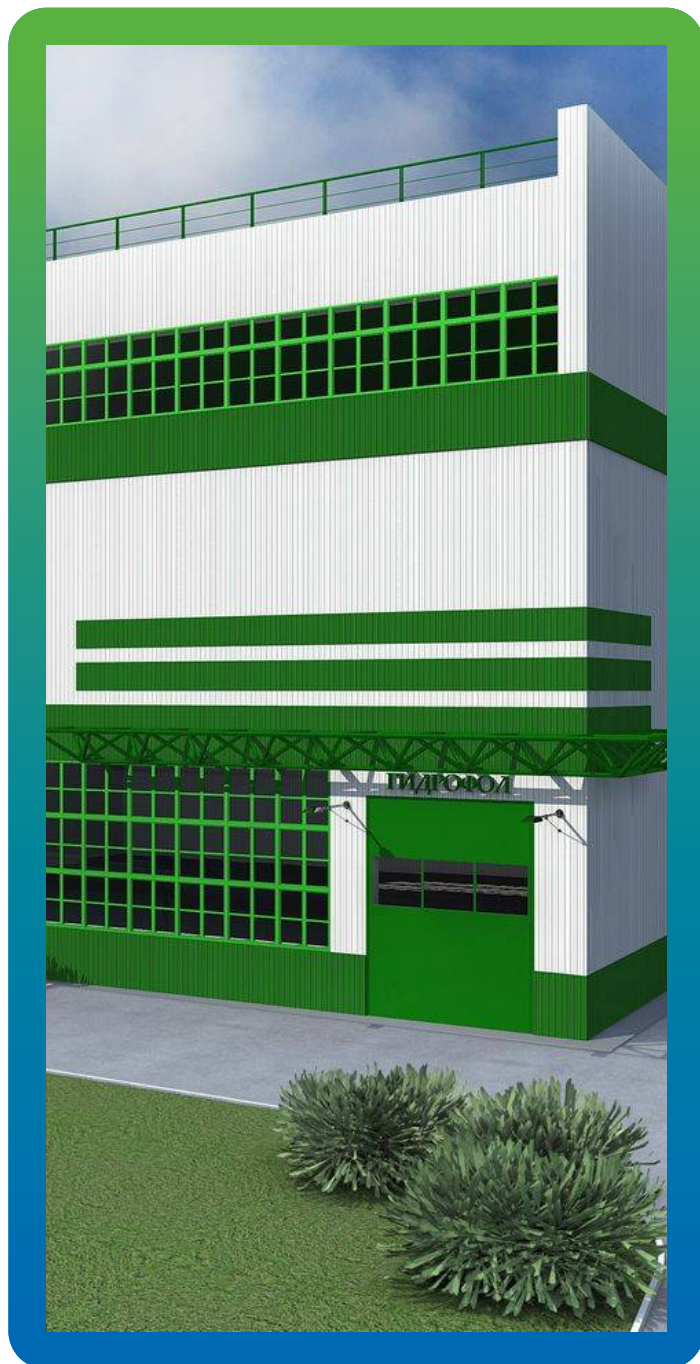

Вид работ

Гидроизоляция

Вид объекта

Промышленное строительство
Общественные здания

Площадь, кв.м.

1800

Местоположение

г. Березники

Дата проведения работ

Май 2021

Материалы и оборудование

Манодил Бонд Ф
Преласты СТ
Контактный клей П400 на
каучуковой основе
Индукционный аппарат
Центрикс
Шайба Центрикс
