

Картотека выполненных объектов



АВТОЗАПРАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС ГАЗПРОМ  
ТРАНСГАЗ

Гидроизоляция кровли ЭПДМ мембраной с  
механическим индукционным креплением



2126

Автозаправочный комплекс Газпром Трансгаз



Первоначальный вид кровли

Автозаправочный комплекс Газпром Трансгаз



Первоначальный вид кровли

Автозаправочный комплекс Газпром Трансгаз



Установка шайб Центрикс

Автозаправочный комплекс Газпром Трансгаз



Вид подготовленной кровли

Автозправочный комплекс Газпром Трансгаз



Подъем полотна ЭПДМ мембраны Прелести СТ 1.2 мм на кровлю

Автозаправочный комплекс Газпром Трансгаз



Полотно ЭПДМ мембарны в сложенном виде

Автозаправочный комплекс Газпром Трансгаз



Очистка шайб центрикс перед укладкой ЭПДМ мембраны

Автозаправочный комплекс Газпром Трансгаз



Укладка ЭПДМ мембраны Прелести СТ 1.2 мм

Автозаправочный комплекс Газпром Трансгаз



Вид растянутого полотна ЭПДМ

Автозаправочный комплекс Газпром Трансгаз



Крепление ЭПДМ мембраны по системе Центрикс

Автозаправочный комплекс Газпром Трансгаз



Устройство вывода коммуникаций

Автозаправочный комплекс Газпром Трансгаз



Устройство герметизации вывода коммуникаций с помощью ленты Термобонд

Автозаправочный комплекс Газпром Трансгаз




Устройство парапета

Автозаправочный комплекс Газпром Трансгаз



Финальный вид кровли

## Сводная информация об объекте

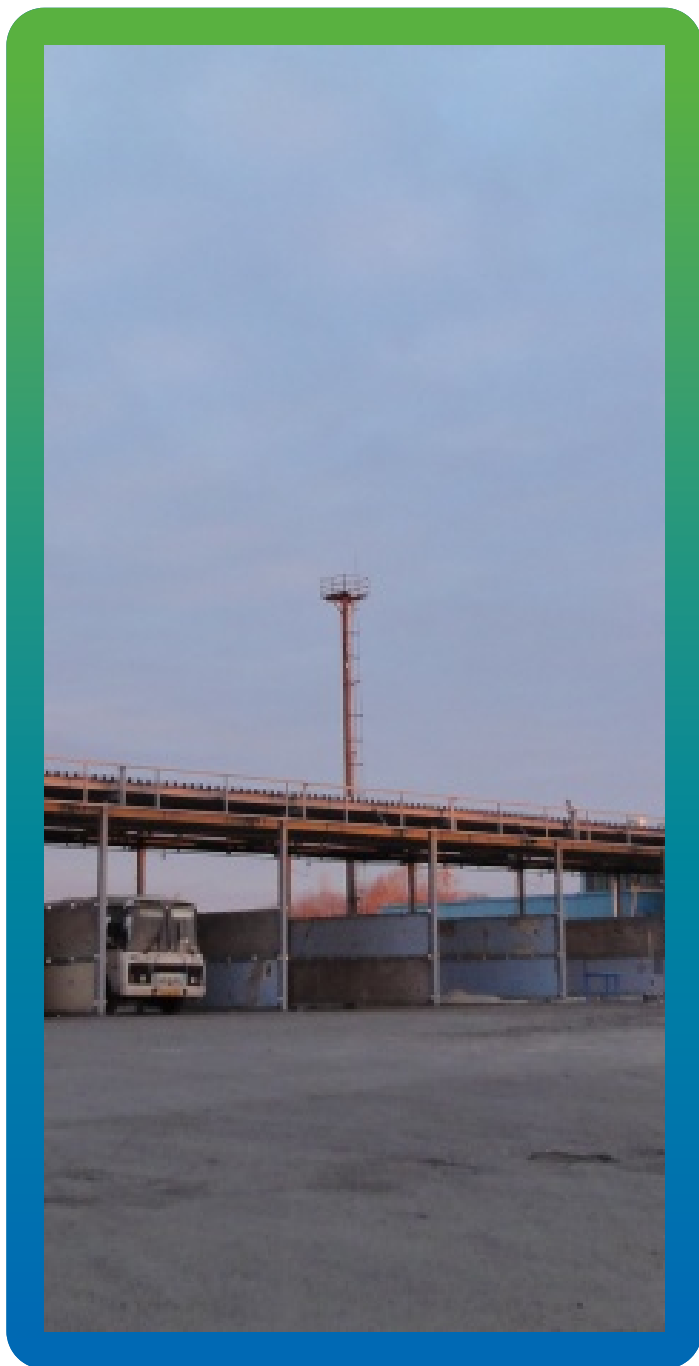

### Вид работ

Гидроизоляция

### Вид объекта

Кровли и водоемы ЭПДМ  
Транспортные сооружения

### Площадь, кв.м.

800

### Местоположение

г. Оренбург

### Дата проведения работ

Октябрь 2015

### Материалы и оборудование

Манодил Бонд Ф  
Преласты СТ  
Лента Термобонд  
Индукционный аппарат  
Центрикс  
Шайба Центрикс
