

Картотека выполненных объектов



ЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА СЕРНОЙ
КИСЛОТЫ ЗАПСИБНЕФТЕХИМ 2

Устройство напольного покрытия



2785

Здание производства серной кислоты
ЗапСибНефтеХим 2



Подготовительные работы. Фрезеровка горизонтальной поверхности

Здание производства серной кислоты
ЗапСибНефтеХим 2



Подготовительные работы. Шлифовка вертикальных поверхностей

Здание производства серной кислоты
ЗапСибНефтеХим 2




Подготовительные работы. Нарезка анкерных пропилов и очистка стены от штукатурки

Здание производства серной кислоты
ЗапСибНефтеХим 2



Подготовительные работы. Устройство двойного анкерного пропила под "замок".

Здание производства серной кислоты
ЗапСибНефтеХим 2

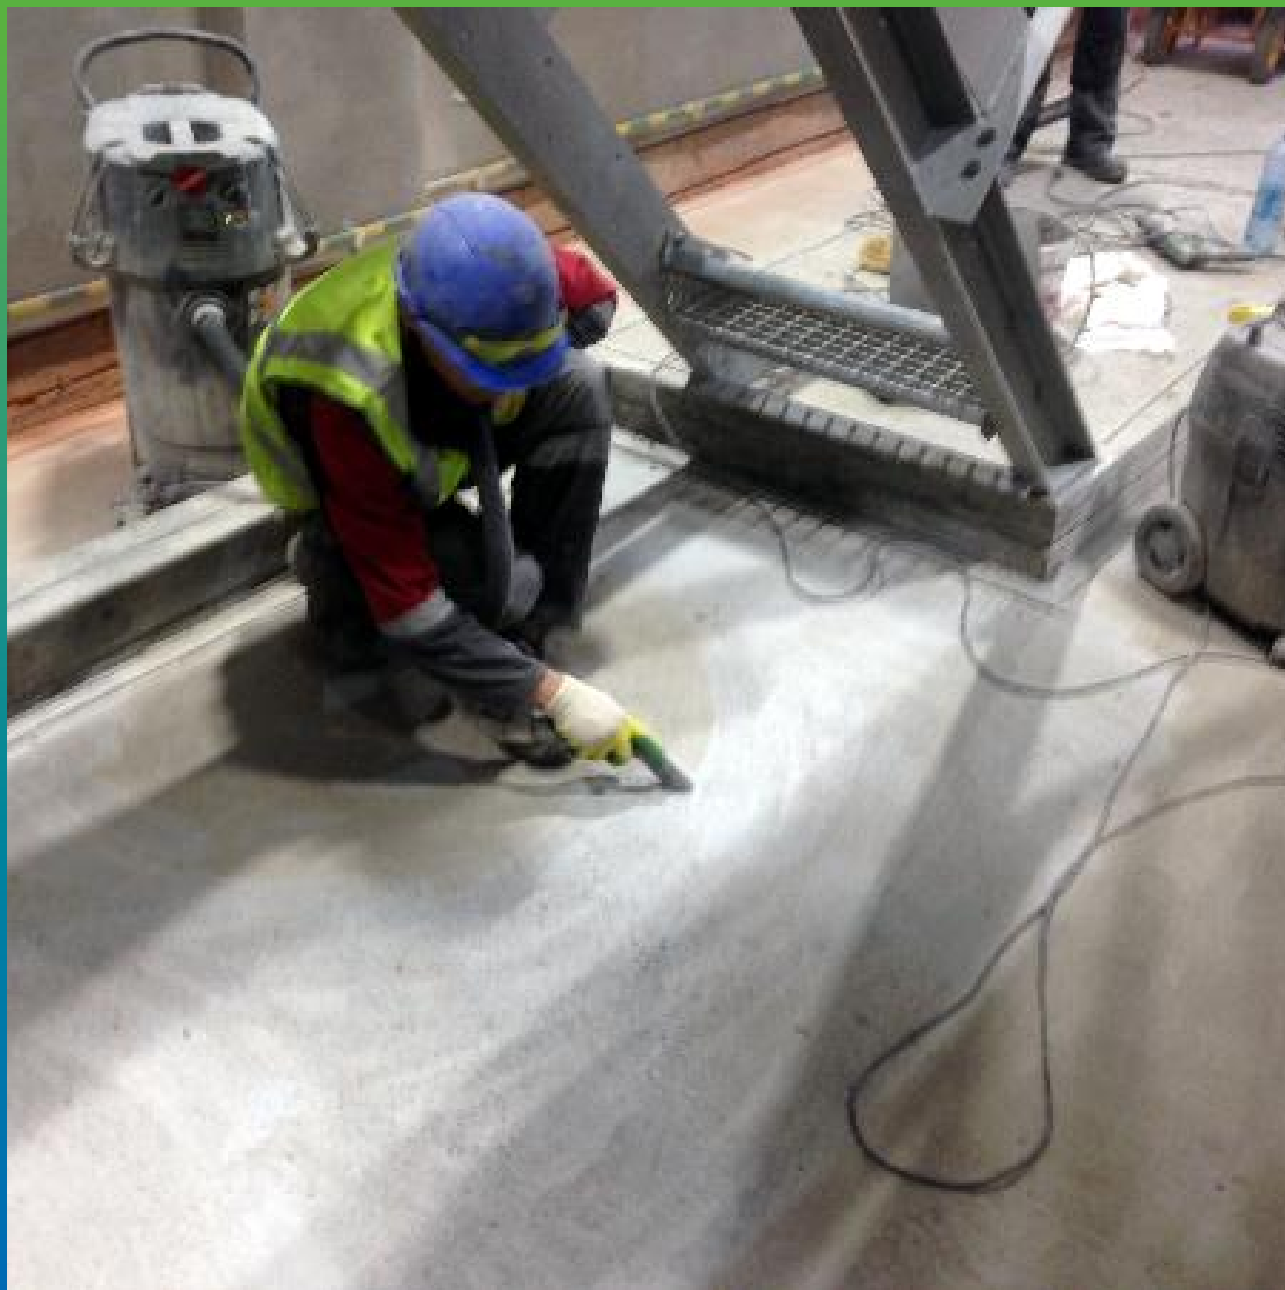

Подготовительные работы. Обеспыливание промышленными пылесосами.

Здание производства серной кислоты
ЗапСибНефтеХим 2



Подготовительные работы. Оклеивка стальных элементов малярным скотчем.

Здание производства серной кислоты
ЗапСибНефтеХим 2



Подготовительные работы. Оклейка вспененным Вилатермом конструктивных элементов для последующего заполнения примыкания

Здание производства серной кислоты
ЗапСибНефтеХим 2



Материалы ГИДРОЗО на объекте. Общий вид

Здание производства серной кислоты
ЗапСибНефтеХим 2



Подготовка компонентов А+Б1+Б2 грунтовки ДенТоп ПМ 600

Здание производства серной кислоты
ЗапСибНефтеХим 2



Смешение компонентов А+Б1+Б2 грунта Денстоп ПМ 600 миксером на малой скорости

Здание производства серной кислоты
ЗапСибНефтеХим 2



Нанесение грунта ДенТоп ПМ 600 на вертикальные и горизонтальные поверхности

Здание производства серной кислоты
ЗапСибНефтеХим 2



Нанесение грунта ДенСтоп ПМ 600 коротковорсовым велюровым валиком.

Здание производства серной кислоты
ЗапСибНефтеХим 2



Промазка грунта Денстоп ПМ 600 кистями в анкерных пропилах, штробах и мелких дефектов.

Здание производства серной кислоты
ЗапСибНефтеХим 2



Прогрунтованный участок. Общий вид

Здание производства серной кислоты
ЗапСибНефтеХим 2



Смешение жидких компонентов Б1+Б2 Денстоп ПМ 605ФК - тиксотропной версии ЦПУ

Здание производства серной кислоты
ЗапСибНефтеХим 2



Перемешивание жидких компонентов Денстоп ПМ 605ФК миксером на малых скоростях

Здание производства серной кислоты
ЗапСибНефтеХим 2



Введение сухой части - компонента А и перемешивание смеси Денстоп ПМ 605ФК до однородной консистенции

Здание производства серной кислоты
ЗапСибНефтеХим 2



Нанесение кальмами и шпателями смеси Денстоп ПМ 605ФК на вертикальные участки

Здание производства серной кислоты
ЗапСибНефтеХим 2



Нанесение смеси Денстоп ПМ 605ФК на сложные горизонтальные участки

Здание производства серной кислоты
ЗапСибНефтеХим 2



Нанесение смеси Денстоп ПМ 605ФК на пандусы и бортики

Здание производства серной кислоты
ЗапСибНефтеХим 2



Смешение и перемешивание жидких компонентов Б1+Б2 Денстоп ПМ 605
Тровел - наливания шероховатая версия ЦПУ

Здание производства серной кислоты
ЗапСибНефтеХим 2



Введение сухой части - компонента А и перемешивание смеси Денстоп ПМ 605Трвел до однородной консистенции

Здание производства серной кислоты
ЗапСибНефтеХим 2



Выливание смеси Денстоп ПМ 605Тровел на основание

Здание производства серной кислоты
ЗапСибНефтеХим 2



Распределение смеси Денстоп ПМ 605 Тровел по участку.

Здание производства серной кислоты
ЗапСибНефтеХим 2



Распределение смеси Денстоп ПМ 605Тровел с помощью настроенной на необходимую толщину ракелем

Здание производства серной кислоты
ЗапСибНефтеХим 2



Распределение смеси Денстоп ПМ 605Тровел происходит с одновременным заполнением анкерных пропилов.

Здание производства серной кислоты
ЗапСибНефтеХим 2



Заглаживание смеси Денстоп ПМ 605Тровел с помощью кельм

Здание производства серной кислоты
ЗапСибНефтеХим 2



Обработка заглаженной поверхности валиком с синтетическим коротким ворсом

Здание производства серной кислоты
ЗапСибНефтеХим 2



Полностью обработанная поверхность свежего покрытия Денстоп ПМ
605Тровел. Частный вид

Здание производства серной кислоты
ЗапСибНефтеХим 2



Полимеризовавшееся покрытия Денстоп ПМ 605ФК на вертикальных участках

Здание производства серной кислоты
ЗапСибНефтеХим 2



Полимеризовавшееся шероховатое покрытие пола Денстоп ПМ 605Тровел.
Частный вид

Здание производства серной кислоты
ЗапСибНефтеХим 2



Готовая обработанная поверхность. Общий вид

Сводная информация об объекте



Вид работ

Устройство полов

Вид объекта

Промышленное строительство

Площадь, кв.м.

210

Местоположение

г. Тобольск

Дата проведения работ

Март 2018

Материалы и оборудование

ДенсТоп ПМ 605 Тровел

ДенсТоп ПМ 605 ФК

ДенсТоп ПМ 600

Манодил ПУ 696

Манодил ПУ 186
