

Картотека выполненных объектов



ЖК "ТЮЛЬПАН"

Гидроизоляция и дренаж подземной парковки



4630

ЖК "Тюльпан"



Стеновые панели подземной парковки до начала работ

ЖК "Тюльпан"



Подготовка основания методом шлифования.

ЖК "Тюльпан"



Зачеканка межпанельных швов Стармекс Чекан, нанесение эластичного гидроизоляционного состава Стармекс Сил Флекс механическим способом.

ЖК "Тюльпан"



Нанесение гидроизоляционного покрытия Стармекс Сил.

ЖК "Тюльпан"




Нанесение гидроизоляционного покрытия Стармекс Сил.

ЖК "Тюльпан"



Работы по гидроизоляции стен подземной парковки снаружи.

ЖК "Тюльпан"

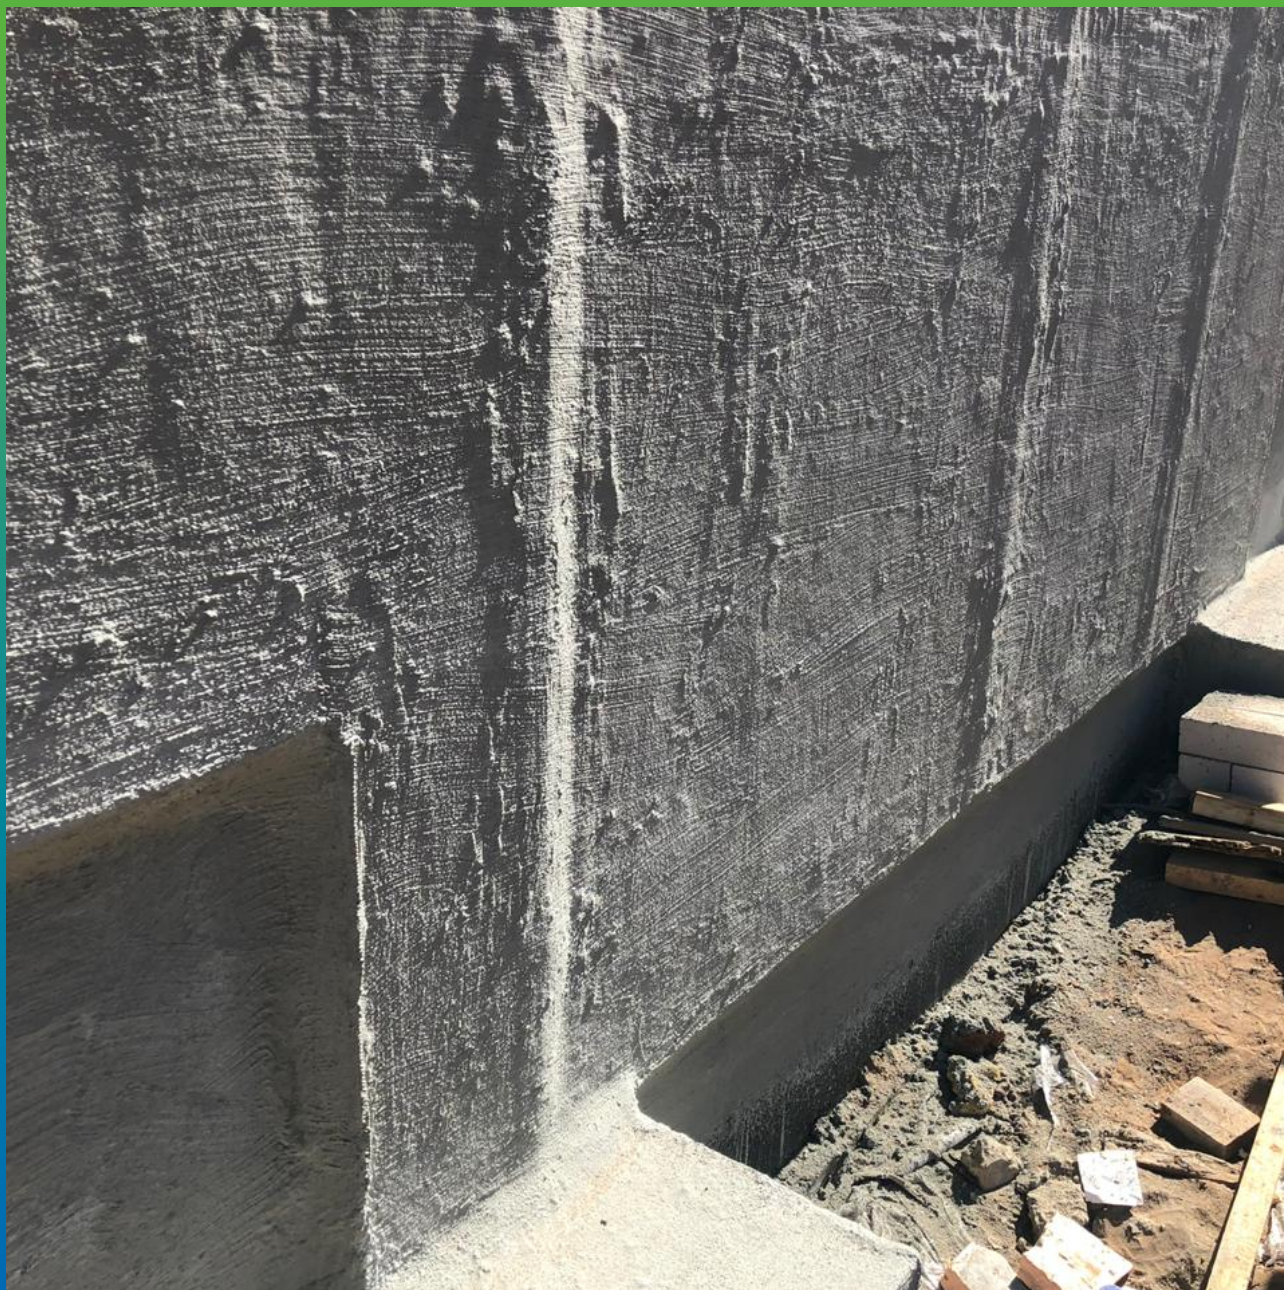


Гидроизолированные стены.

ЖК "Тюльпан"



Гидроизоляционное покрытие Стармекс Сил.

ЖК "Тюльпан"

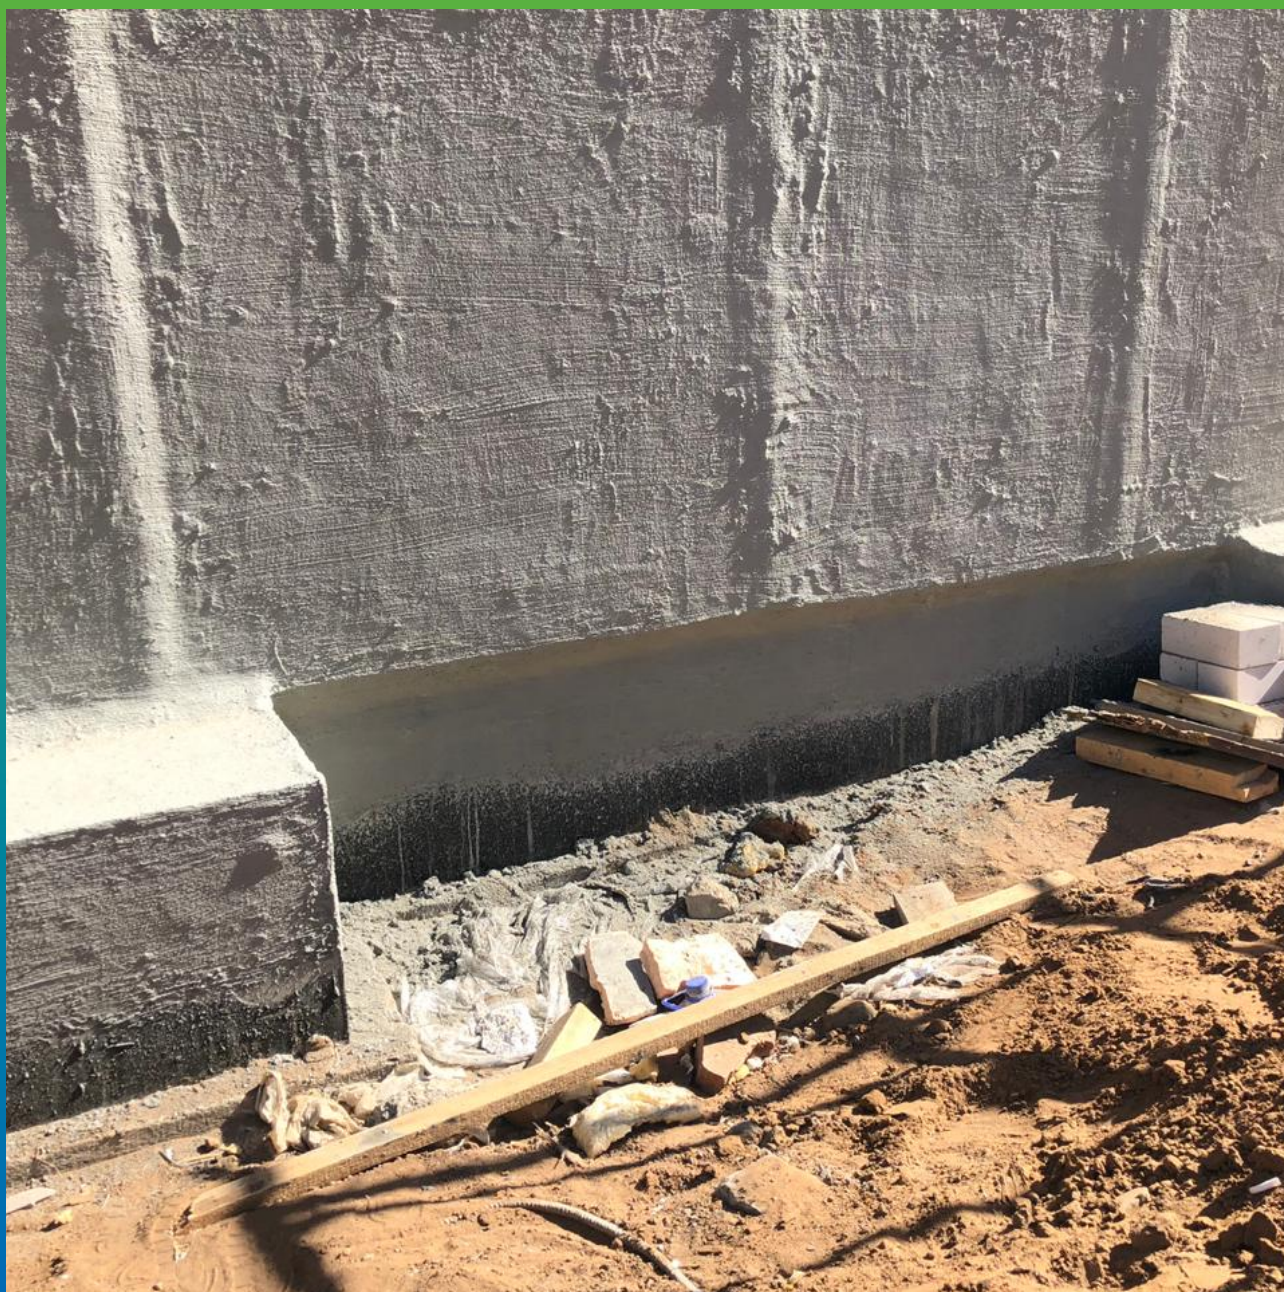

Гидроизоляционное покрытие Стармекс Сил.

ЖК "Тюльпан"




Гидроизоляционное покрытие Стармекс Сил.

ЖК "Тюльпан"



Монтаж утеплителя на гидроизолированную поверхность.

ЖК "Тюльпан"

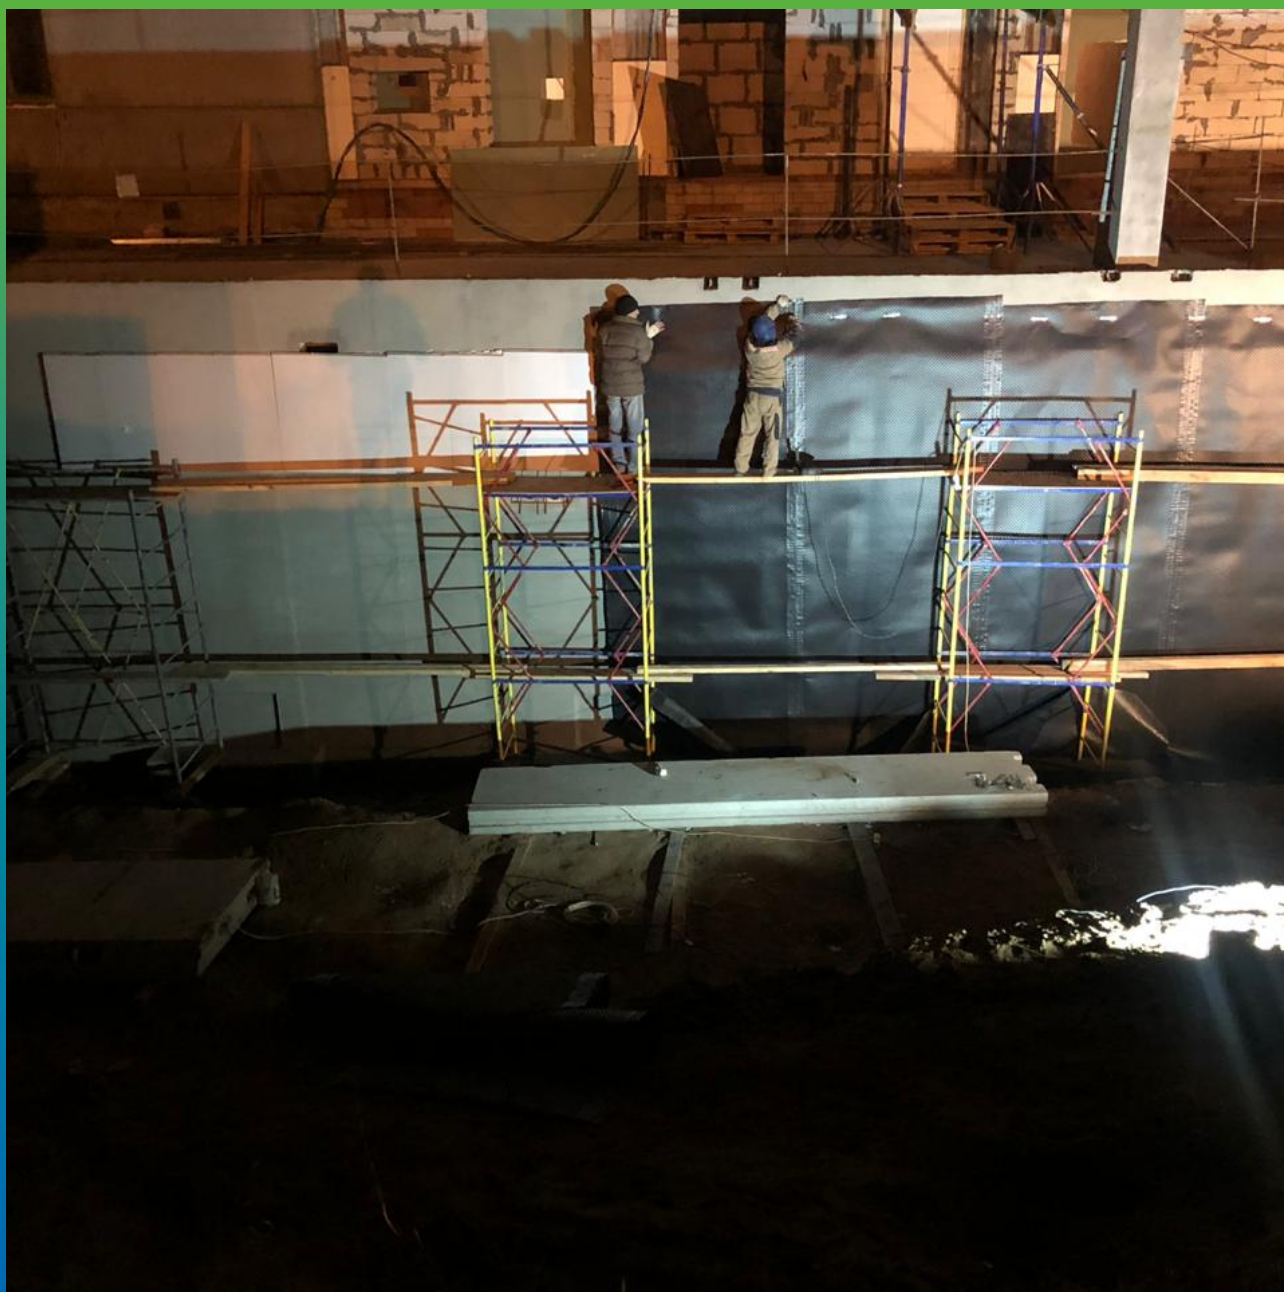

Защита гидроизоляции дренажным полотном перед обратной засыпкой.

ЖК "Тюльпан"



Участок, готовый к засыпке.

ЖК "Тюльпан"



Участок, готовый к засыпке.

Сводная информация об объекте



Вид работ

Дренаж
Гидроизоляция

Вид объекта

Жилые здания
Транспортные сооружения

Площадь, кв.м.

800

Местоположение

г. Набережные Челны

Дата проведения работ

Апрель 2019

Материалы и оборудование

Стармекс РМЗ
Стармекс Сил Флекс
Стармекс Чекан
