

Картотека выполненных объектов




ЛОГОПАРК ДОН

Устройство нескользящего напольного покрытия в промышленном холодильнике



4691

Логопарк Дон

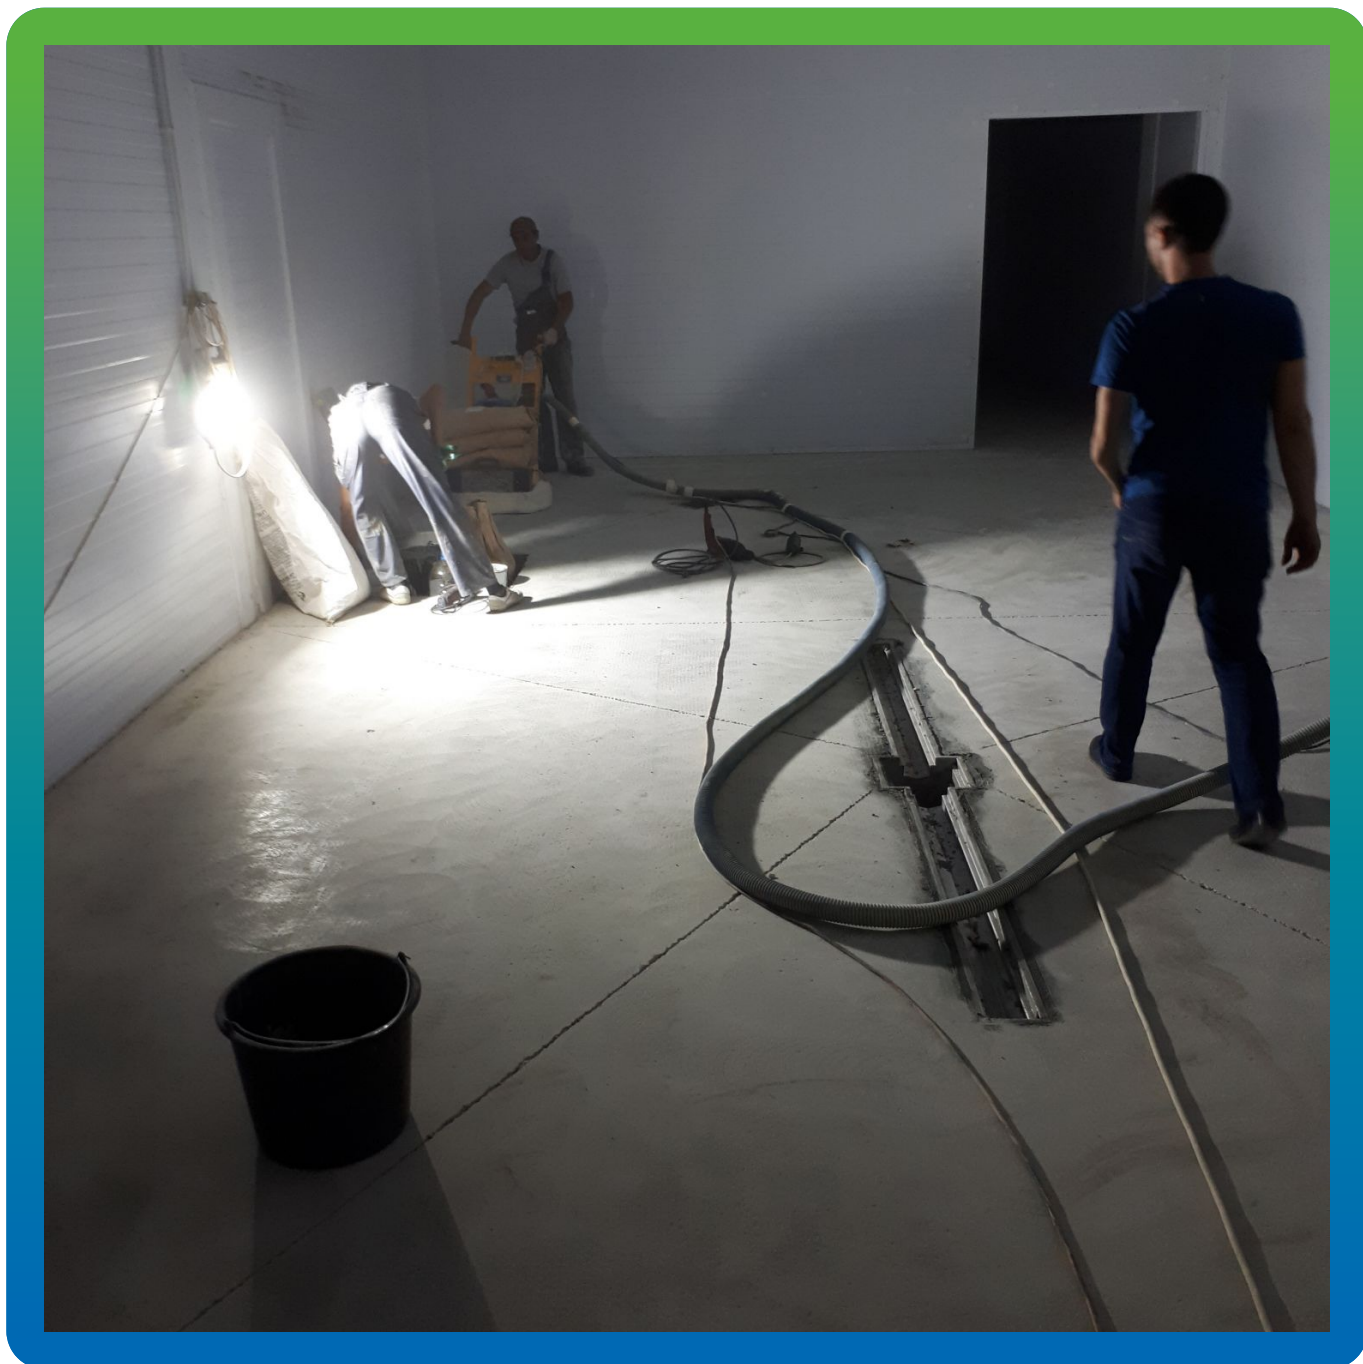

Шлифовка бетона

Логопарк Дон



Обеспыливание швов в бетоне

Логопарк Дон



Сбор пыли промышленным пылесосом

Логопарк Дон



Поверхность до нанесения полимерных составов

Логопарк Дон



Подготовка двухкомпонентной эпоксидной грунтовки ДенТоп ЭП 104

Логопарк Дон



Добавление загустителя в грунтовку для формирования плитусов

Логопарк Дон



Добавление кварцевого песка для тиксотропного состава под плинтуса

Логопарк Дон



Грунтование пола перед устройством эпоксидного плитуса

Логопарк Дон




Процесс формирования плинтуса из эпоксидно-песчаной массы

Логопарк Дон



Выполненный плинтус до покраски

Логопарк Дон

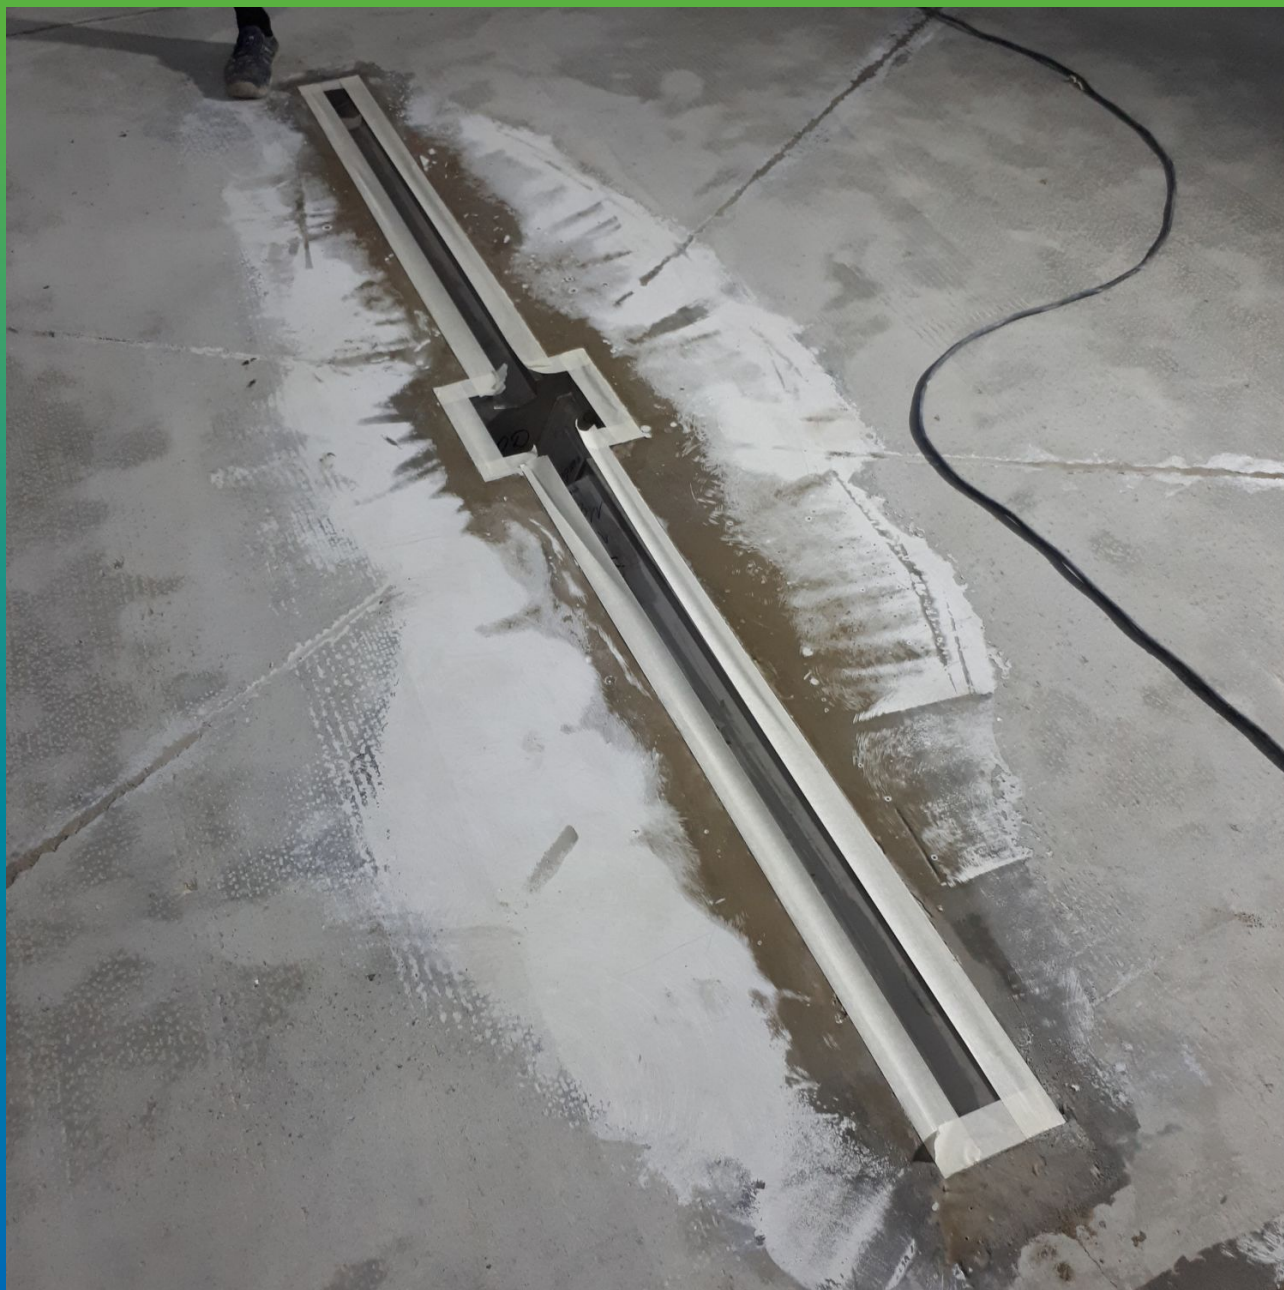

Выравнивание грунтовкой ДенТоп ЭП 104 с песком обрамления вокруг ЛОТКОВ

Логопарк Дон



Перемешивание базового эпоксидного состава ДенТоп ЭП 501

Логопарк Дон



Подбор нескользящей текстуры пола

Логопарк Дон



Загрунтованная поверхность пола эпоксидной грунтовкой ДенсТоп ЭП 104

Логопарк Дон



Загрунтованный пол

Логопарк Дон



В процессе покрытия базового слоя ДенТоп ЭП 501

Логопарк Дон




Первый глянцевый слой ДенсТоп ЭП 501

Логопарк Дон



Выполненный первый слой ДенсТоп ЭП 501

Логопарк Дон

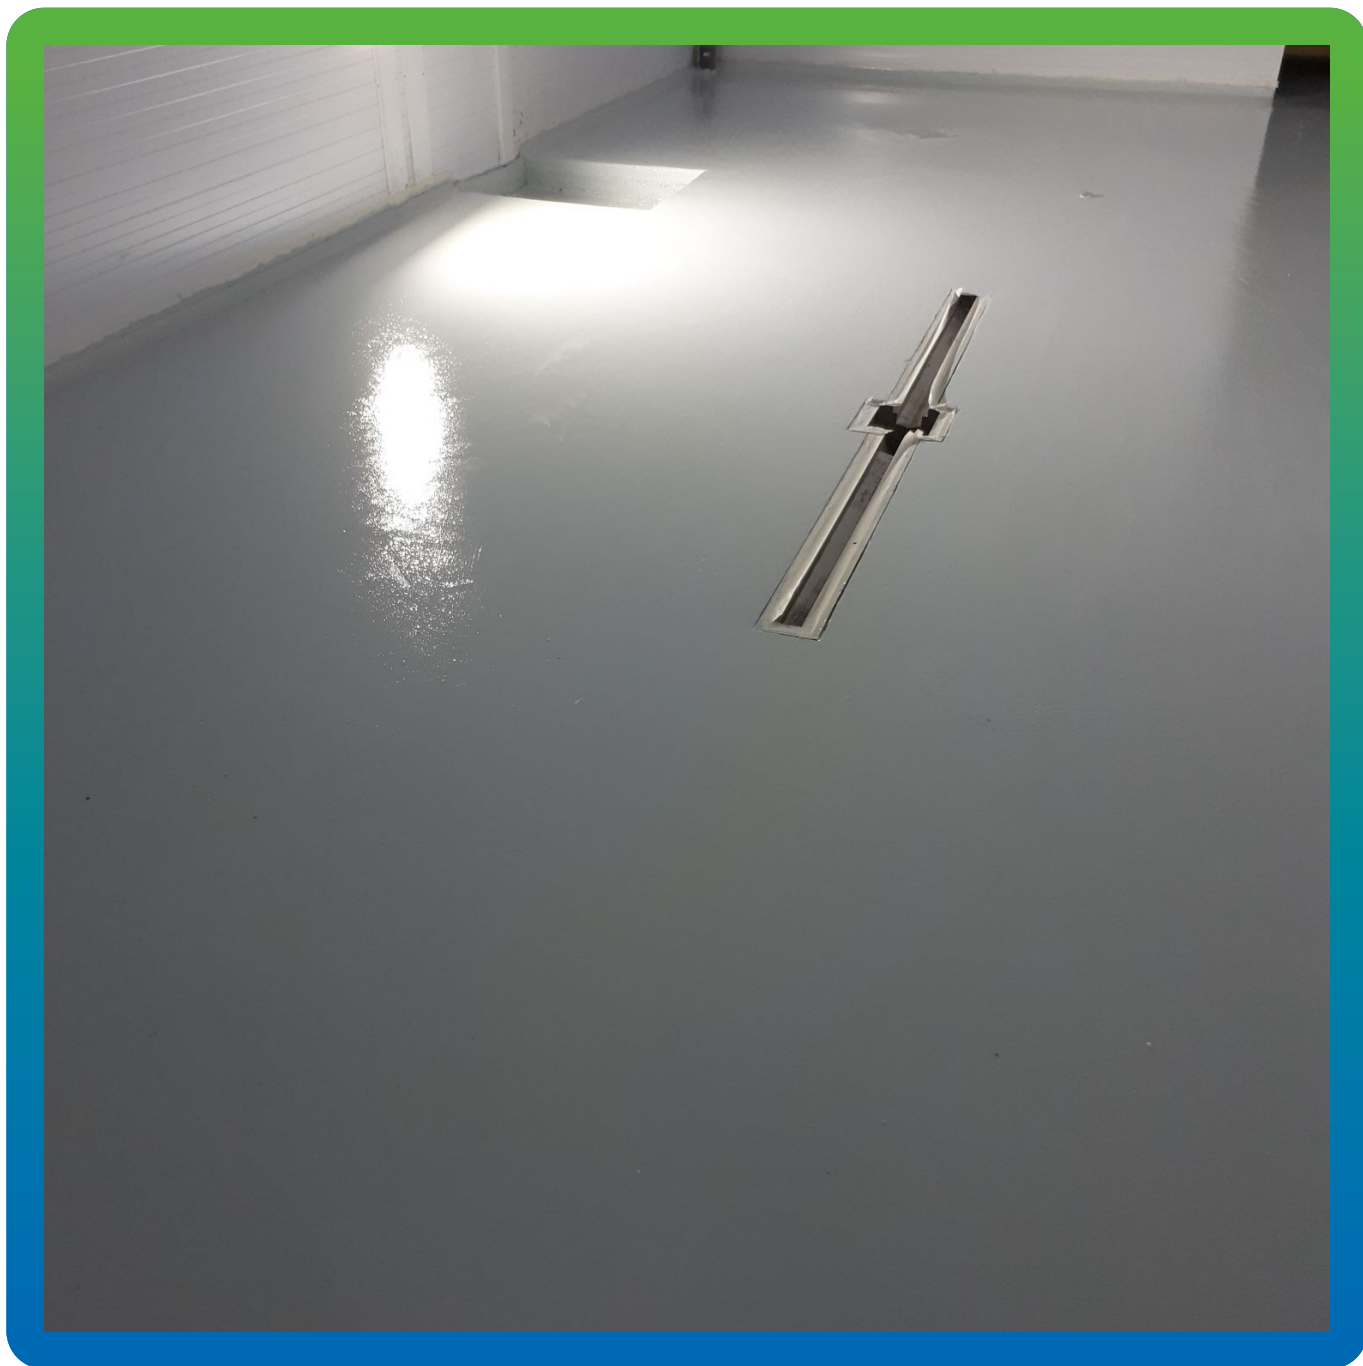

Покрытие вторым слоем ДенсТоп ЭП 501 с загустителем

Логопарк Дон



Финишный вид нескользящей поверхности

Логопарк Дон



Нарезка швов по периметру лотков

Сводная информация об объекте



Вид работ

Устройство полов

Вид объекта

Промышленное строительство

Площадь, кв.м.

175

Местоположение

Аксайский р-н

Дата проведения работ

Июль 2019

Материалы и оборудование

ДенсТоп ЭП 500

ДенсТоп ЭП 104
