

Картотека выполненных объектов



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЗАВОД

Устройство основания



4898

Промышленный завод



Утрамбовка щебня

Промышленный завод



Укладка и вязка арматуры

Промышленный завод



Смачивание основания

Промышленный завод



Материалы на объекте

Промышленный завод



Материалы на объекте

Промышленный завод



Просыпка состава Стармекс Сил на увлажненное основание

Промышленный завод



Просыпка состава Стармекс Сил на увлажненное основание

Промышленный завод



Заливка и укладка бетона

Промышленный завод



Заливка и укладка бетона

Промышленный завод



Заливка и укладка бетона

Промышленный завод



Распределение топпинга Стармекс Топ КР скриббоксами

Промышленный завод



Распределение топпинга Стармекс Топ КР скридбоксами

Промышленный завод



Распределение топпинга Стармекс Топ КР ручным способом в стесненных условиях

Промышленный завод



Распределение топпинга Стармекс Топ КР ручным способом в стесненных условиях

Промышленный завод



Затирка топпинга специальными машинами (вертолётными)

Промышленный завод



Затирка топпинга специальными машинами (вертолётными)

Промышленный завод



Затирка топпинга специальными машинами (вертолётками)

Промышленный завод




Нанесение средства для ухода за топпингами - кюринга Маногард Топ 120

Промышленный завод



Нанесенный кюринг Маногард Топ 120

Промышленный завод

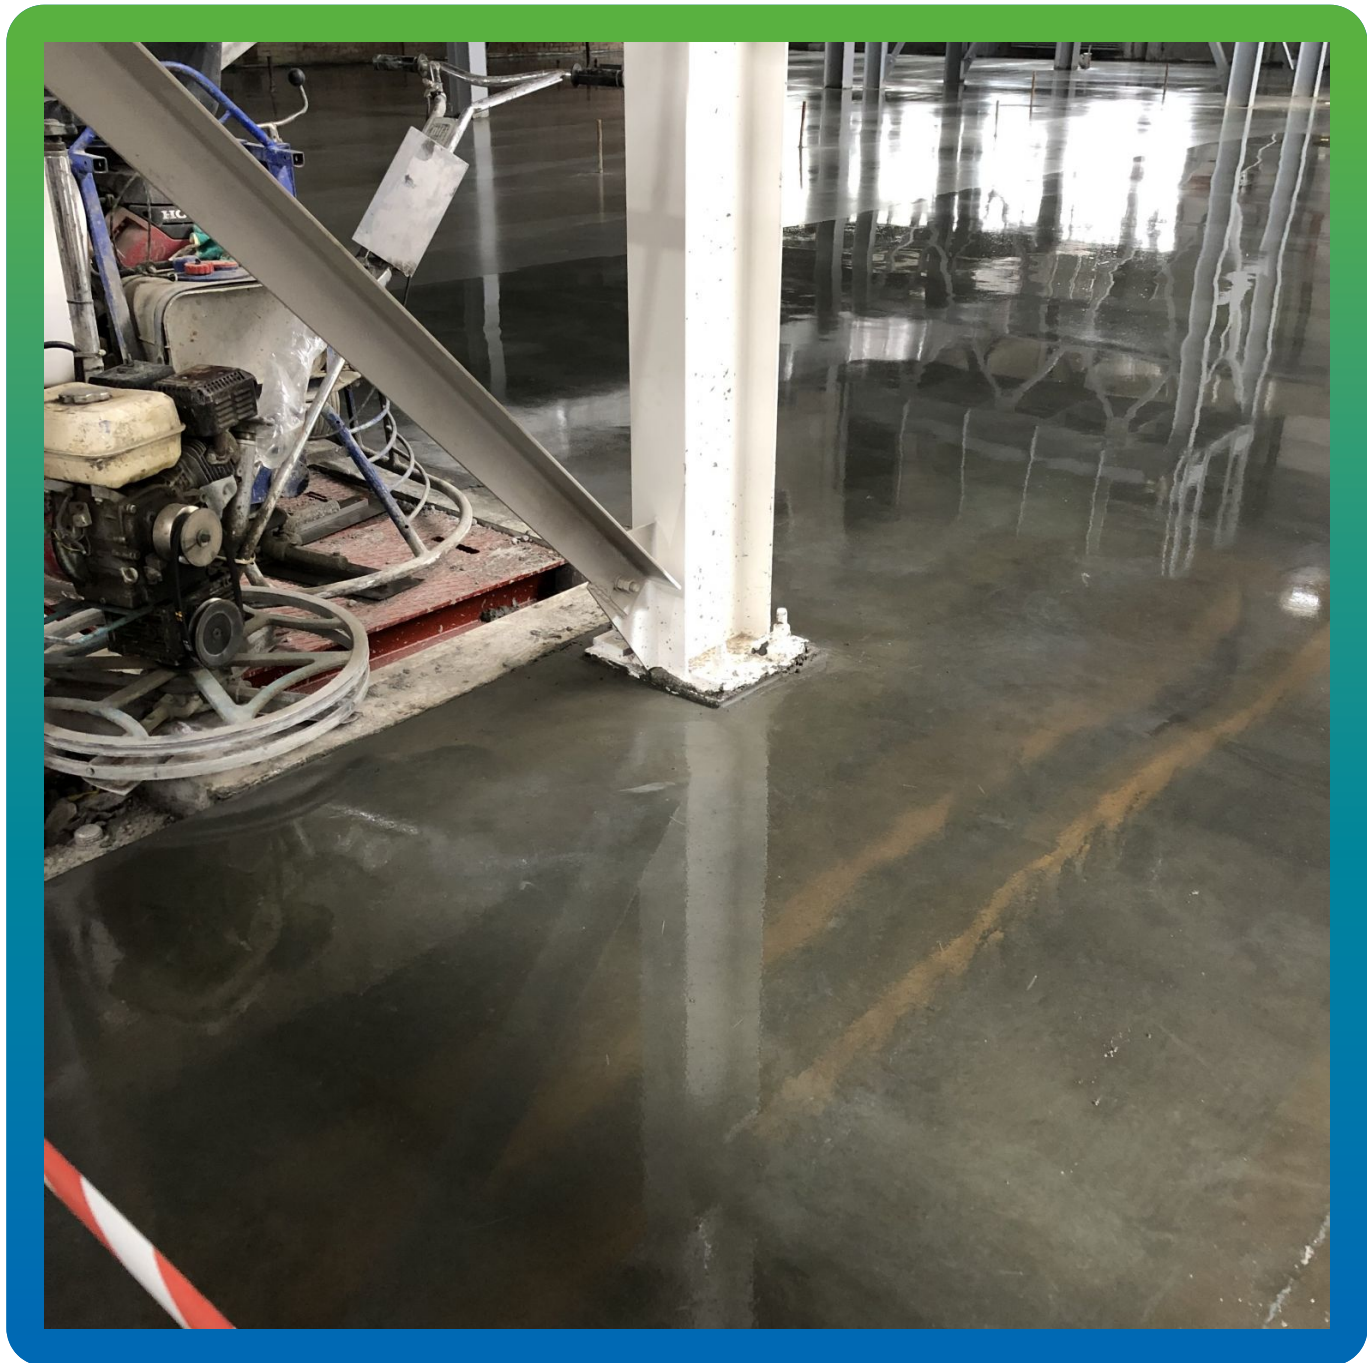

Нанесенный кюринг Маногард Топ 120

Промышленный завод



Высыхающий кюринг матовеет

Промышленный завод




Высыхающий кюринг матовеет

Промышленный завод



В первые месяца эксплуатации кюринг стирается. Открывается естественная фактура топпинга

Промышленный завод

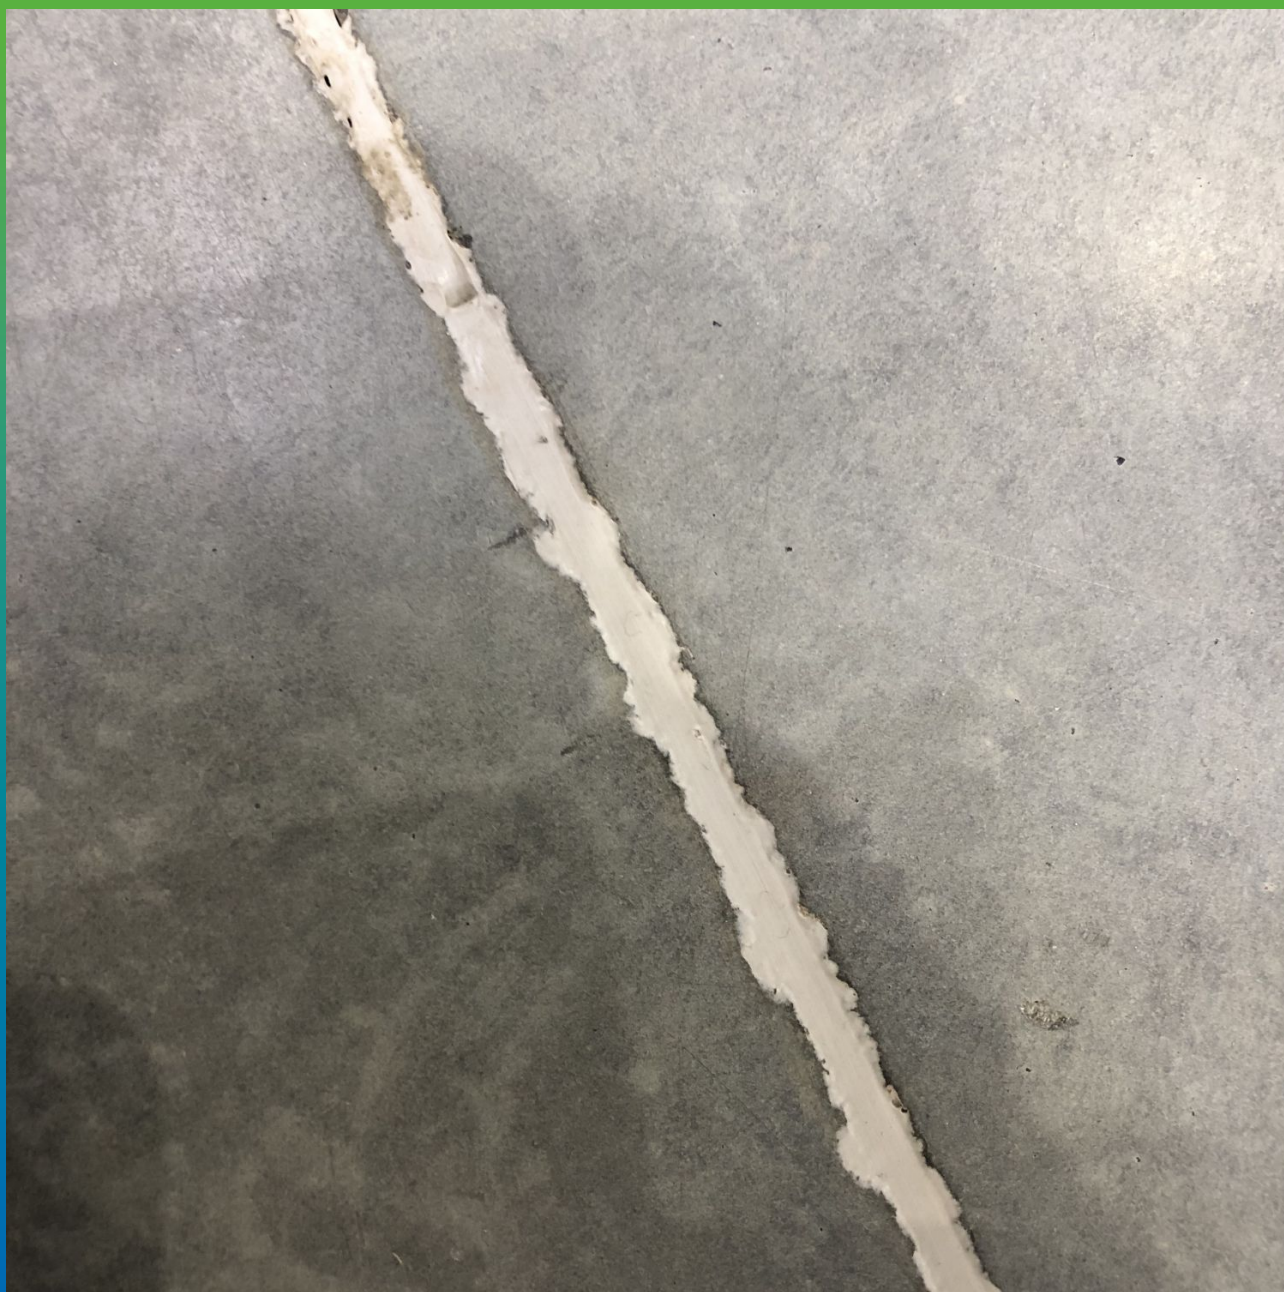

Швы топпингов нарезаются и заполняются герметиком Манодил ПУ 174

Промышленный завод



Швы топпингов нарезаются и заполняются герметиком Манодил ПУ 174

Промышленный завод



Отмытый и эксплуатируемый топпинг Стармекс Топ КР

Промышленный завод



Отмытый и эксплуатируемый топпинг Стармекс Топ КР

Сводная информация об объекте



Вид работ

Устройство полов

Вид объекта

Промышленное строительство

Площадь, кв.м.

3000

Местоположение

г. Екатеринбург

Дата проведения работ

Сентябрь 2019

Материалы и оборудование

ДенсТоп ЭП 500
Маногард Топ 120
ДенсТоп ЭП 106
ДенсТоп ПМ 605 Тровел
ДенсТоп ЭП 105 АС
ДенсТоп ПМ 600
ДенсТоп ЭП 500 АС
Стармекс Топ КР
