

Картотека выполненных объектов



ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ

Гидроизоляция кровли ЭПДМ мембраной



5302

Производственное здание



Вид кровли перед монтажом утеплителя

Производственное здание



Мембрана Преласты СТ 1,2 мм. сваренная и упакованная специальным образом

Производственное здание



Монтаж утеплителя

Производственное здание



Шайба Центрикс в заводской упаковке

Производственное здание



Шайба Центрикс с крепежом для фиксации мембраны к основанию, без прокола мембраны

Производственное здание



Монтаж шайб Центрикс с расходом 5 шт./1 м<sup>2</sup>

Производственное здание



Установленные шайбы Центрикс

Производственное здание




Распаковка мембраны Преласта СТ 1,2 мм. на строительной площадке

Производственное здание



Укладка мембраны на основание

Производственное здание

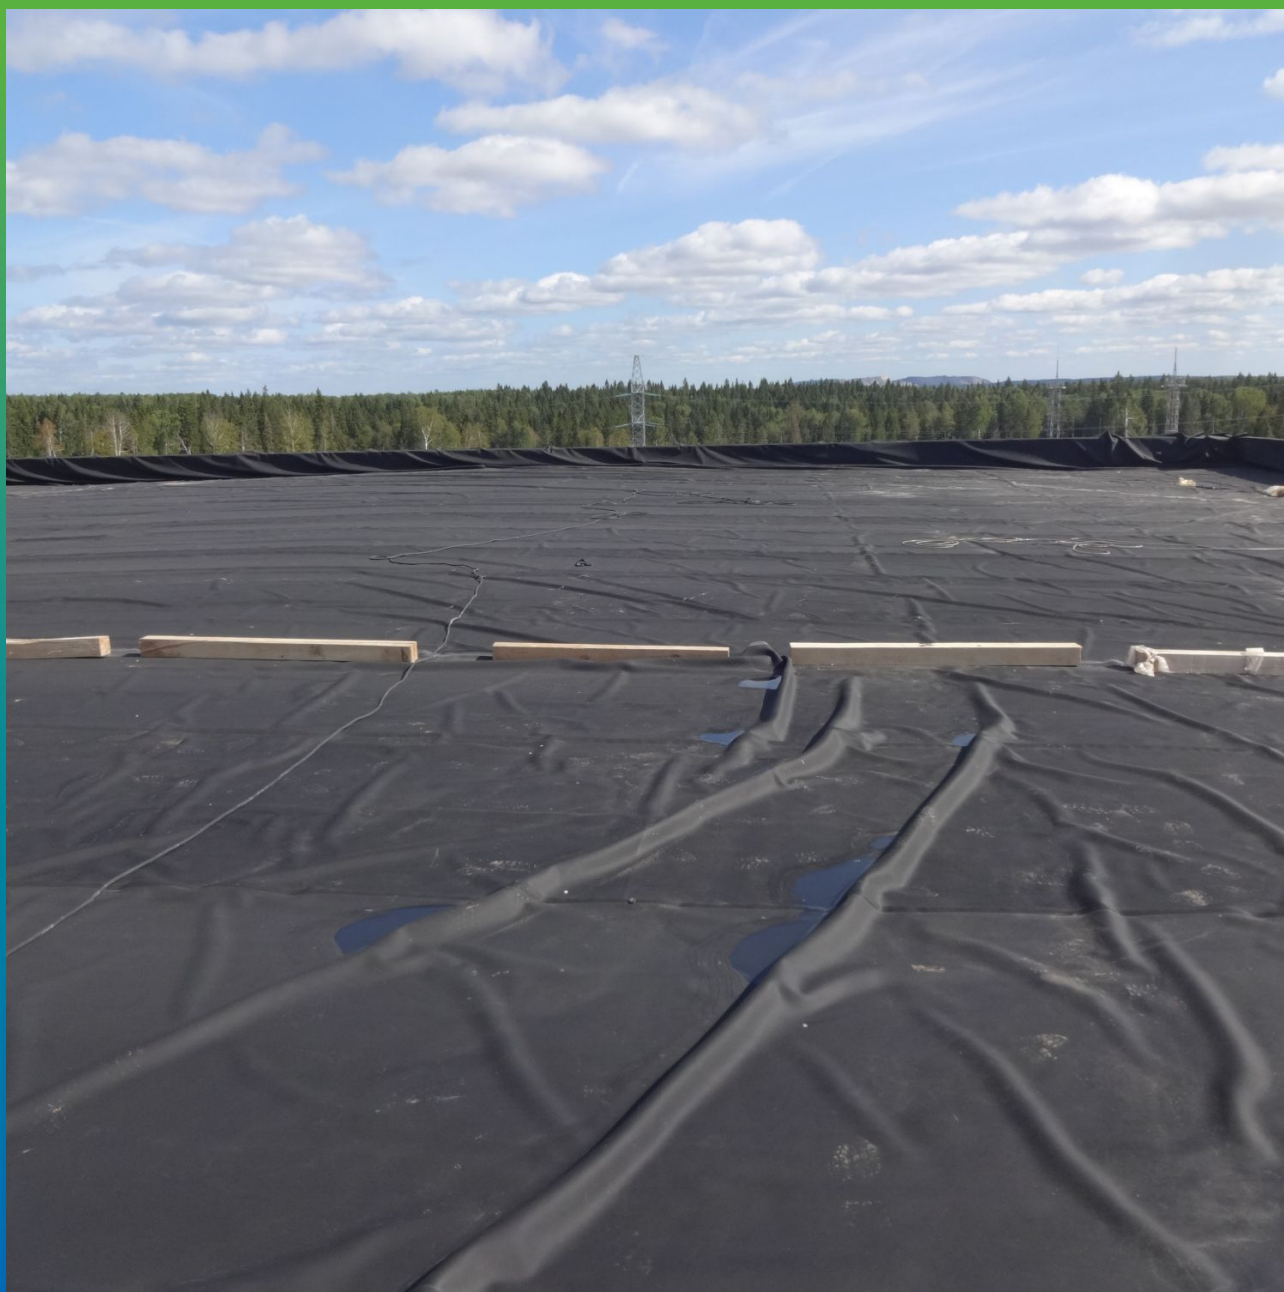

Вид готовой мембраны готовой для производства дальнейших работ

Производственное здание



Сварка строительным феном на объекте двух полотен мембраны м/у собой с помощью ленты Термобонд

Производственное здание



Процесс приварки мембраны Преласты СТ 1,2 мм к шайбам Центрикс с помощью индукционного аппарата

Производственное здание



Установка специальных магнитов для фиксации мембраны и шайбы, а также охлаждения сваренного участка

Производственное здание



Процесс приклеивания мембраны к парапетам кровли на клей П-400

Производственное здание



Вид кровли после производства работ

Производственное здание



Сдача кровли заказчику после проведения всех работ

## Сводная информация об объекте



### Вид работ

Герметизация

### Вид объекта

Промышленное строительство

### Площадь, кв.м.

1600

### Местоположение

г. Пермь

### Дата проведения работ

Август 2020

### Материалы и оборудование

Манодил Бонд Ф  
Преласты СТ  
Лента Термобонд  
Индукционный аппарат  
Центрикс  
Шайба Центрикс
