

Картотека выполненных объектов



ТЦ ПАВЕЛЕЦКАЯ ПЛАЗА

Устройство напольного покрытия



6126

ТЦ Павелецкая Плаза



Основание до подготовки

ТЦ Павелецкая Плаза



Подготовка поверхности бетона с помощью шлифовальной машины

ТЦ Павелецкая Плаза



Нанесение грунтовочного состава ДенСтон ЭП 100 + ДенСтон Филлер 004

ТЦ Павелецкая Плаза




Ремонт и грунтования швов и дефектов на поверхности перед нанесением 2-го слоя.

ТЦ Павелецкая Плаза



Весовой контроль в соотношении воды с сухой смесью

ТЦ Павелецкая Плаза

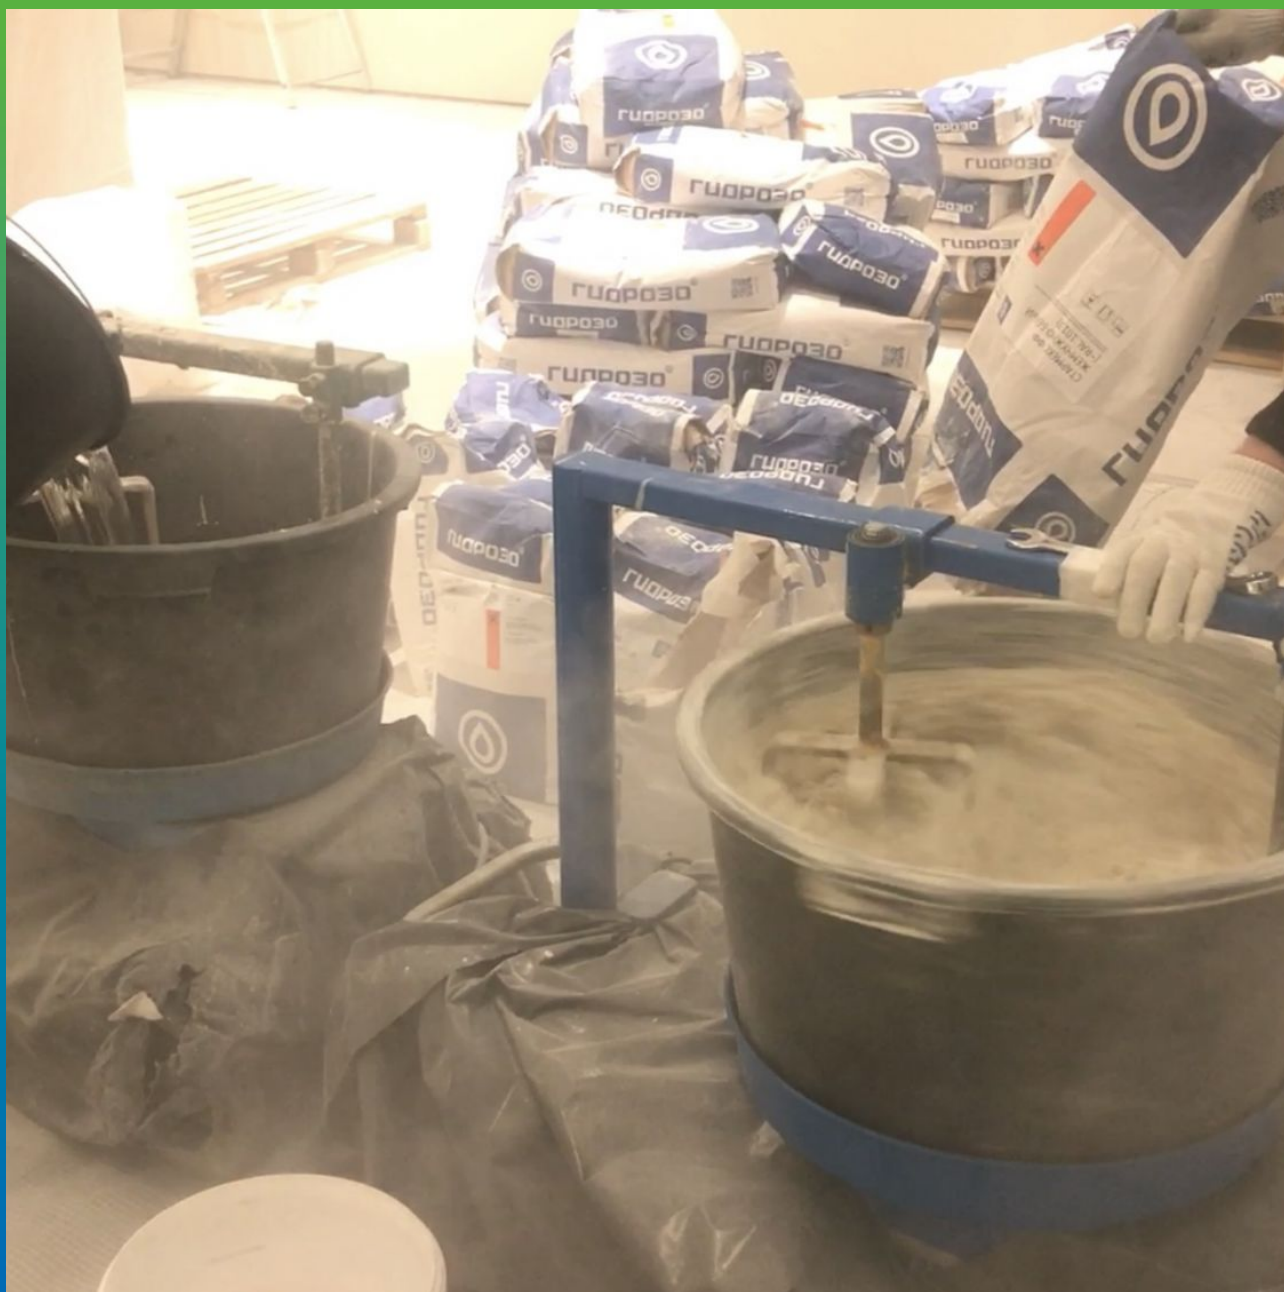

Процесс смешивания сухой смеси Стармекс ФФ с водой

ТЦ Павелецкая Плаза



Нанесение состава Стармекс ФФ на поверхность

ТЦ Павелецкая Плаза




Общий вид покрытия Стармекс ФФ до покрытия защитного слоя Маногард Топ 115

ТЦ Павелецкая Плаза




Обеспыливание поверхности перед нанесением пропитки Маногард Топ 115

ТЦ Павелецкая Плаза

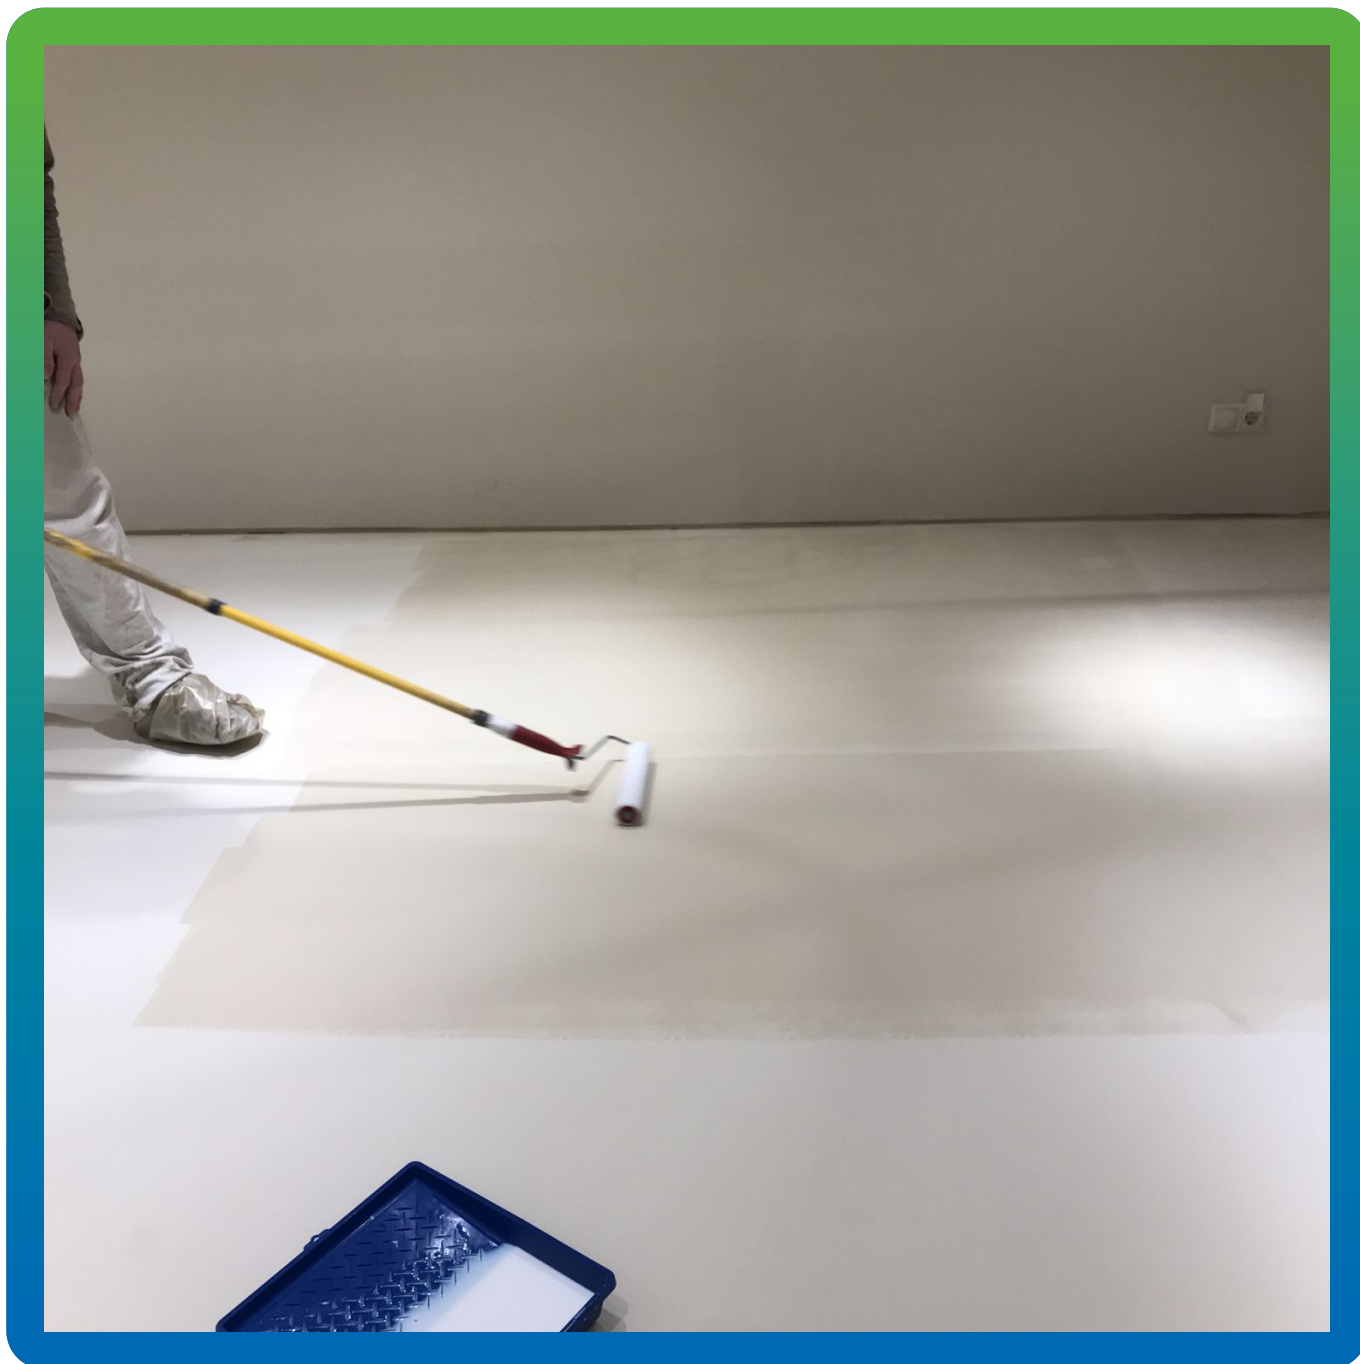

Нанесение в 2 слоя защитного состава Маногард Топ 115

ТЦ Павелецкая Плаза

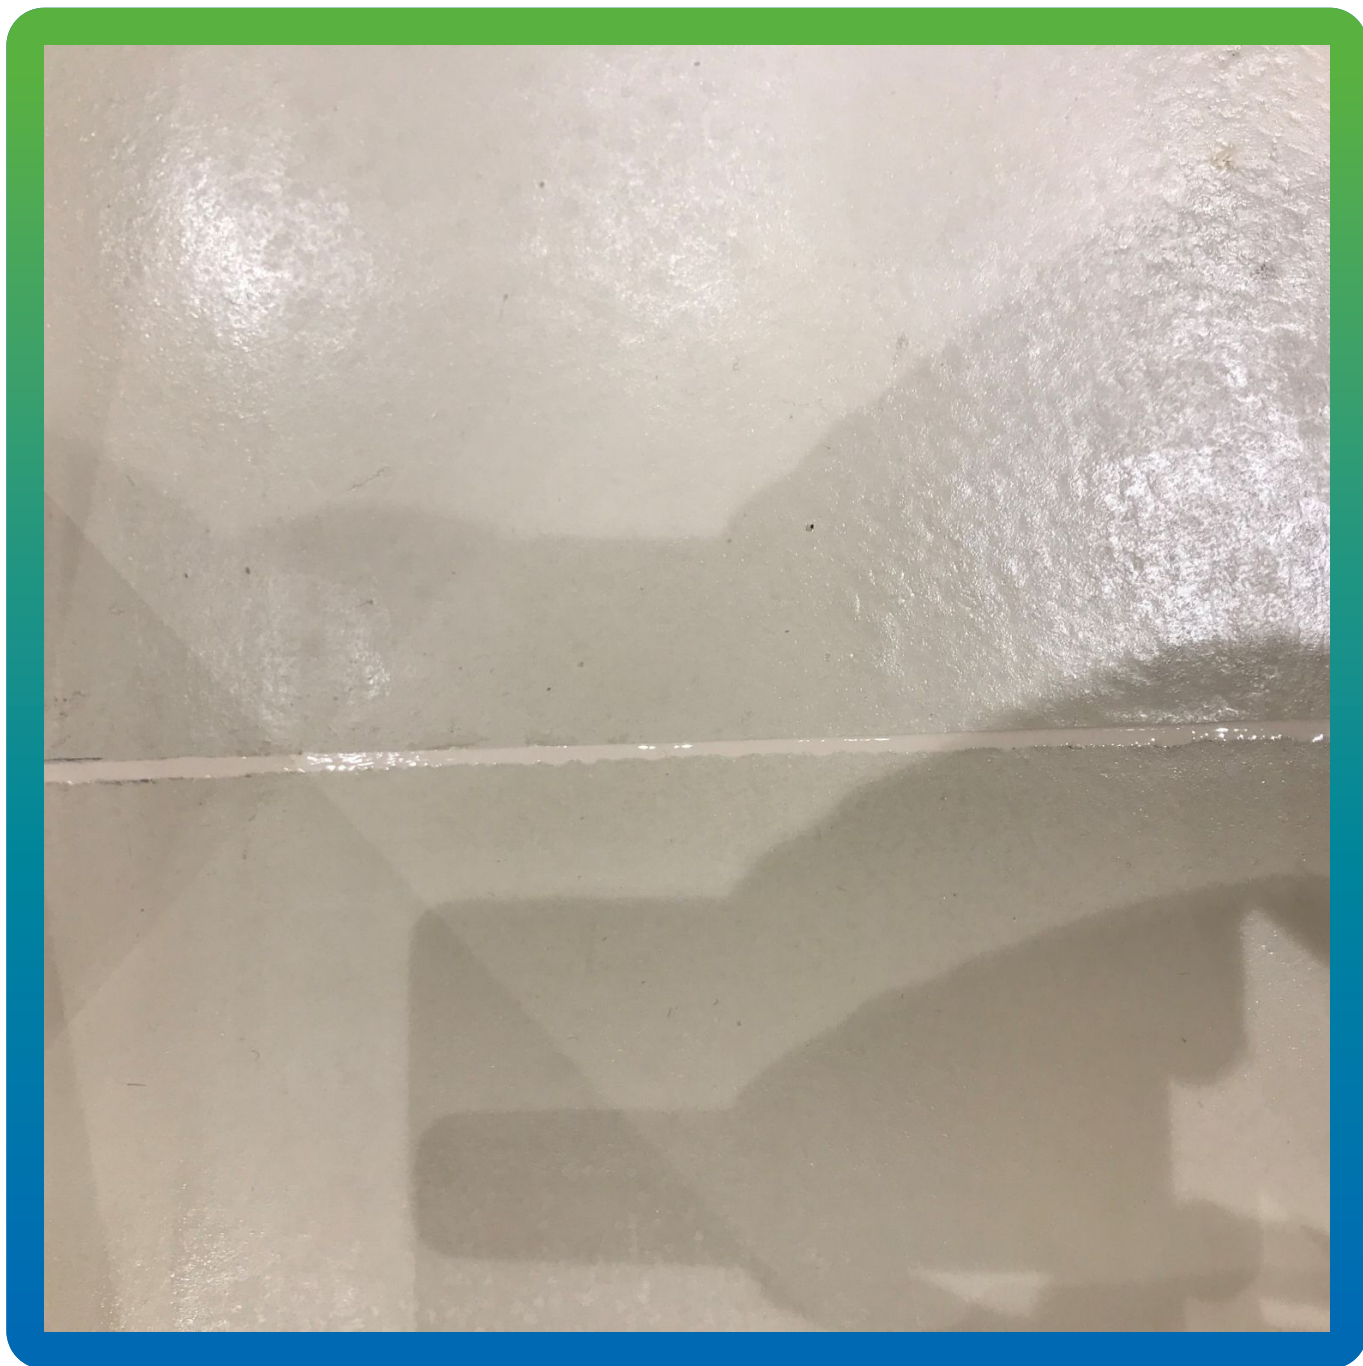

Заполнение пропил и швов герметиком Манодил ПУ 696

ТЦ Павелецкая Плаза



Итоговый финишный вид покрытия Стармекс ФФ + пропитка Маногард Топ 115

Сводная информация об объекте



Вид работ

Устройство полов

Вид объекта

Общественные здания

Площадь, кв.м.

450

Местоположение

г. Москва

Дата проведения работ

Январь 2022

Материалы и оборудование

ДенсТоп ЭП 100
Стармекс ФФ
Манодил ПУ 696
ДенсТоп Филлер
Манодил ПУ 90
Маногард Топ 115
