

Картотека выполненных объектов



ПАРКИНГ ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. ЧАПАЕВА,
21

Гидроизоляция заглубленного сооружения



1746

Паркинг жилого дома по ул. Чапаева, 21



Поставка материала на объект

Паркинг жилого дома по ул. Чапаева, 21



Демонтаж конструкций для подступа ко шву

Паркинг жилого дома по ул. Чапаева, 21



Расшивка швов и их подготовка

Паркинг жилого дома по ул. Чапаева, 21



Грунтовка швов раствором Максрест

Паркинг жилого дома по ул. Чапаева, 21



Чеканка швов ремонтным составом Максрест, водонасыщенных швов гидравлическим полимер-цементом Максплаг

Паркинг жилого дома по ул. Чапаева, 21



Сверление шпуров пересекающих швы и сетки возможных трещин

Паркинг жилого дома по ул. Чапаева, 21



Установка инъекционных пакеров

Паркинг жилого дома по ул. Чапаева, 21




Проверка оборудования перед началом инъецирования

Паркинг жилого дома по ул. Чапаева, 21



Процесс инъектирования первой стадии - остановка течи и гидроизоляция швов вспенивающейся полиуретановой смолой Манопур С

Паркинг жилого дома по ул. Чапаева, 21

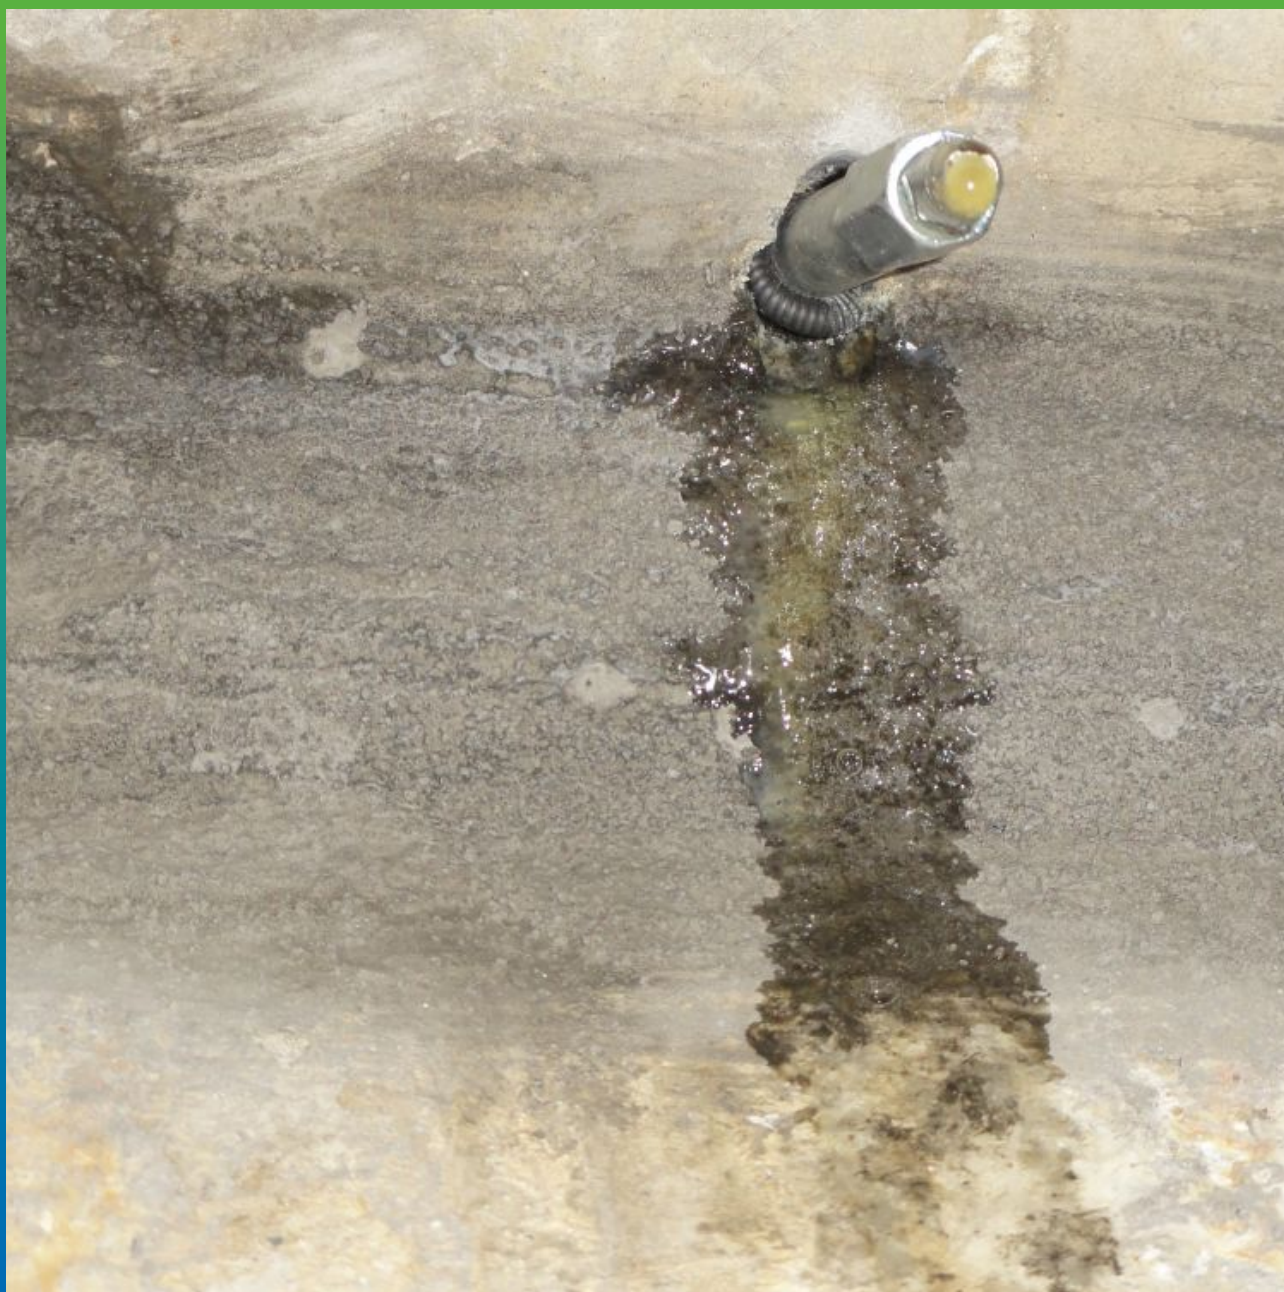

Процесс инъектирования второй стадии в те же пакеры - создание напорной пробки швов не вспенивающейся полиуретановой смолой Манопур 143

Паркинг жилого дома по ул. Чапаева, 21




Удаление пакеров. Заделка шпуров ремонтным составом Максрест, и устройство гидроизоляционного эластичного покрытия Макссил Флекс.

Паркинг жилого дома по ул. Чапаева, 21



Итоговый результат. Полностью устранены течи по деформационному шву и предполагаемым сеткам трещин.

Сводная информация об объекте

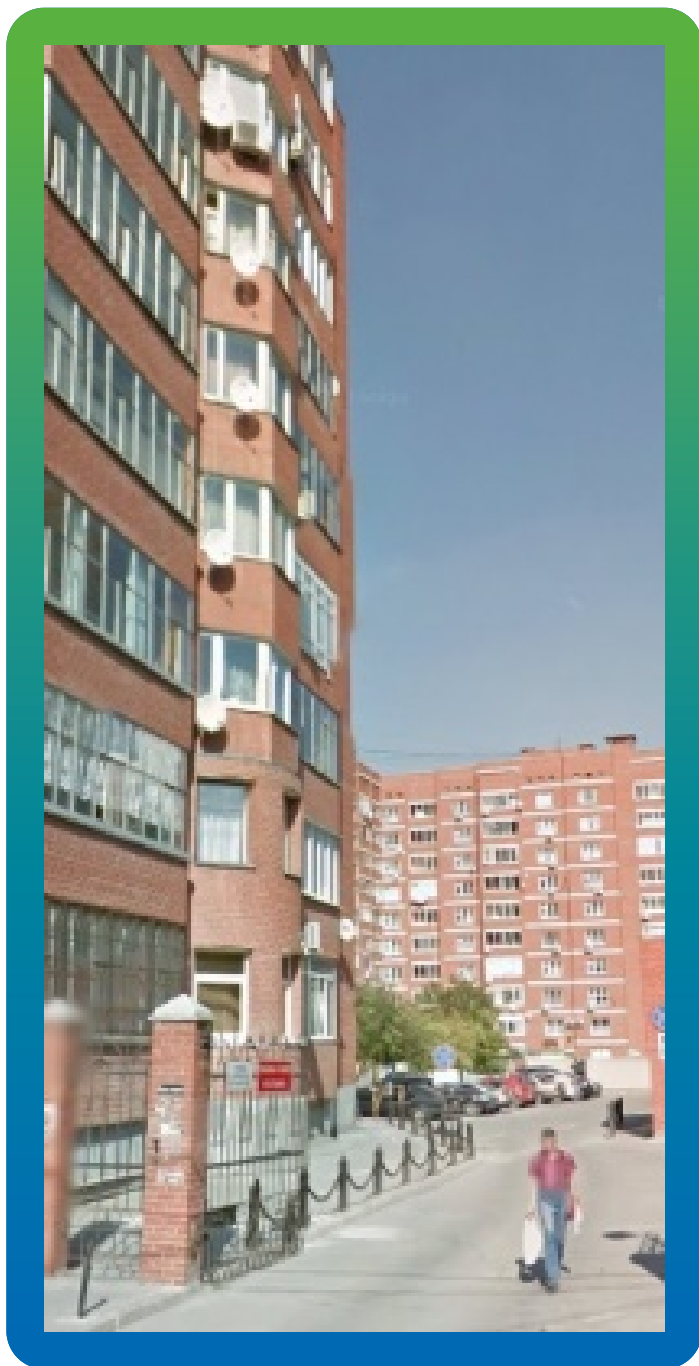

Вид работ

Инъектирование
Гидроизоляция

Вид объекта

Жилые здания

Площадь, кв.м.

80

Местоположение

г. Екатеринбург

Дата проведения работ

Июнь 2014

Материалы и оборудование

Манопур С
Манопур 143
Максплаг
Максил Флекс
Максрест
