

Картотека выполненных объектов




ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "ЧЕРТАНОВСКИЙ"

Гидроизоляция санузлов



1983

Жилой комплекс "Чертановский"

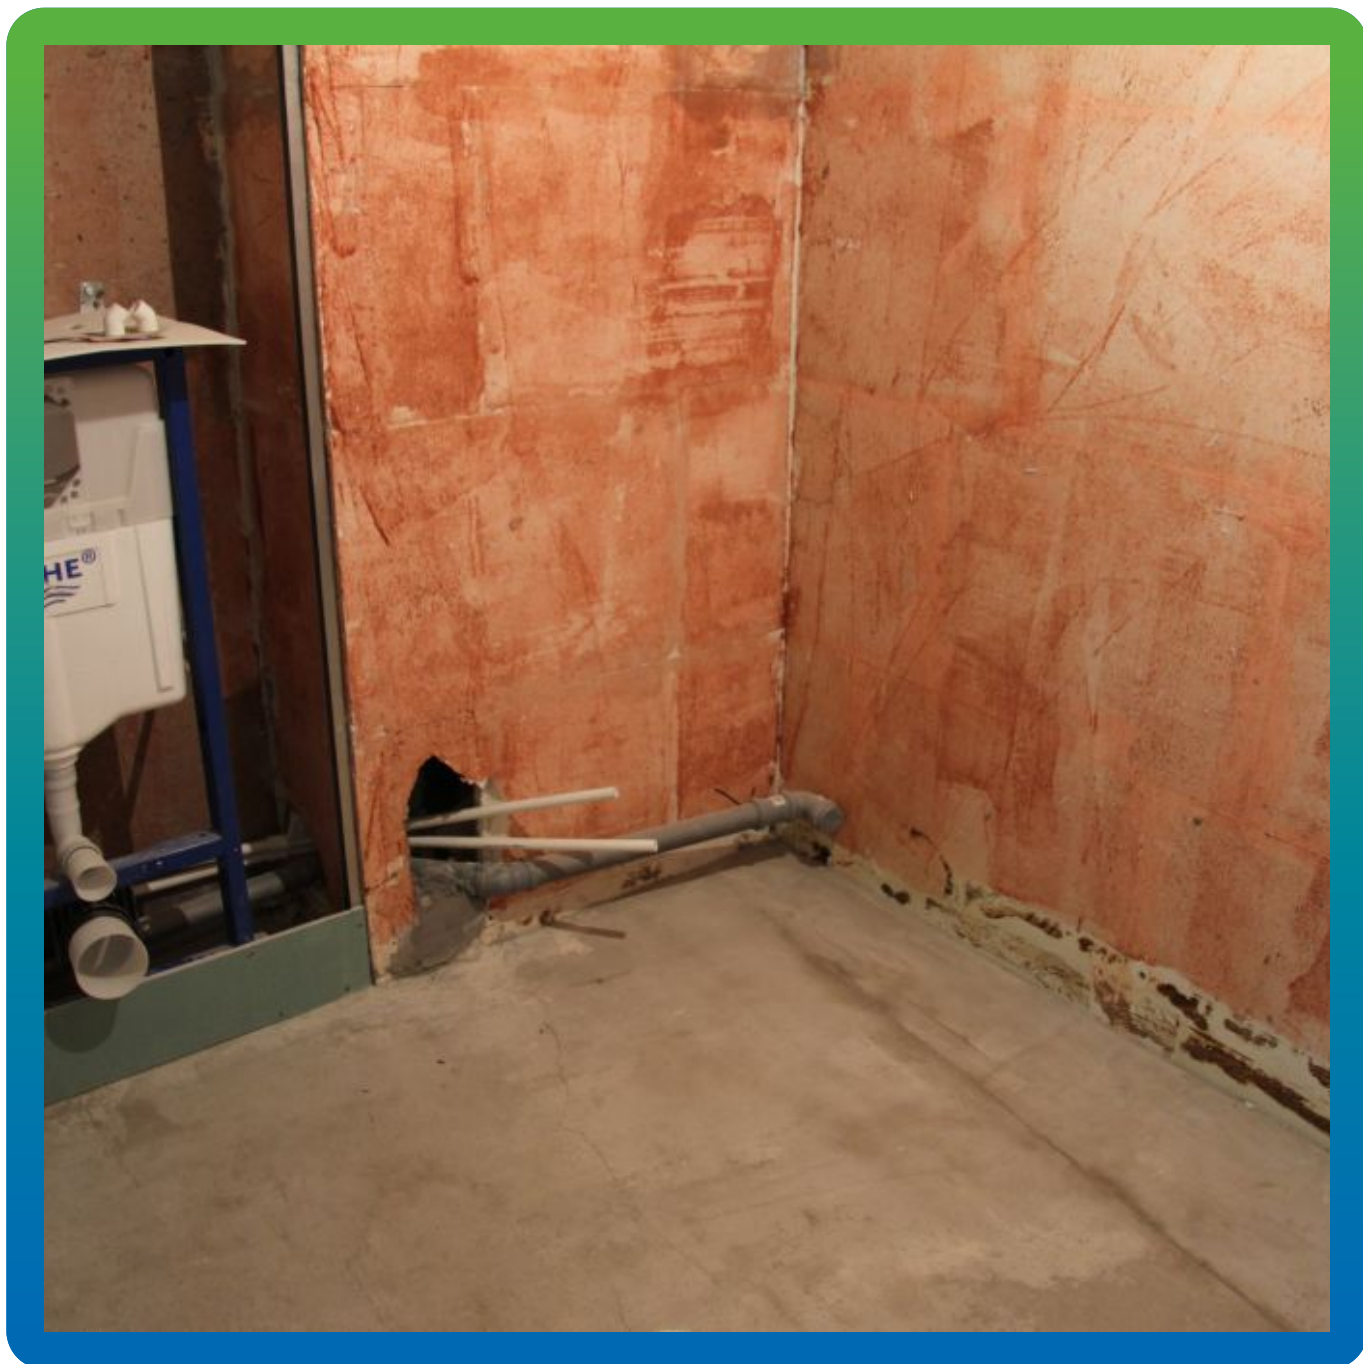

Основание предварительно очищено от мусора и пыли для обеспечения хорошей адгезии материала.

Жилой комплекс "Чертановский"



Гидроизоляционная мастика ДенТоп АК 221 поставляется в готовом для работы виде.

Жилой комплекс "Чертановский"



Вода потребуется для приготовления грунтовочного состава – 4 л ДенСтон АК 221 и 1 л воды.

Жилой комплекс "Чертановский"



Приготовление грунтовочного состава, более подвижного по сравнению с ДенсТоп АК 221. Это необходимо для более глубокого проникновения сост

Жилой комплекс "Чертановский"



Наносим грунтовочный состав кистью, тщательно промазывая углубления в поверхностях и щели на стыках.

Жилой комплекс "Чертановский"



Наносим грунтовочный состав ДенТоп АК 221 по периметру помещения.

Жилой комплекс "Чертановский"



Примыкания «пол-стена» обработанные 20% грунтовочным составом ДенсТоп АК 221.

Жилой комплекс "Чертановский"



Через полчаса наносим первый слой гидроизоляционной мастики ДенТоп АК 221 на отгрунтованные стены при помощи валика.

Жилой комплекс "Чертановский"



Для ускорения процесса нанесения можно вылить небольшое количество материала на пол.

Жилой комплекс "Чертановский"



Равномерно распределяем вылитый материал по поверхности.

Жилой комплекс "Чертановский"



Наносим первый слой покрытия на пол, придерживаясь одного направления при распределении материала. Направление нанесения последующего сл

Жилой комплекс "Чертановский"



Первый слой готов.

Жилой комплекс "Чертановский"



Через 3 часа приступаем к нанесению второго слоя.

Жилой комплекс "Чертановский"



Нанесение второго слоя начинаем с финишной обработки стыков примыканий кистью.

Жилой комплекс "Чертановский"



Покрываем стены по периметру валиком. В труднодоступных местах – кистью.

Жилой комплекс "Чертановский"



ДенТоп АК 221 образует сплошное бесшовное покрытие. Заполняет трещины и проникает в поры основания.

Жилой комплекс "Чертановский"



Выливаем небольшое количество материала на пол.

Жилой комплекс "Чертановский"



Равномерно распределяем второй слой ДенсТоп АК 221 перпендикулярно первому для исключения непрокрасов.

Жилой комплекс "Чертановский"



Вид на готовое покрытие. Работы по нанесению заняли 5 часов. мембрана может покрываться любыми отделочными материалами - плиткой, штукатурк

## Сводная информация об объекте



### Вид работ

Гидроизоляция

### Вид объекта

Жилые здания

### Площадь, кв.м.

80

### Местоположение

г. Москва

### Дата проведения работ

Апрель 2015

### Материалы и оборудование

ДенсТоп АК 221
