

Картотека выполненных объектов



РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРАНУЛЯЦИОННОЙ
БАШНИ

Ремонт бетонного основания и устройство
защитного покрытия



20183

Реконструкция грануляционной башни



Измерение температуры и влажности основания перед нанесением материалов

Реконструкция грануляционной башни



Подбор наиболее подходящего материала для работ по ремонту конструкции, путем пробного участка

Реконструкция грануляционной башни



Определение максимальной толщины нанесения материала за один проход

Реконструкция грануляционной башни



Материалы производства ООО "Гидрозо" на объекте

Реконструкция грануляционной башни



Подготовка поверхности путем отбивки непрочных участков конструкции

Реконструкция грануляционной башни



Нанесение пассиватора коррозии Маногард 133 Фер на оголенную арматуру

Реконструкция грануляционной башни



Нанесение грунтовочного слоя ДенсТоп ЭП 106 на пробном участке

Реконструкция грануляционной башни



Подготовка к нанесению ремонтного состава на эпоксидной основе
Манопокс 331

Реконструкция грануляционной башни



Грунтовка эпоксидным составом ДенТоп ЭП 106 на площади

Реконструкция грануляционной башни



Локальный ремонт деструктивных участков бетона эпоксидным ремонтным составом Манопокс 331 с загустителем Манопокс ТСМ

Реконструкция грануляционной башни



Нанесение ремонтного материала Манопокс 331 на площади

Реконструкция грануляционной башни



Контроль нанесения материалов с земли, путем фиксации с увеличением отдельных участков

Реконструкция грануляционной башни



Работа на высоте с материалом Манопокс 331

Реконструкция грануляционной башни



Запечатывание штроб составом Манопокс 331 в ремонтируемой поверхности после извлечения маяков

Реконструкция грануляционной башни



Заполнение пустот и трещин на горизонтальных участках составом Манопокс 352

Реконструкция грануляционной башни



Ремонт горизонтальных участков материалом Манопокс 331

Реконструкция грануляционной башни




Ремонт внутренних горизонтальных участков грануляционной башни

Реконструкция грануляционной башни



Ремонт внутренних вертикальных участков грануляционной башни

Реконструкция грануляционной башни

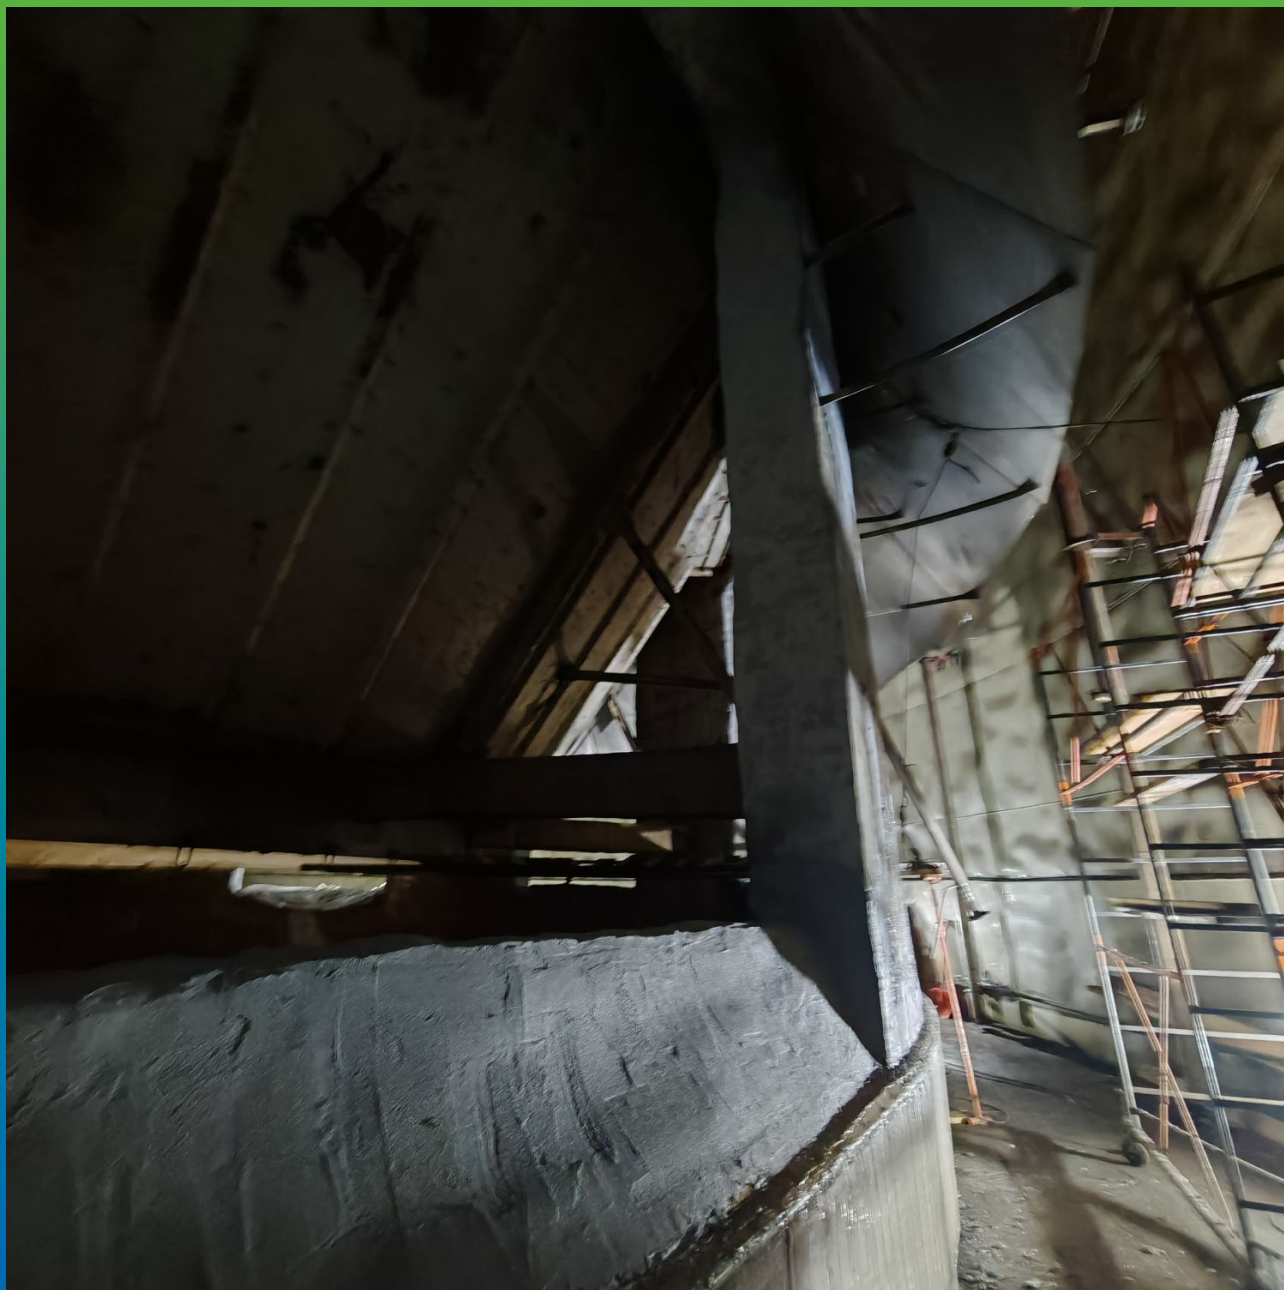

Внутренняя часть башни после проведения работ

Реконструкция грануляционной башни



Подбор наиболее подходящей краски для финишной окраски Грануляционной башни, путем пробных выкрасов и оценки полученного результата

Реконструкция грануляционной башни



Нанесение финишного защитного покрытия в первый слой ДенТоп АК 232

Реконструкция грануляционной башни



Нанесение второго защитного слоя акрилового состава на растворителях ДенсТоп АК 232

Сводная информация об объекте



Вид работ

Защита
Ремонт бетона

Вид объекта

Промышленное строительство

Площадь, кв.м.

8000

Местоположение

г. Пермь

Дата проведения работ

Апрель 2023

Материалы и оборудование

Манопур 15
Манопур 143
Манопокс 352
Манопокс 331
ДенсТоп ЭП 106
Манопокс Тикс
Стармекс РМ Супер
ДенсТоп АК 232
