

Картотека выполненных объектов



КАРДИОЦЕНТР

Усиление плит перекрытия



20685

Кардиоцентр



Материалы Гидрозо на объекте

Кардиоцентр



Пропитка клеевым составом заранее нарезанных по размерам Армошел KB 200

Кардиоцентр



Монтаж холстов на конструкцию

Кардиоцентр



Общий вид смонтированной системы усиления на клей Манопокс 372

Кардиоцентр




Подготовка к нанесению системы огнезащиты Пирошел Цем

Кардиоцентр



Нанесение грунтовочного слоя Пирошел Бонд

Кардиоцентр

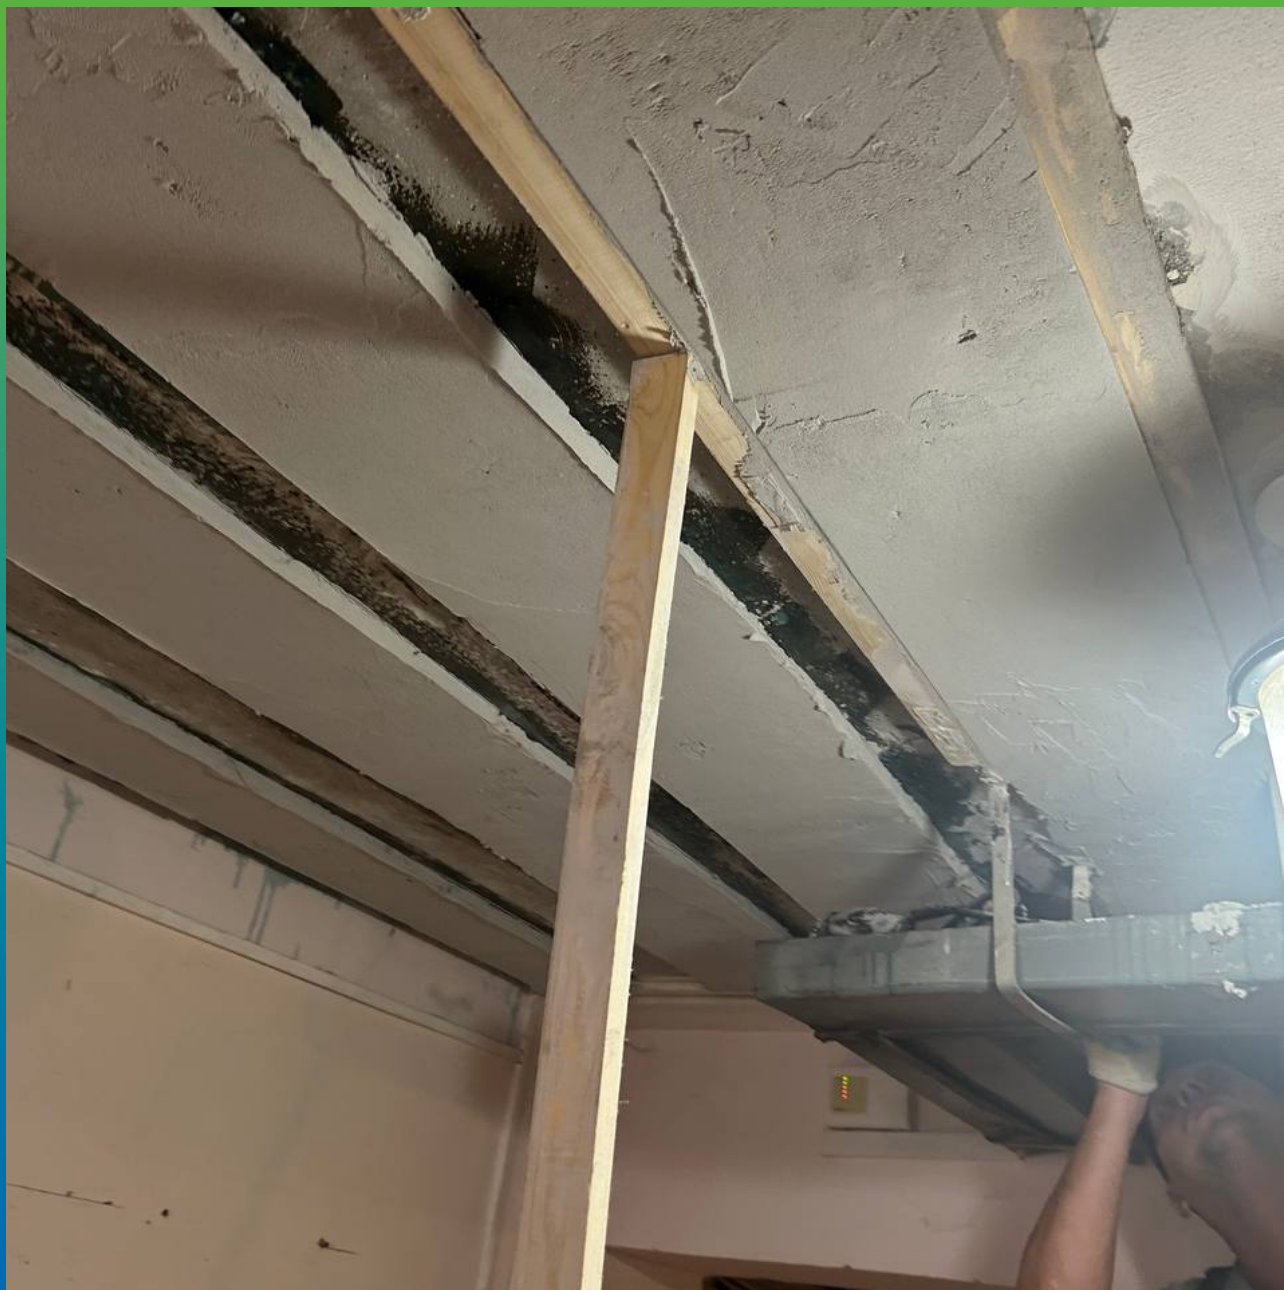


Монтаж огнезащиты Пирошел Цем толщиной 40 мм.

Кардиоцентр



Общий вид объекта после проведения работ по усилению плит под установку томографа

Сводная информация об объекте

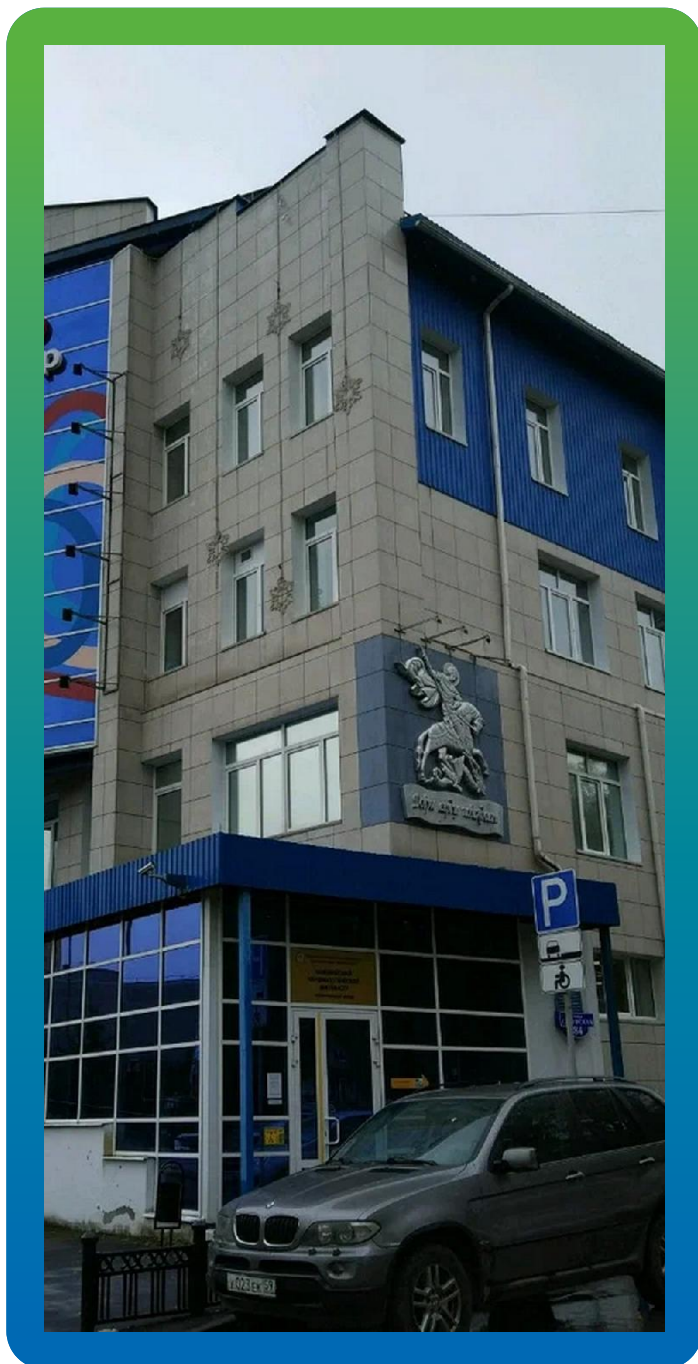

Вид работ

Усиление

Вид объекта

Общественные здания

Площадь, кв.м.

15

Местоположение

г. Пермь

Дата проведения работ

Август 2025

Материалы и оборудование

Манопокс 331
Армошел КВ 200
Манопокс 372
Манопокс Тикс
