

Картотека выполненных объектов




ГРАДИРНИ

Гидроизоляция инъекционным и обмазочным методами



2119

Градирни

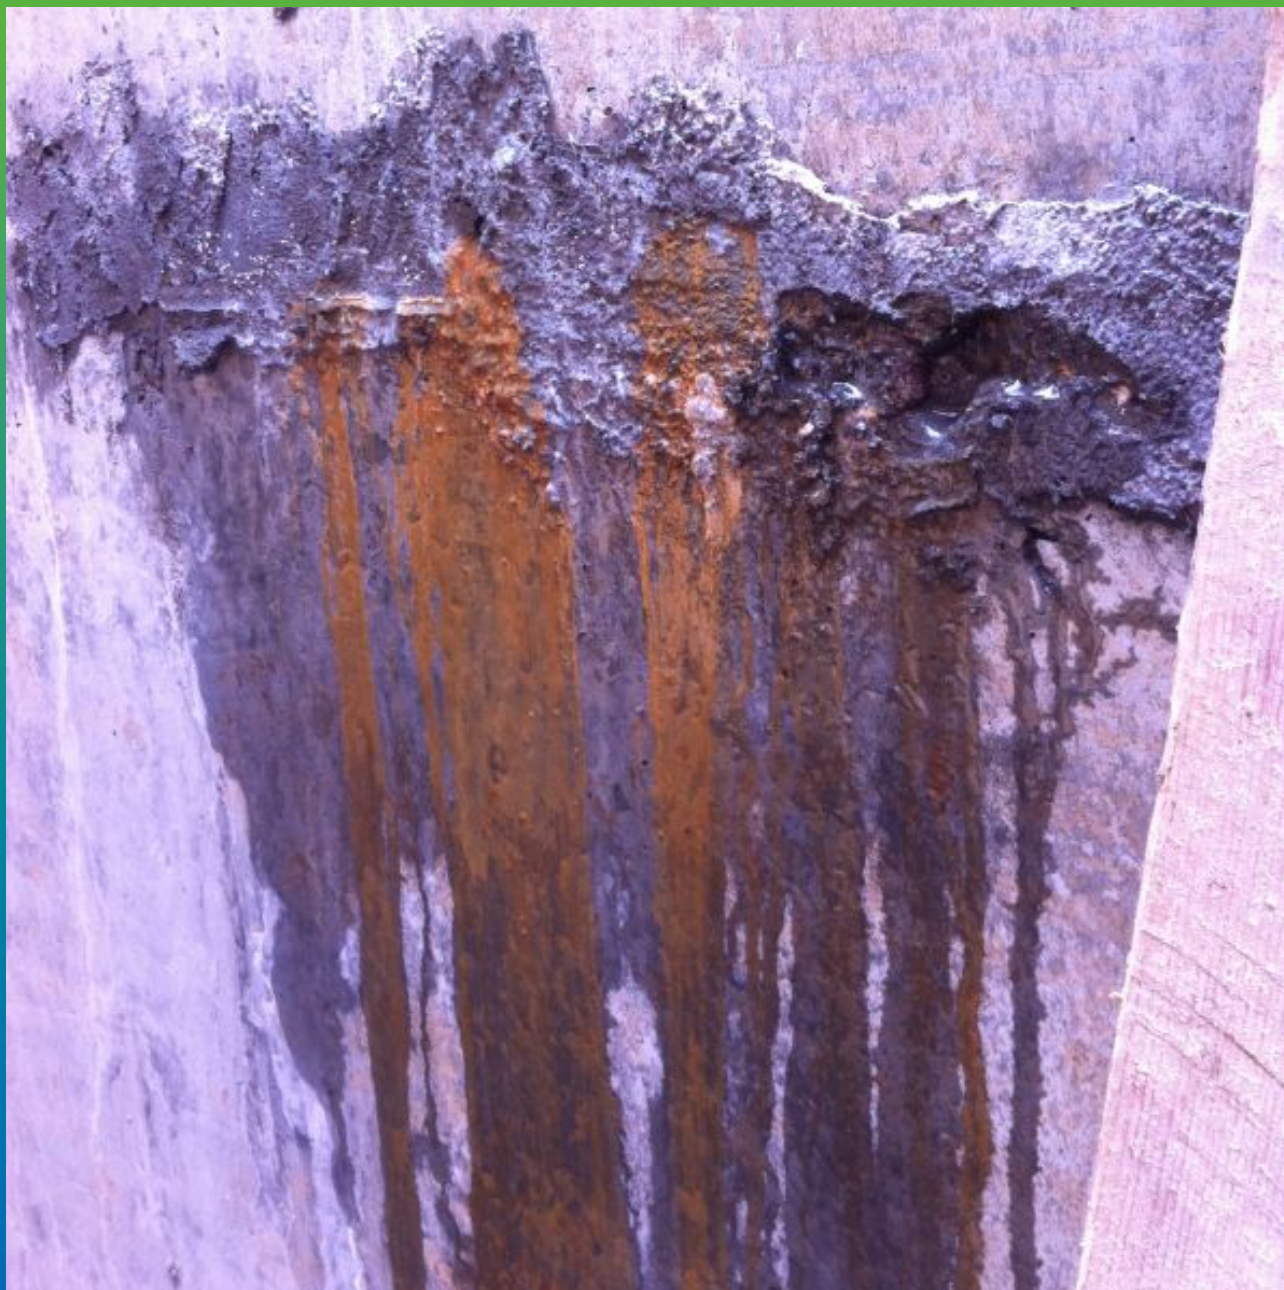


Плохо провибрированный участок

Градирни



Плохо провибрированный участок

Градирни

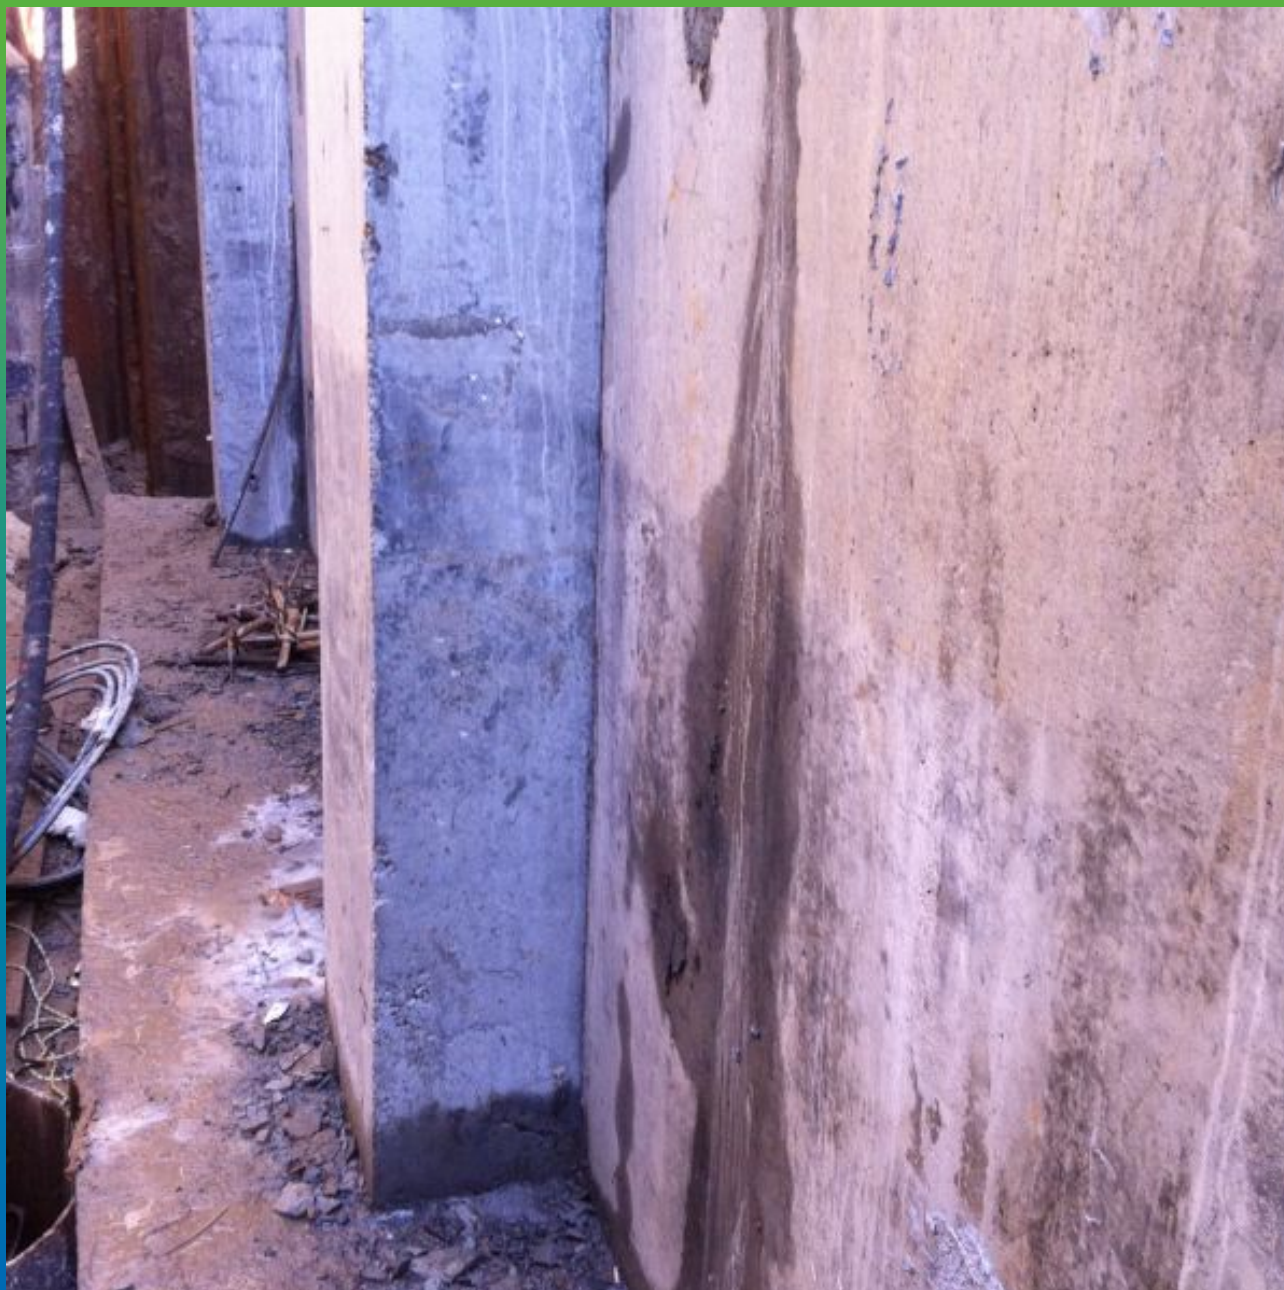

Протечки через стыки и трещины

Градирни



Протечки через "холодные швы"

Градирни



Расшивка плохо провибрированного участка и установка пакеров

Градирни




Расшивка плохо провибрированного участка и установка пакеров

Градирни



Зачеканка расшитых участков составом Максплаг

Градирни

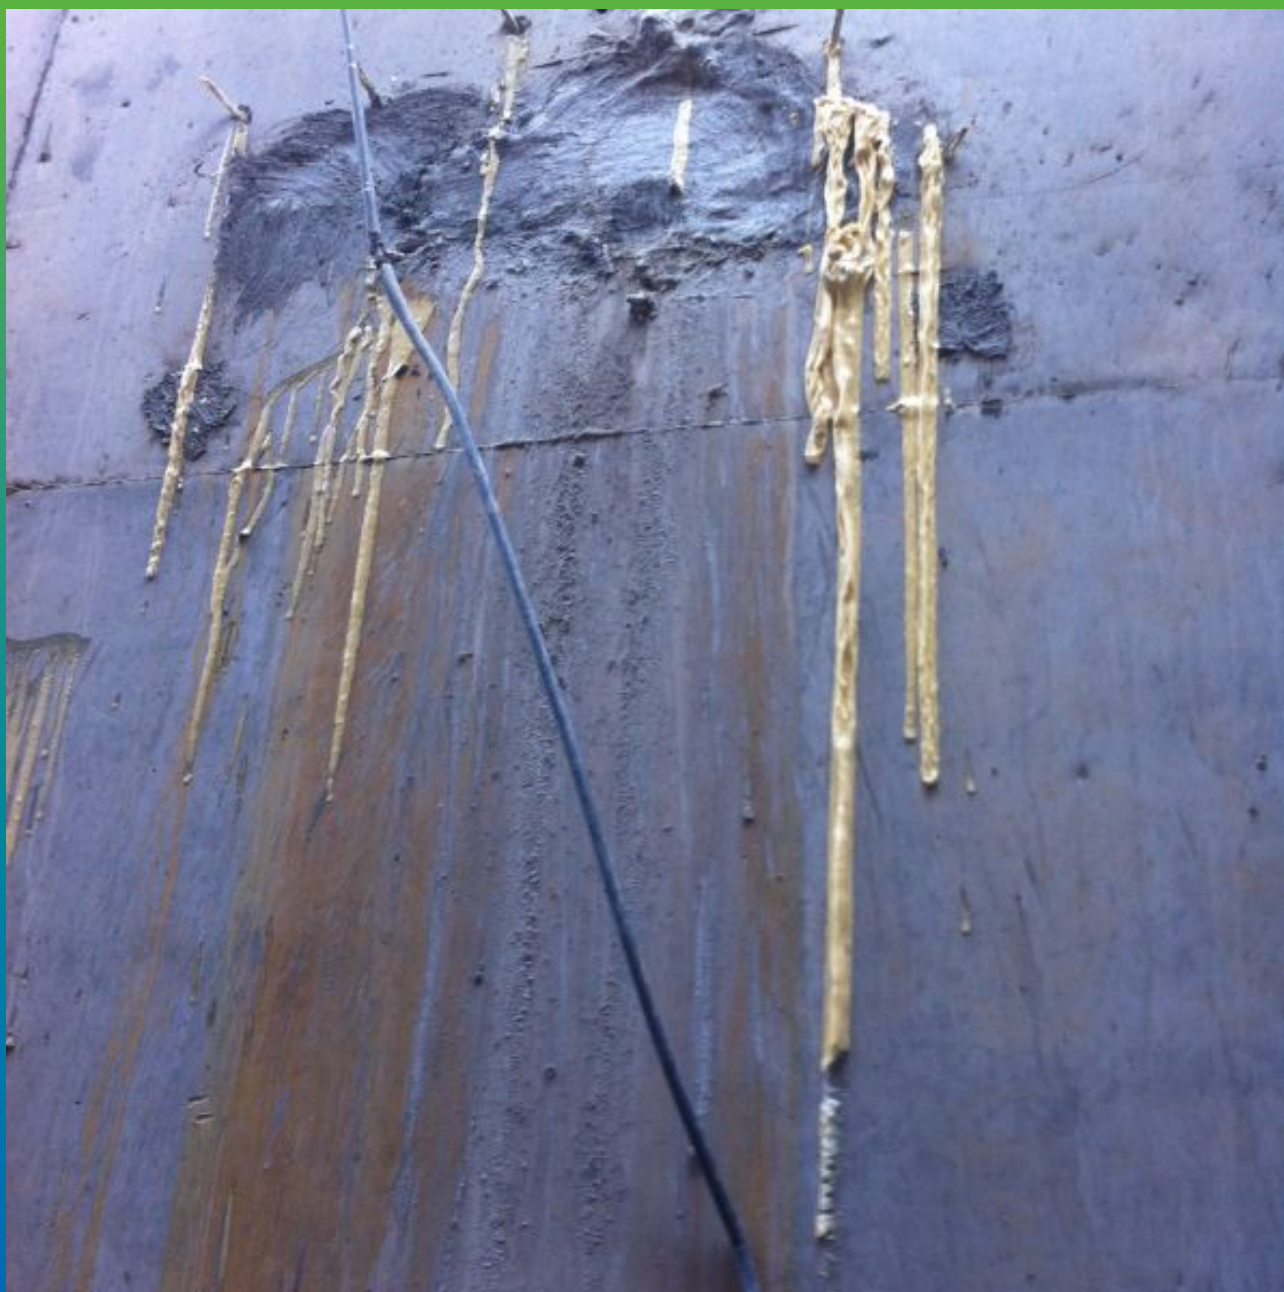

Зачеканка составом Максплаг и инъектирование Витрапур Фоам Флекс

Градирни



Инъектирование составом Витрапур Фоам Флекс

Градирни



Инъектирование "Холодных швов" гидроактивным полиуретаном Манопур У

Градирни



Инъектирование "Холодных швов" гидроактивным полиуретаном Манопур У

Градирни



Вид "Холодного шва" после инъектирования Манопур У

Градирни



Вид трещин после инъектирования Витрапур Фоам Флекс

Градирни



Вид стены градирни после инъектирования Витрапур Фоам Флекс

Градирни



Материалы Дризоро, примененные на объекте

Сводная информация об объекте



Вид работ

Инъектирование
Гидроизоляция

Вид объекта

Гидротехнические сооружения

Площадь, кв.м.

4500

Местоположение

г. Казань

Дата проведения работ

Ноябрь 2015

Материалы и оборудование

Максплаг
Максил Супер
Манопур У Флекс
