

Картотека выполненных объектов



ЛОТКИ ЗАКАЛКИ РЕЛЬС, ЦЕХ №3, ЧМК

Химстойкая защита гидротехнического сооружения



2152

Лотки закали рельс, цех №3, ЧМК



Подготовка основания методом шлифования + последующее обеспыливание

Лотки закалки рельс, цех №3, ЧМК



Материалы на объекте

Лотки закали рельс, цех №3, ЧМК



Нанесение грунтовки Денстоп ЭП 100 на основание

Лотки закалки рельс, цех №3, ЧМК




Замешивание компонентов А+Б Манопокс 331 на весах

Лотки закалки рельс, цех №3, ЧМК



Смешение подготовленного состава миксером до однородной пастообразной смеси

Лотки закали рельс, цех №3, ЧМК

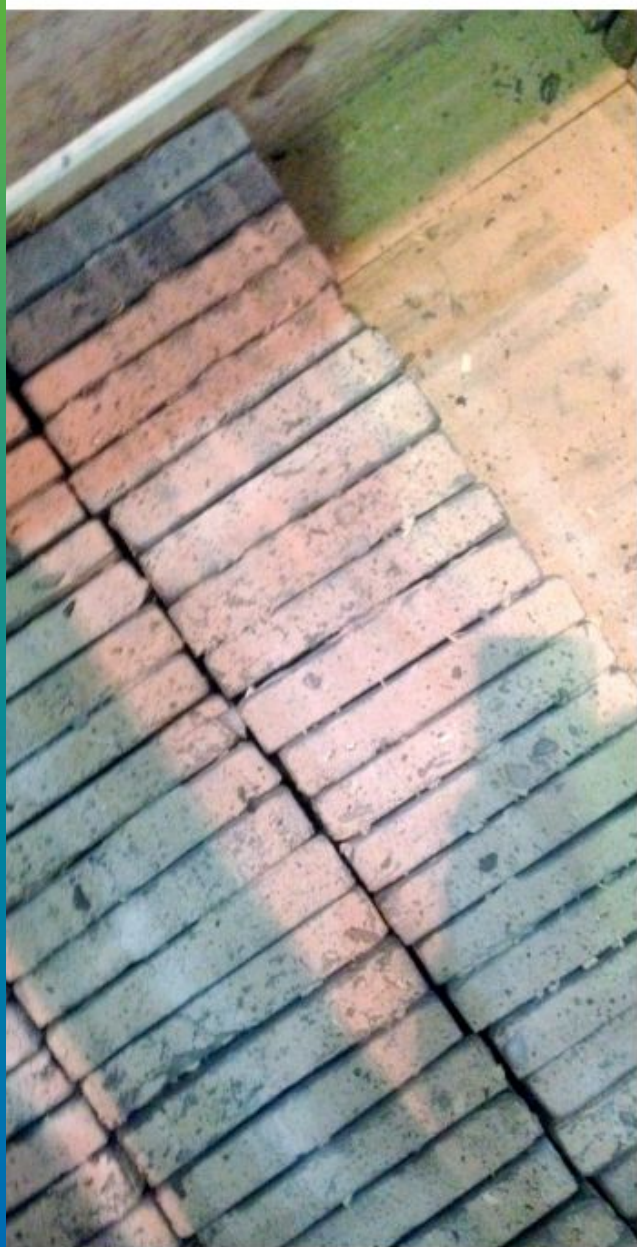

Вид кислотоупорной плитки

Лотки закалки рельс, цех №3, ЧМК



Нанесение слоя Манопокс 331 на кислотоупорную плитку

Лотки закали рельс, цех №3, ЧМК



Монтаж плитки на основание лотка

Лотки заковки рельс, цех №3, ЧМК



Химостойкая затирка швов с помощью Манопокс 331

Лотки закали рельс, цех №3, ЧМК



Конечный вид лотка с устроенной химостойкой плиткой

## Сводная информация об объекте



### Вид работ

Ремонт бетона

### Вид объекта

Гидротехнические сооружения

### Площадь, кв.м.

400

### Местоположение

г. Челябинск

### Дата проведения работ

Ноябрь 2015

### Материалы и оборудование

ДенсТоп ЭП 100

Манопокс 331
