

Картотека выполненных объектов



ЗДАНИЕ АБК ДЕПО БРАТЦЕВО

Гидроизоляция методом просыпки



2233

Здание АБК депо Братцево



Вид смонтированного каркаса фундаментной плиты до начала работ

Здание АБК депо Братцево



Очистка бетонной подготовки от пыли и грязи струей воздуха

Здание АБК депо Братцево




Хранение материала на объекте

Здание АБК депо Братцево



Инструмент для выполнения работ

Здание АБК депо Братцево

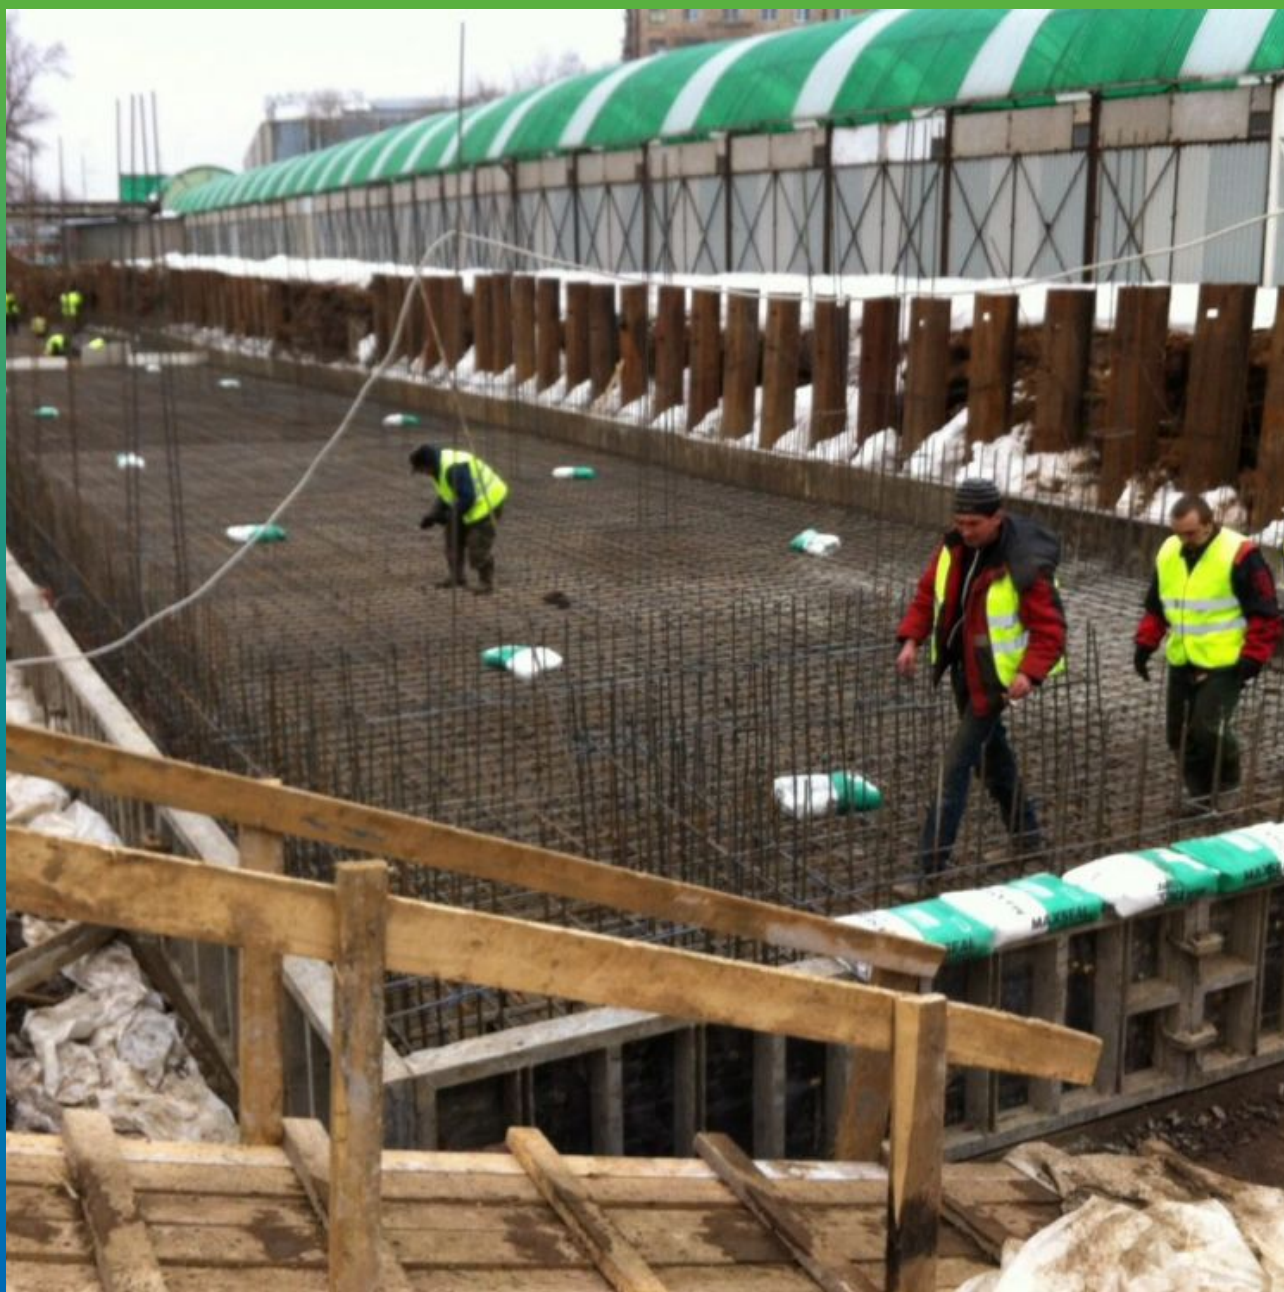

Распределение материала по площади основания

Здание АБК депо Братцево



Просыпка материала по бетонной подготовке с расходом 3 кг/м²

Здание АБК депо Братцево



Просыпка материала по бетонной подготовке расходом 3 кг/м²

Здание АБК депо Братцево



Начало бетонирования плиты

Здание АБК депо Братцево



Окончание бетонирования плиты

Здание АБК депо Братцево



Готовая фундаментная плита

Здание АБК депо Братцево



Стены подземной части здания

Здание АБК депо Братцево



Приготовление смеси Максил Супер для вертикального нанесения

Здание АБК депо Братцево



Увлажнение стены перед нанесением

Здание АБК депо Братцево



Нанесение первого слоя гидроизоляции Максил Супер

Здание АБК депо Братцево



Нанесение первого слоя гидроизоляции Максил Супер

Здание АБК депо Братцево



Нанесение второго слоя гидроизоляции Максил Супер

Здание АБК депо Братцево



Вид стены, обмазанной Макссил Супер в два слоя

Здание АБК депо Братцево



Выполнение защитной кирпичной стенки

Здание АБК депо Братцево



Выполнение защитной кирпичной стенки

Здание АБК депо Братцево



Выполненная прижимная защитная стенка

Здание АБК депо Братцево



Выполненная прижимная защитная стенка

Здание АБК депо Братцево



ИНН 5020181056 ОГРН 1157847078927 ОКАТО 40298564000
ОКПО 01056304
тел./факс: 8 (812) 334 91 89

www.nordgrad.com

Исх. № 65 от «19» апреля 2016г.

Генеральному директору
ООО «Гидрозо»
И.А. Измайлову

Объект:
«СТЗ депо Братцево МКЖД»

Отзыв


О применении материалов Макссил Супер и Манодил Свелл ХК 2507 АД при устройстве гидроизоляции подземной части здания.

В марте-апреле 2016 г. ООО «НОРДГРАД СМУ-2» в рамках договора подряда выполнило работы по гидроизоляции подземной части СТЗ на объекте депо Братцево МКЖД. Площадная гидроизоляция выполнялась материалом осмотического действия Макссил Супер, методом просыпки при заливке фундаментной плиты и обмазкой этим же материалом заглубленных стен здания. Для защиты от протечек по холодным швам бетонирования в шов закладывался гидрофильный профиль Манодил Свелл ХК 2507 АД.

Коллектив ООО «НОРДГРАД СМУ-2» высоко оценил качество использованных материалов и удобство технологических решений, которые позволили существенно сократить временные затраты на гидроизоляцию подземной части здания.

Выражаем благодарность коллективу «Гидрозо» за предоставление услуги шеф-монтажа и четкого соблюдения сроков поставок материалов.

С уважением,
Главный инженер ООО «НОРДГРАД СМУ-2»

 Кузьмин Н.Н.

Отзыв от подрядчика

Сводная информация об объекте



Вид работ

Гидроизоляция

Вид объекта

Транспортные сооружения

Площадь, кв.м.

2000

Местоположение

г. Москва

Дата проведения работ

Март 2016

Материалы и оборудование

Максил Супер
