


Картотека выполненных объектов



БОТАНИЧЕСКИЙ САД УРФУ

Гидроизоляция искусственного водоема

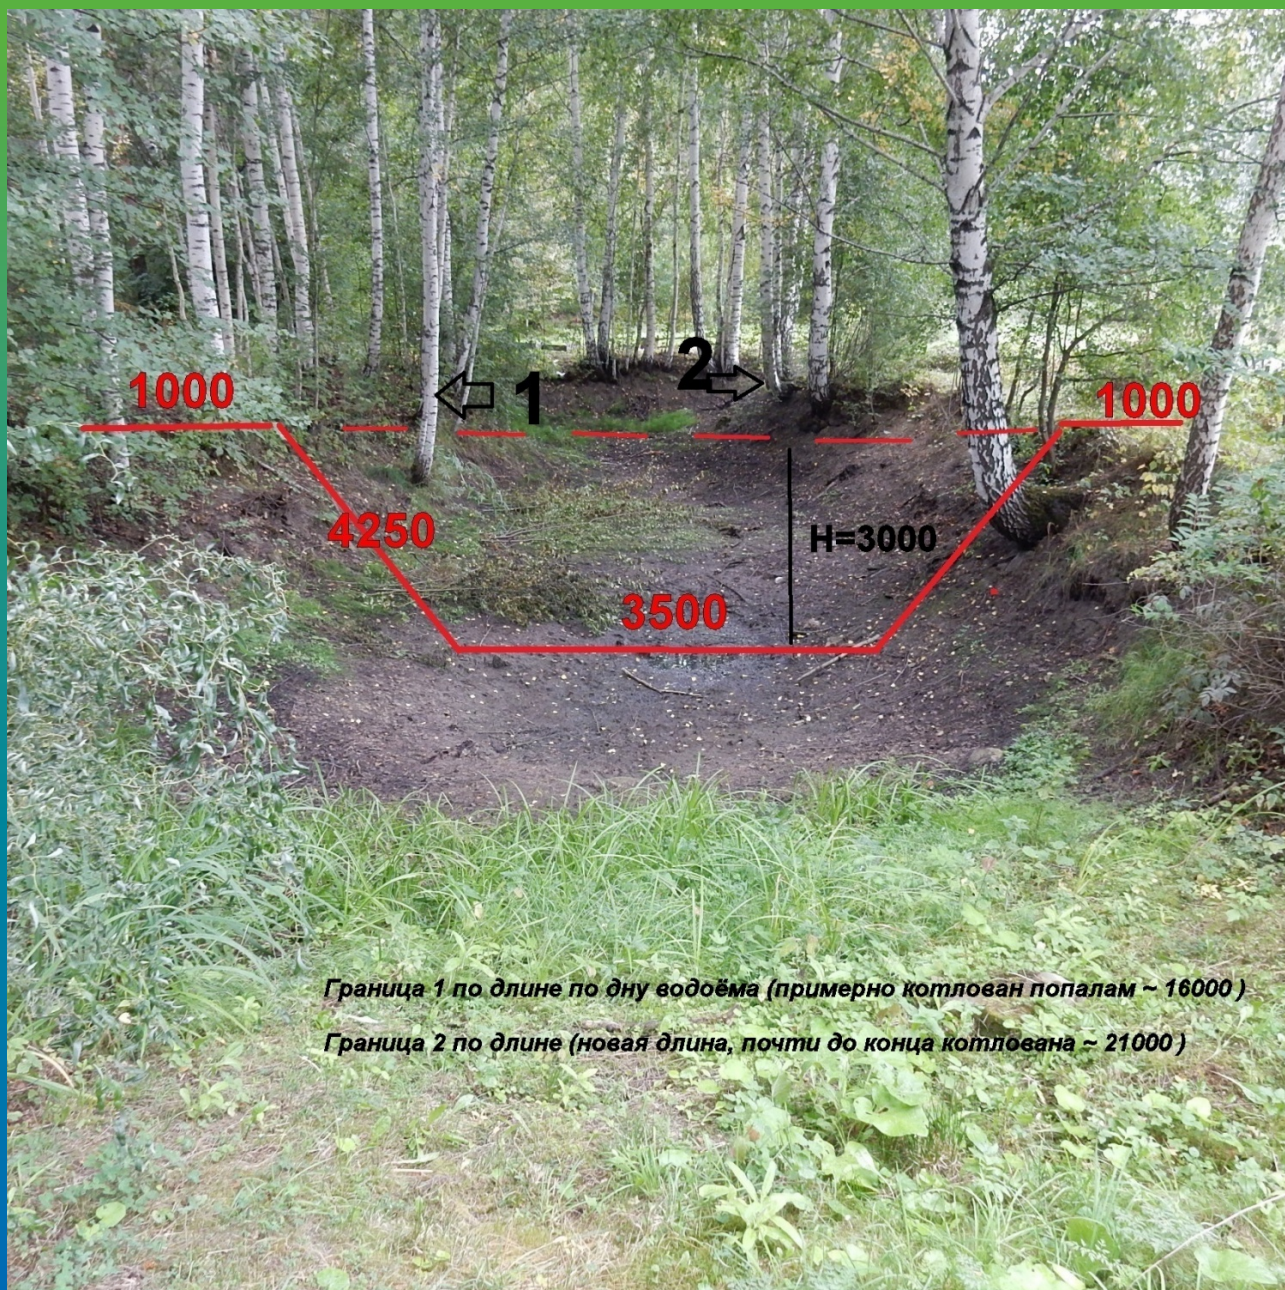

4569

Ботанический сад УрФУ



Укладка геотекстиля

Ботанический сад УрФУ



ЭПДМ мембрана Преласта СТ 1.2мм на объекте

Ботанический сад УрФУ



Вид уложенной ЭПДМ мембраны Прелести СТ 1.2мм

Ботанический сад УрФУ



Финальный вид водоема


Ботанический сад УрФУ

Материал: преласта СТ 1,2 мм

Кол-во полотен: 1

Общая площадь: 452.2 кв.м.

ПОЛОТНО 1. S1= 452.2 кв.м.

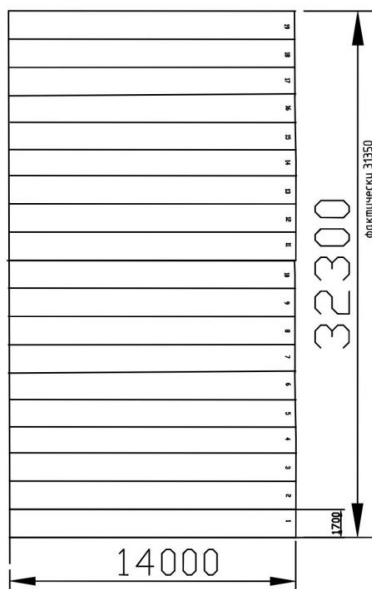

Прошу изготовить карты по указанным размерам

С раскроем согласен _____

печать подписи заказчика

Раскрой ЭПДМ мембраны по размерам заказчика

Ботанический сад УрФУ



Вид выполненного котлована под водоем

Сводная информация об объекте

Вид работ

Гидроизоляция

Вид объекта

Кровли и водоемы ЭПДМ

Площадь, кв.м.

450

Местоположение

г. Екатеринбург

Дата проведения работ

Сентябрь 2017

Материалы и оборудование

Преласты СТ
