

Картотека выполненных объектов



ЖК "БЕРЕГ"

Гидроизоляция кровли



5339

ЖК "Берег"



Стармекс РМЗ для создания уклона на поверхности кровли

ЖК "Берег"



Создание меток уклона с помощью нивелира

ЖК "Берег"



Выставление направляющих

ЖК "Берег"



Приготовление состава Стармекс РМЗ

ЖК "Берег"



Стармекс РМЗ на объекте

ЖК "Берег"




Укладка Стармекс РМЗ по направляющим

ЖК "Берег"



Проверка уклона проливкой воды. На всей площади - Стармекс РМЗ

ЖК "Берег"

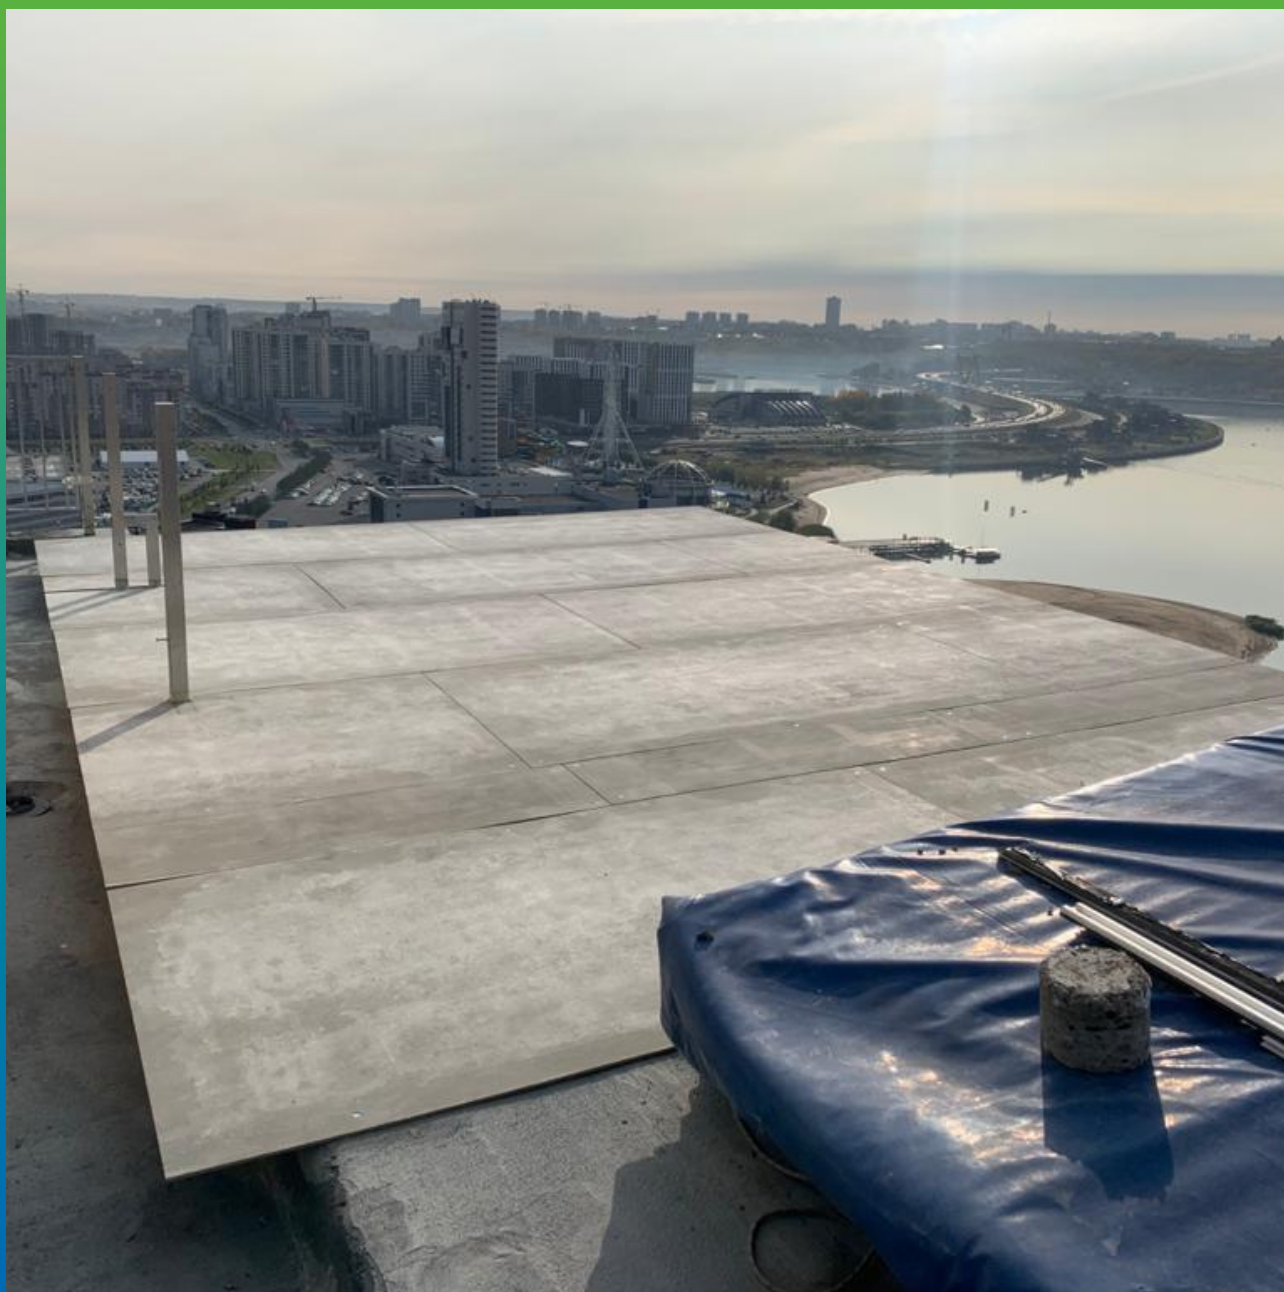


Подготовка выступающей террасы для нанесения Денстоп ПУ 325 Аква.
Укладка ЦСП плит

ЖК "Берег"




Стыки на плитах ЦСП, гидроизолированные составом Манодил Бонд Ф

ЖК "Берег"

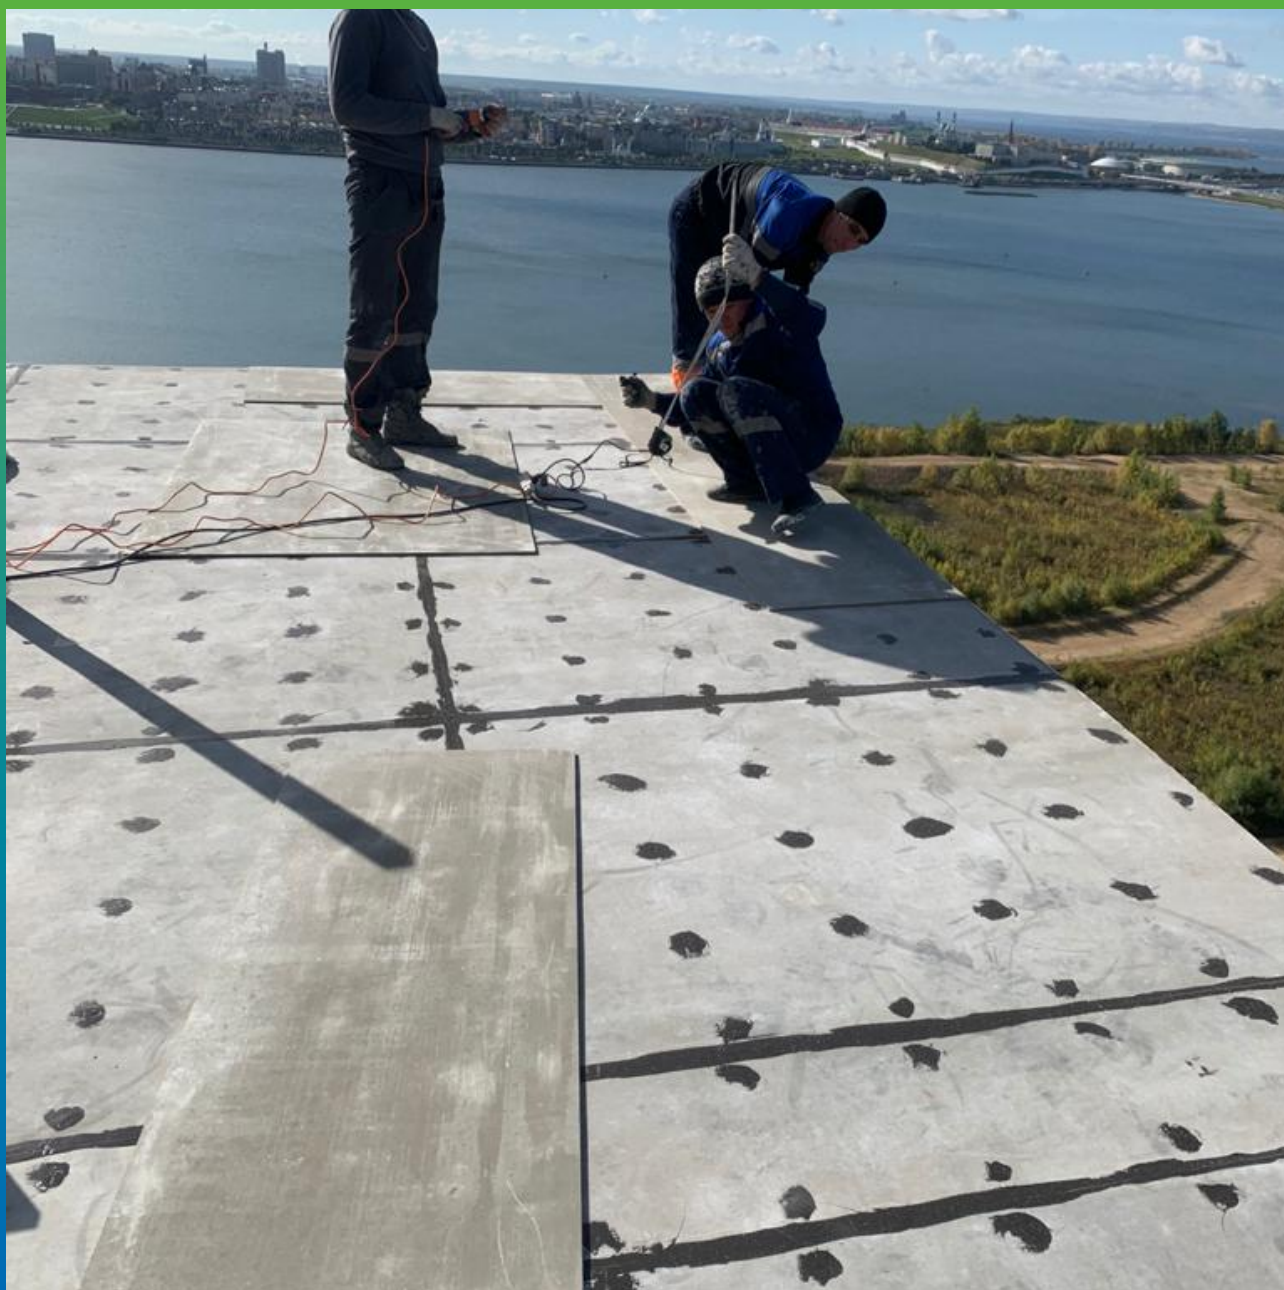


Стыки на плитах ЦСП, гидроизолированные составом Манодил Бонд Ф

ЖК "Берег"

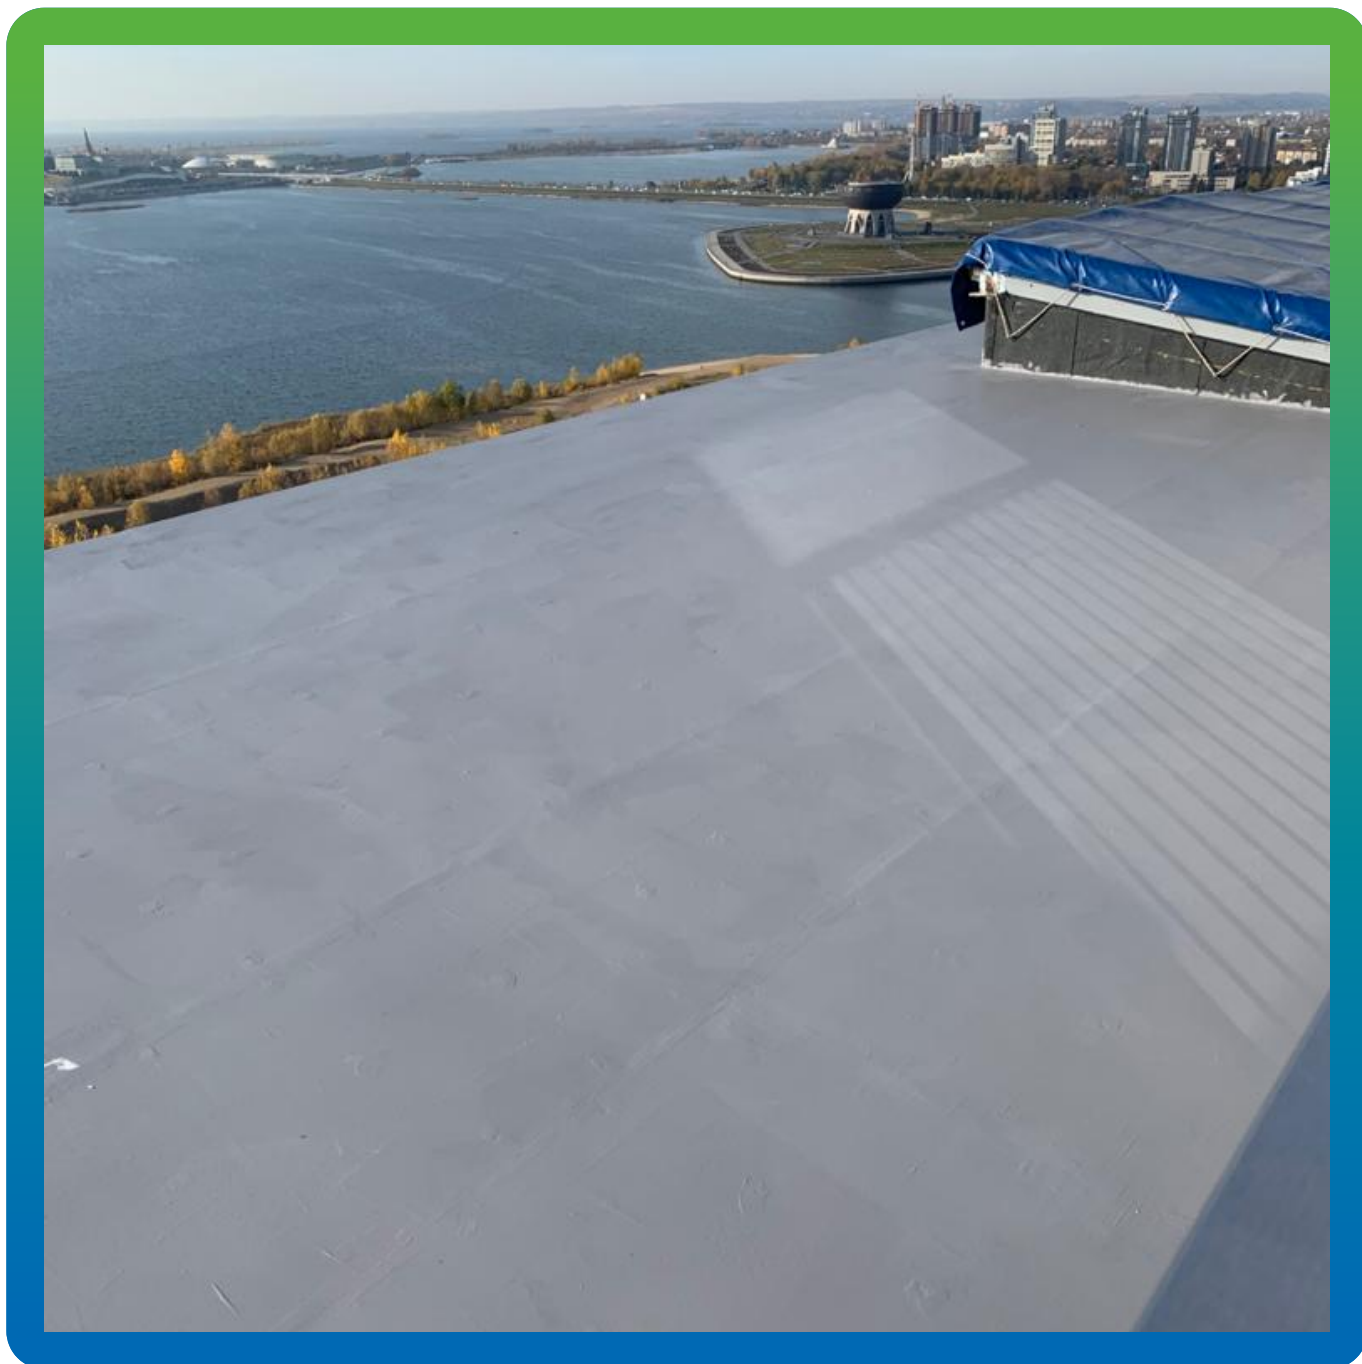

Грунтовочный состав ДенТоп ЭП 105, нанесенный на поверхность ЦСП плит

ЖК "Берег"

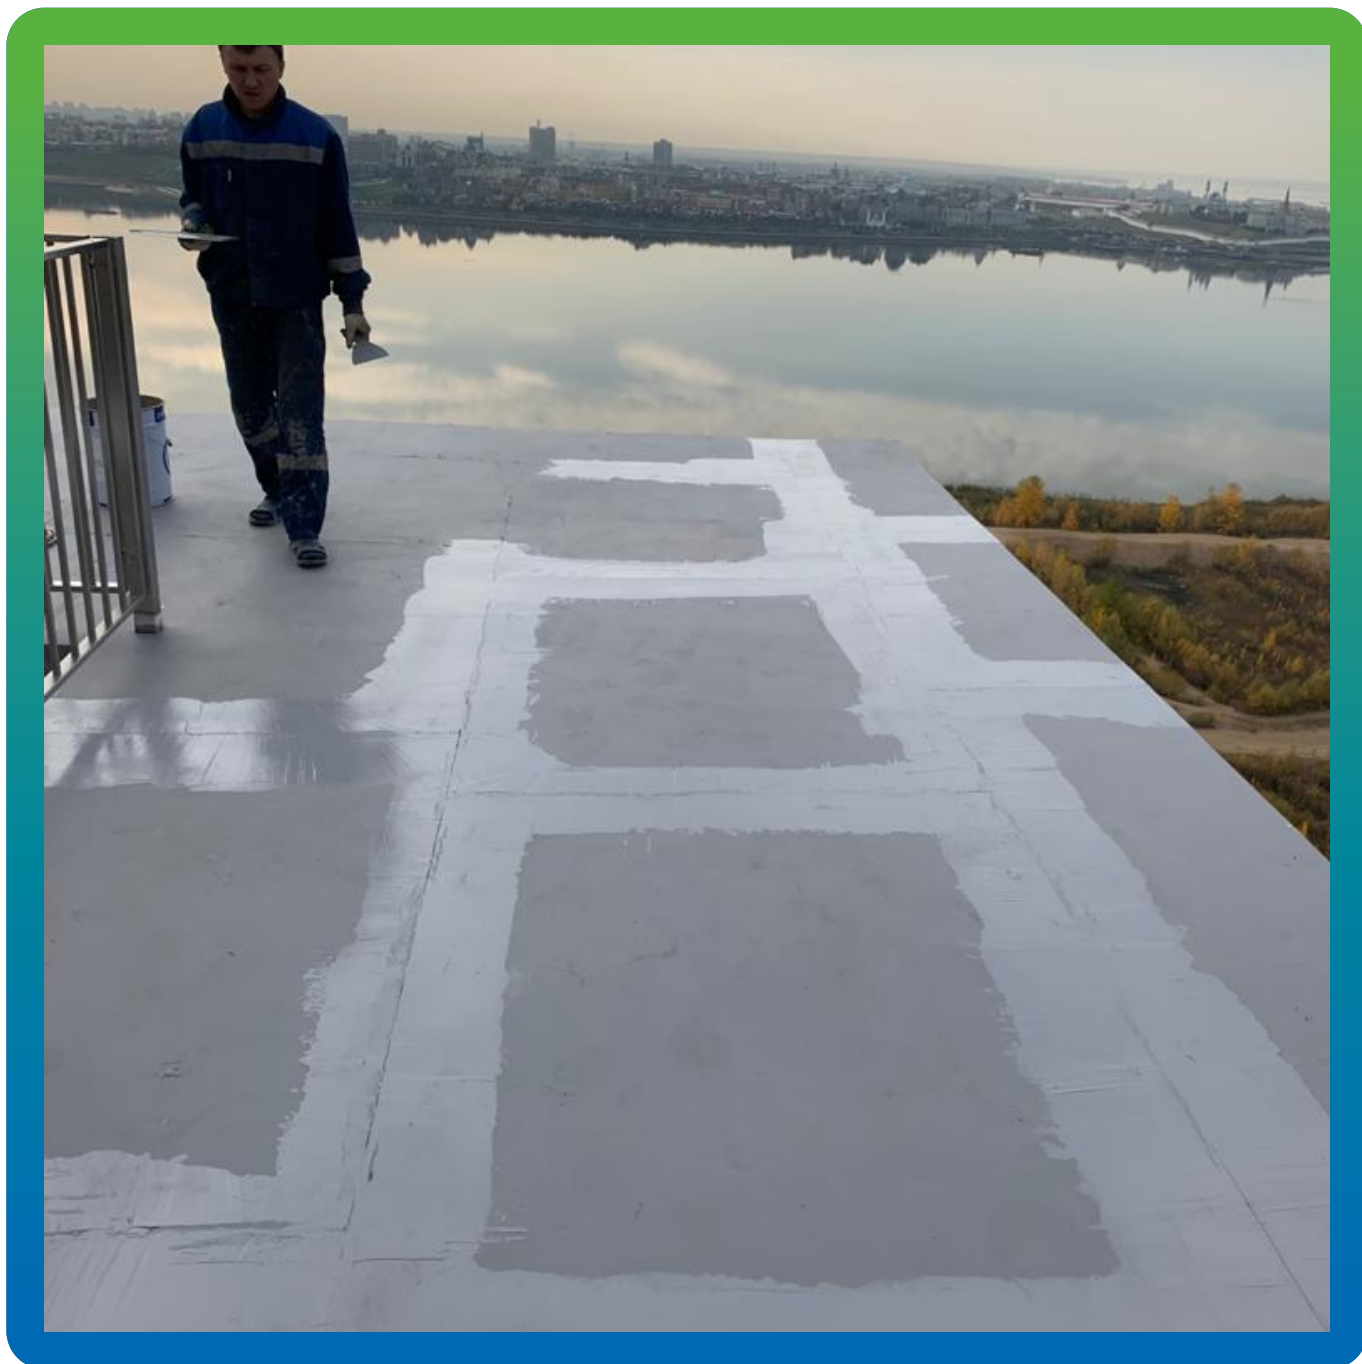

Грунтование составом ДенТоп ЭП 105

ЖК "Берег"



ДенТоп ПУ 325 Аква - однокомпонентная гибридная полиуретановая смола на водной основе

ЖК "Берег"




ДенсТоп ПУ 325 Аква, нанесенный на плиты ЦСП

ЖК "Берег"



ДенсТоп ПУ 325 Аква, нанесенный на плиты ЦСП

ЖК "Берег"

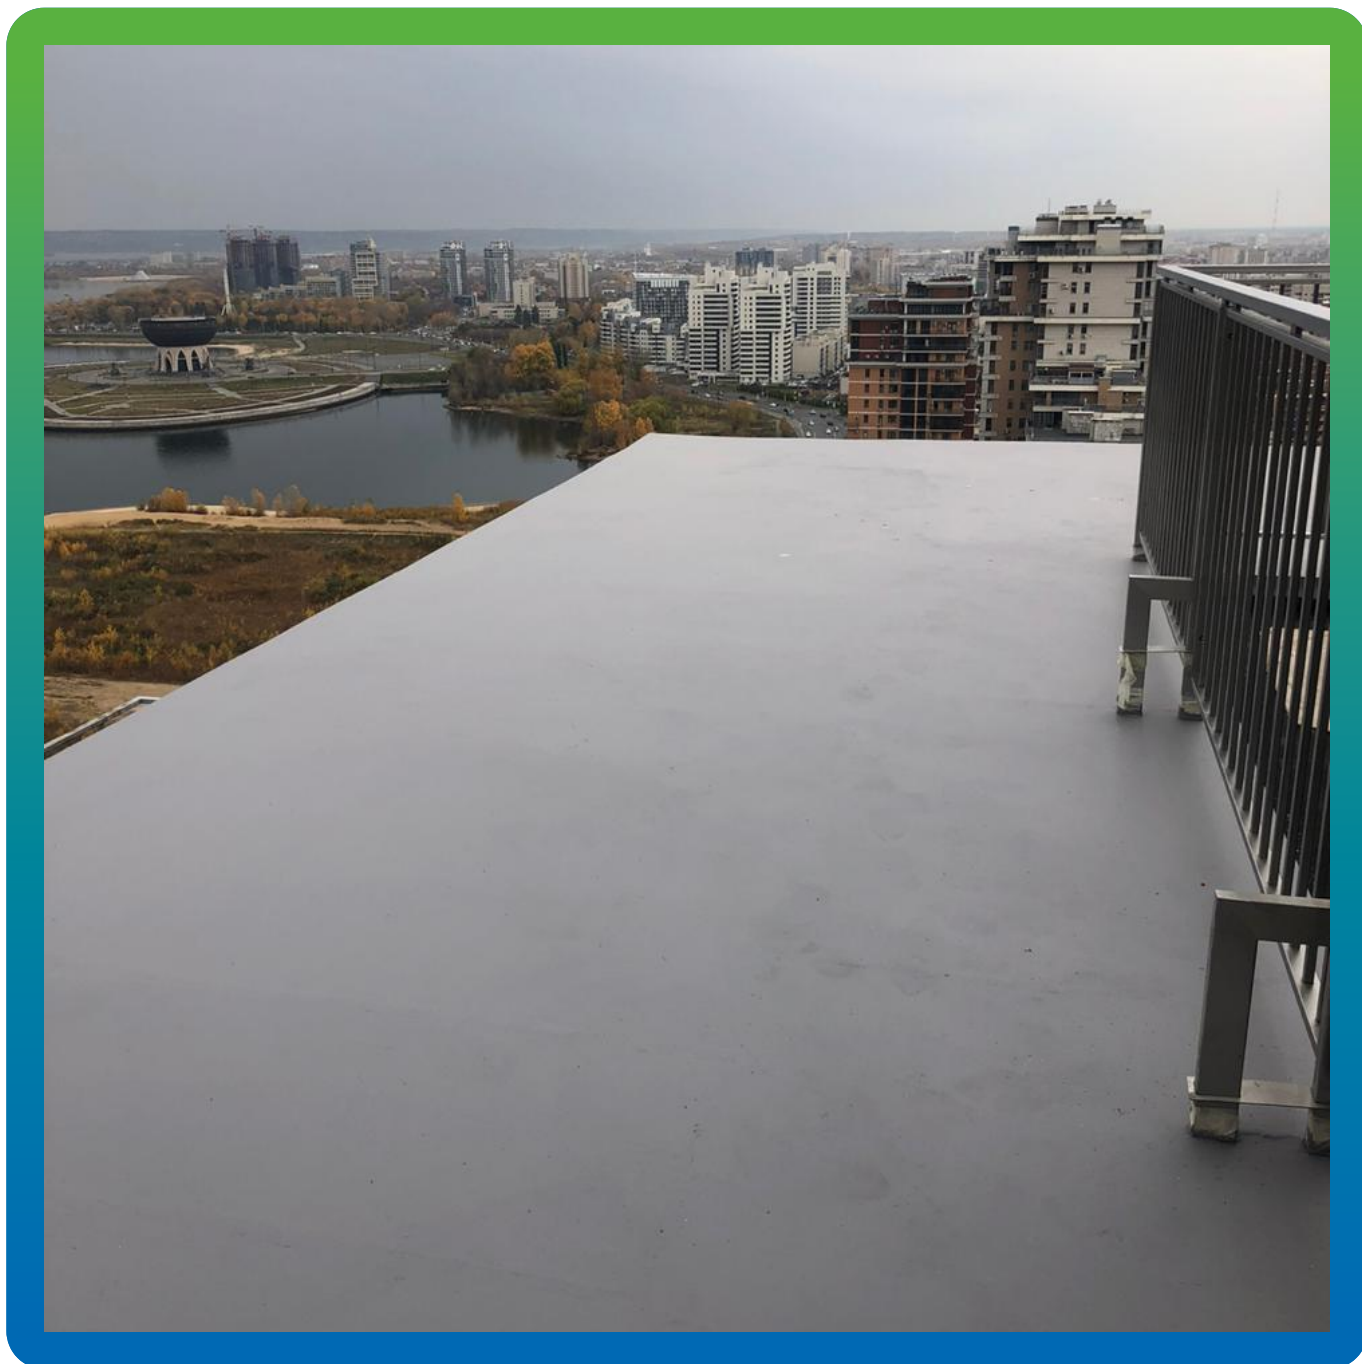

ДенсТоп ПУ 325 Аква, нанесенный на плиты ЦСП

ЖК "Берег"



ЭПДМ мембрана Преласты СТ, уложенная на основную часть террасы

ЖК "Берег"



ЭПДМ мембрана Преласта СТ, уложенная на основную часть террасы

ЖК "Берег"



Сварные швы, выполненные с помощью Термобонд

ЖК "Берег"




Гидроизолированная сливная воронка, обработанная составом Манодил Бонд Ф

ЖК "Берег"



Финишный вид кровли

Сводная информация об объекте

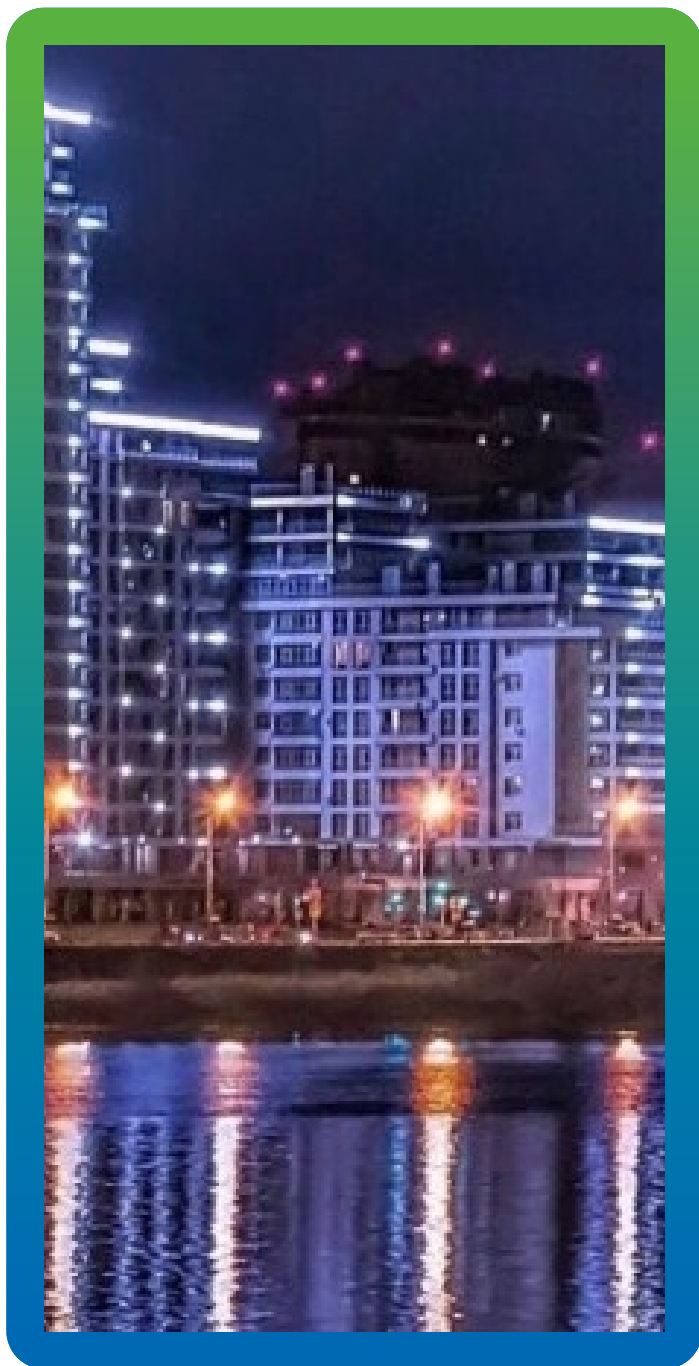

Вид работ

Гидроизоляция

Вид объекта

Жилые здания

Площадь, кв.м.

1500

Местоположение

г. Казань

Дата проведения работ

Август 2020

Материалы и оборудование

Манодил Бонд Ф
Преласты СТ
Стармекс РМЗ
ДенсТоп ПУ 325 Аква
