

Картотека выполненных объектов



ПОДПОРНАЯ СТЕНКА НА УЧАСТКЕ ТРАССЫ
M12

Ремонт подпорной стенки



16388

Подпорная стенка на участке трассы М12



Замер трещины

Подпорная стенка на участке трассы М12



Замер глубины трещины

Подпорная стенка на участке трассы М12



Очистка трещины от битума

Подпорная стенка на участке трассы М12



Замеры расшитой трещины

Подпорная стенка на участке трассы М12



Трещины, инъецированные составом Манопокс 352ЛВ

Подпорная стенка на участке трассы М12




Трещины, инъецированные составом Манопокс 352ЛВ

Подпорная стенка на участке трассы М12



Трещины, инъецированные составом Манопокс 352ЛВ

Подпорная стенка на участке трассы М12

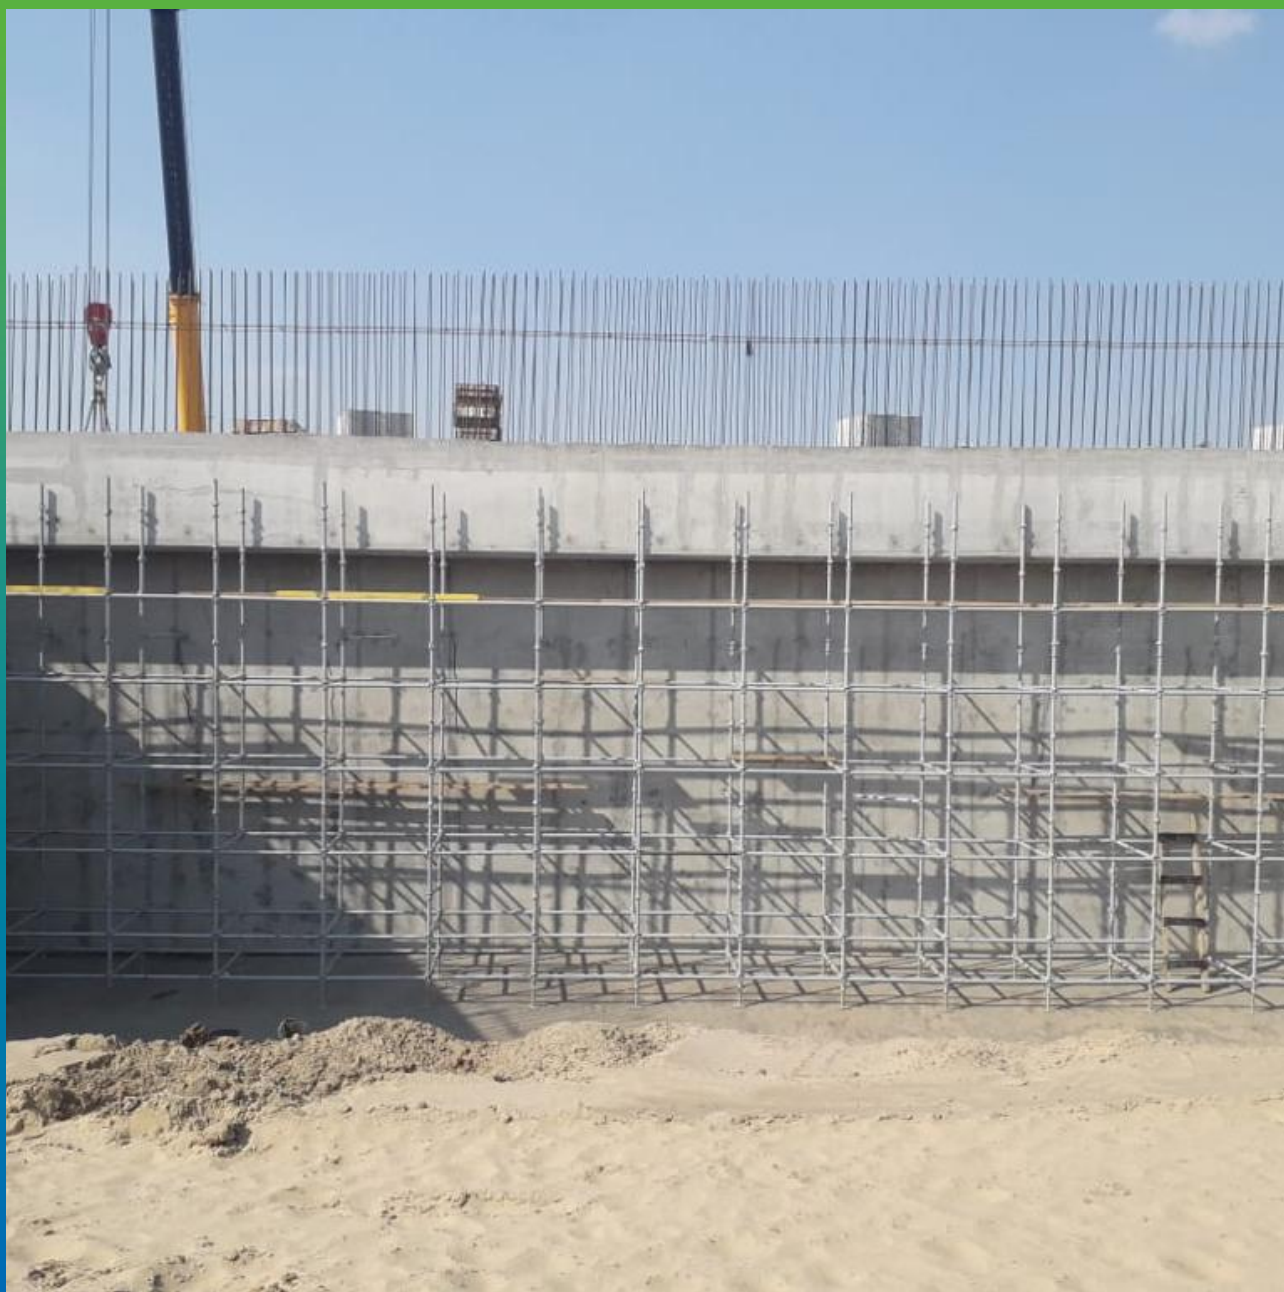

Финишный вид

Сводная информация об объекте



Вид работ

Инъектирование
Ремонт бетона

Вид объекта

Транспортные сооружения

Площадь, кв.м.

150

Местоположение

г. Казань

Дата проведения работ

Сентябрь 2022

Материалы и оборудование

Манопокс 352 ЛВ
Манопокс 331
